



**PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
AUTONOME PROVINZ BOZEN**

**Regolamento (CE) n. 1698/2005
EG - Verordnung Nr. 1698/2005**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
ENTWICKLUNGSPROGRAMM FÜR DEN LÄNDLICHEN RAUM
2007-2013**

**7^a Relazione annuale - anno 2013
7. Jahresbericht - 2013**

2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013



Indice:


1	Variazioni delle condizioni generali (articolo 82, paragrafo 2, lettera a):	pag. 4
1.1	Variazioni delle condizioni generali (modifiche della legislazione o sviluppi socio-economici)	pag. 4
1.2	Modifiche della politica nazionale o comunitaria	pag. 19
1.3	Cronistoria del PSR	pag. 23
1.4	Organigramma	pag. 25
2	Andamento del programma rispetto agli obiettivi fissati, sulla base di indicatori di prodotto e di risultato (articolo 82, paragrafo 2, lettera b):	pag. 26
2.1	Misure attivate	pag. 26
2.2	Analisi degli esiti sulla base degli indicatori di monitoraggio, compresa un'analisi qualitativa dei progressi compiuti in rapporto agli obiettivi prefissati	pag. 37
3	Esecuzione finanziaria del programma (articolo 82, paragrafo 2, lettera c):	pag. 111
3.1	Spesa effettivamente sostenuta a livello nazionale (Amministrazione provinciale)	pag. 111
3.2	Liquidazioni effettuate sul bilancio comunitario 2012:	pag. 127
3.2.1	Impegni comunitari, piano finanziario in vigore e regola n + 2	pag. 127
3.2.2	Dichiarazioni di spesa pubblica dell'Organismo pagatore	pag. 130
3.2.3	Pagamenti comunitari	pag. 132
3.2.4	Dati storicizzati a partire dal quarto trimestre 2006	pag. 132
4	Riepilogo delle attività di valutazione in itinere (articolo 82, paragrafo 2, lettera d)	pag. 134
5	Disposizioni prese dall'autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l'efficienza dell'esecuzione (articolo 82, paragrafo 2, lettera e):	pag. 143
5.1	Misure di sorveglianza e valutazione	pag. 143
5.2	Riepilogo delle principali difficoltà incontrate nella gestione del programma e delle eventuali misure prese in conseguenza	pag. 146
5.3	Ricorso all'assistenza tecnica	pag. 146
5.4	Informazioni volte a dare adeguata pubblicità al programma	pag. 146
6	Dichiarazione di conformità con le politiche comunitarie pertinenti, problemi incontrati e misure adottate per porvi rimedio (articolo 82, paragrafo 2, lettera f)	pag. 149
7	Riutilizzazione degli importi recuperati a norma dell'articolo 33 del Reg. (CE) n. 1290/2005 (articolo 82, paragrafo 2, lettera g)	pag. 155
8	Tabelle (output e risultato) degli indicatori comuni per il monitoraggio e la valutazione	pag. 156
9	Allegati:	pag. 285
9.1	Tabelle finanziarie della Commissione Europea - 2012	pag. 285
9.2	Verbale della sesta riunione del Comitato di Sorveglianza del 11 giugno 2012	pag. 305
9.2.a	Approvazione della decima proposta di modifica del PSR da parte della Commissione Europea (revisione del piano finanziario per asse, distinzione per quanto riguarda il FEASR tra tasso di partecipazione medio indicativo e tasso applicabile per i pagamenti).	pag. 313
9.3	Relazione annuale di valutazione in itinere	pag. 318
9.4	LEADER	pag. 334

1. Variazioni delle condizioni generali (articolo 82, paragrafo 2, lettera a):

1.1. Variazioni delle condizioni generali (modifiche della legislazione o sviluppi socio-economici):

1.1.1. Variazioni sostanziali delle condizioni socio-economiche¹:

Nel 2013 si stima che il tasso di crescita dell'economia mondiale dovrebbe attestarsi sul 2,9%. Per gli Stati Uniti si prevede una dinamica positiva (+1,6%), grazie alla ripresa degli investimenti e del clima di fiducia dei consumatori, ma l'economia europea sta ripartendo solo lentamente. La fiducia di consumatori e imprenditori, seppure in miglioramento, risente tuttora del prolungarsi della crisi e dell'elevata disoccupazione. In molti paesi le imprese lamentano problemi di accesso al credito a causa del sistema bancario debole e delle difficoltà dell'economia reale. L'euro relativamente forte frena l'export. Nel 2013 l'Eurozona registrerà quindi una recessione (-0,4%) e anche paesi economicamente forti come la Germania (+0,5%) evidenzieranno tassi di crescita modesti. La crisi in Italia resta pesante (-1,8%). La disoccupazione, l'elevato carico fiscale, la stretta creditizia e l'incertezza generale continuano a frenare la domanda. Con la fine dell'anno dovrebbe però iniziare una ripresa sostenuta dall'export, dallo sblocco dei pagamenti della Pubblica Amministrazione alle imprese e dai moderati prezzi delle materie prime.

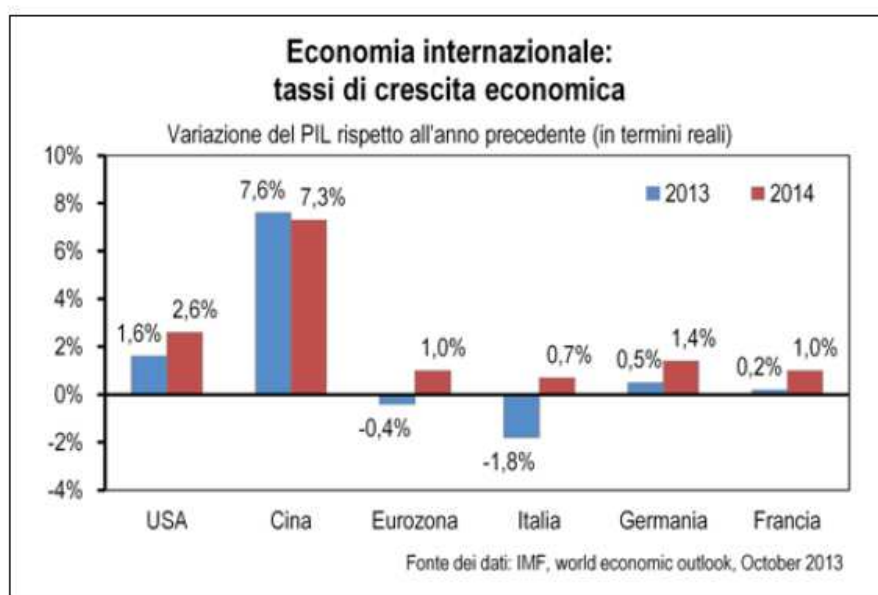

Il PIL provinciale¹:

Il 2013 è stato un anno negativo per l'economia altoatesina. Il fatturato, i costi e gli ordinativi sul mercato locale e nazionale hanno registrato un andamento sfavorevole e solo il 70% delle imprese segnala una situazione reddituale positiva nel secondo semestre. Tuttavia, nella nostra provincia la recessione non ha assunto toni drammatici: si stima che la riduzione del prodotto interno lordo sia pari a -0,5%. Le previsioni per il prossimo anno prevedono

¹ Dati IRE – Barometro dell'economia – Risultati provvisori 2013 e previsioni 2014


un miglioramento della congiuntura, anche grazie al rafforzamento della crescita negli Stati Uniti ed all'uscita dell'Eurozona dalla recessione. La dinamica economica dei nostri principali paesi partner sarà buona (Germania +1,4%; Austria +1,6%) e anche l'Italia uscirà dalla crisi, con una crescita del PIL dello 0,7%. Per quanto riguarda l'Alto Adige, il "sentiment" economico è in miglioramento. L'indice di fiducia dei consumatori è in crescita dall'inizio del 2013 e anche gli operatori economici guardano al primo semestre del 2014 con maggiore ottimismo: l'indice di redditività atteso è infatti pari al 75%. Considerati i dati attualmente disponibili, si ritiene che nel 2014 l'economia provinciale crescerà dello 0,8%. La ripresa potrebbe però risentire di alcuni fattori di rischio, in gran parte dipendenti dalla realtà italiana. Saranno molto importanti la stabilità del governo, il mantenimento degli obiettivi di bilancio e la realizzazione delle riforme previste. Anche l'accesso delle imprese italiane al credito resta difficoltoso, il che ostacola l'attività di investimento.

Andamento della spesa delle Amministrazioni pubbliche e spesa delle famiglie²:

L'analisi della domanda interna evidenzia come nel 2013 gli Investimenti lordi siano diminuiti del 7,7% rispetto all'anno precedente. Tale valore illustra le difficoltà dei soggetti economici ad effettuare investimenti in un panorama economico caratterizzato da forti incertezze.

La più importante voce della domanda, ovvero la Spesa per consumi finali delle famiglie, è diminuita dello 0,9%. Anche la Spesa per consumi finali delle istituzioni pubbliche e private segnala, presumibilmente a causa di un'accentuata politica del risparmio, un leggero calo dello 0,2%.

Le spinte positive alla domanda derivano soprattutto dalla statistica riguardante il commercio estero. I dati provvisori indicano infatti nel 2013 un record delle esportazioni superiore a quello dell'anno precedente. Sono stati esportati beni e servizi per un aumento del 4,8% rispetto al 2012. La domanda estera è quindi un importante motore di crescita per il PIL nell'anno di riferimento.

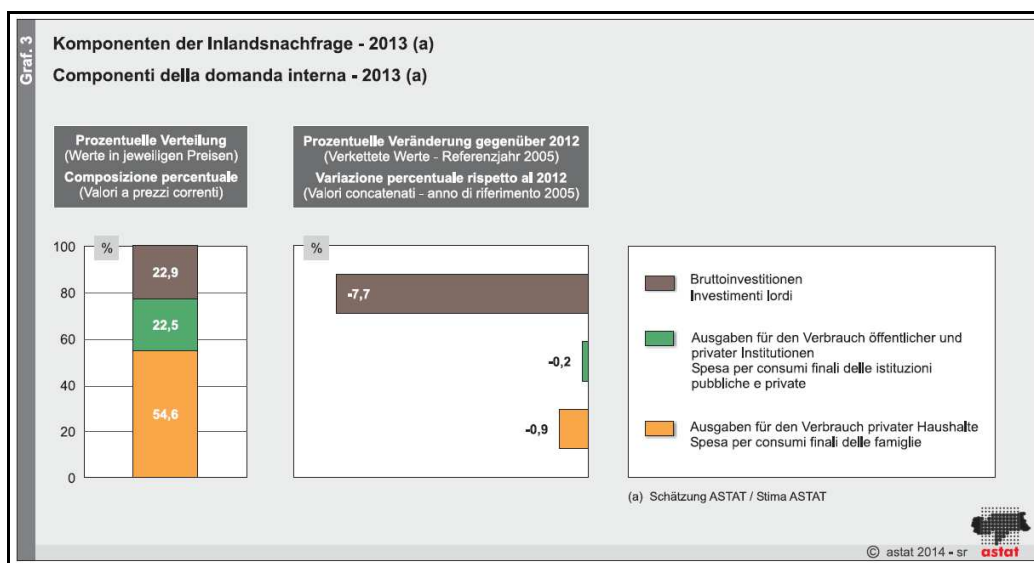

² Dati ASTAT – Info n° 22 04/2014

Settori economici e la crisi internazionale³:

Comparto manifatturiero: il settore manifatturiero risente ancora della crisi economica, solo il 66% delle imprese segnala una redditività positiva per il secondo semestre 2013. Gli ordinativi sono diminuiti sia sul mercato altoatesino, sia – in misura ancora maggiore – sul mercato italiano. Le imprese lamentano inoltre un aumento dei costi di produzione. Per quanto concerne le singole branche di attività, la quota di imprese con redditività positiva resta relativamente elevata nel comparto alimentare, nella fabbricazione di prodotti chimici e materie plastiche e nella produzione di macchinari e apparecchiature, mentre soffrono di più i comparti “materiali da costruzione”, “carta, stampa e grafica” e “legno e mobili”. Per il primo semestre 2014 non si prevedono importanti miglioramenti. L’indice di redditività atteso è pari al 69%.

Edilizia: il clima di fiducia nell’edilizia rimane negativo, anche se nel secondo semestre l’indice di redditività (60%) è migliorato rispetto alla prima metà dell’anno (48%). Le imprese lamentano la debolezza della domanda sul mercato locale e nazionale, cui si aggiunge l’aumento dei costi. I problemi riguardano tutti i comparti del settore: costruzioni di edifici, impiantistica e soprattutto costruzione di infrastrutture. La situazione resterà tesa anche nel primo semestre 2014, con un indice di redditività attesa pari al 65%. Le aspettative degli operatori del settore sono pessimistiche sotto tutti gli aspetti: volume d’affari e ordinativi, prezzi di vendita, costi di produzione e, purtroppo, occupazione.

Commercio e riparazione di veicoli: i dati sulle immatricolazioni di autoveicoli in Alto Adige riferiti al primo semestre 2013 mostrano un calo del 14% rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente. I fatturati ridotti, gli ordinativi in calo su tutti i mercati e i costi in aumento creano molte preoccupazioni alle imprese. Per il primo semestre 2014 l’indice di redditività dovrebbe però salire al 75%.

Commercio all’ingrosso: il commercio all’ingrosso è in assoluto il settore dell’economia altoatesina che mostra la peggiore redditività. Le imprese che valutano positivamente la propria situazione reddituale nel secondo semestre 2013 sono infatti poco più della metà (56%). Tale risultato è essenzialmente dovuto al calo della domanda, soprattutto sul mercato italiano. La crisi economica si ripercuote anche sulle imprese del commercio all’ingrosso che svolgono la funzione di “ponte” tra l’area economica italiana e i paesi di lingua tedesca. Inoltre, per effetto della crisi dell’edilizia, la recessione ha colpito in modo particolarmente forte il commercio di legname e materiali da costruzione. Per la prima metà del 2014 è previsto un significativo miglioramento della redditività: l’indice dovrebbe raggiungere il 77%, il fatturato e gli ordinativi dovrebbero tornare a crescere su tutti i mercati.

Commercio al dettaglio: la percentuale di esercenti che ritengono soddisfacente la redditività conseguita nel secondo semestre 2013 è pari al 73%, in aumento rispetto al 67% del primo semestre. Le imprese lamentano comunque fatturati in contrazione e costi in crescita. La situazione è simile in quasi tutti i settori merceologici, con qualche difficoltà in più per i commercianti di arredamento e di articoli per il tempo libero. Per il primo semestre 2014 le

³ Dati IRE – Barometro dell’economia – Risultati provvisori 2013 e previsioni 2014

imprese si attendono un miglioramento della situazione reddituale: l'81% prevede di poter conseguire risultati positivi.

Trasporti

In questo settore è necessario distinguere tra il trasporto di persone e quello di merci. Il primo ha subito in misura minore le conseguenze della crisi: la riduzione del fatturato è stata contenuta e gran parte delle imprese (83%) mantengono anche nel secondo semestre 2013 una situazione reddituale positiva. Le attività legate al trasporto merci e alla logistica sono invece più sensibili all'andamento congiunturale. Solo il 68% dei trasportatori di merci ha registrato una redditività soddisfacente. Per il prossimo anno gli operatori prevedono una stabilizzazione della situazione reddituale e dell'occupazione. La quota di imprese che ritengono di poter conseguire una redditività soddisfacente nel primo semestre 2014 si attesta all'83% nel trasporto persone e al 75% nel trasporto merci.

Alberghi e ristoranti:


Nel secondo semestre l'indice di redditività di alberghi e ristoranti è risalito al 75%. Tale dato rispecchia l'andamento delle presenze turistiche, che nella stagione estiva è stato relativamente migliore rispetto ai mesi invernali del 2013. Per il primo semestre del 2014 gli imprenditori temono una contrazione della redditività, a causa della probabile diminuzione degli ospiti italiani. Di conseguenza, solo il 68% si attende un risultato soddisfacente.

Servizi: il settore dei servizi si sta rivelando molto resistente alla crisi. L'indice di redditività per il secondo semestre 2013 si attesta al 75% ed è pertanto superiore alla media dell'economia altoatesina. Bisogna tuttavia tenere presente che si tratta di un settore assai eterogeneo: in particolare, i giudizi sulla redditività sono positivi nel comparto dei servizi alle imprese, assai meno buoni per quanto riguarda i servizi finanziari ed assicurativi e i servizi alle persone. Nel primo semestre 2014 la quota di imprese in grado di ottenere una redditività soddisfacente dovrebbe salire all'84%.

Agricoltura


Anche nel secondo semestre del 2013 l'agricoltura ha confermato di essere il settore dell'economia altoatesina che meno risente della crisi. Nonostante i costi di produzione siano aumentati, tutte le cooperative (100%) hanno potuto corrispondere ai produttori prezzi buoni o almeno soddisfacenti. Le aspettative per il primo semestre 2014 restano molto positive. Anche nel caso dei prodotti agricoli si registra un calo della domanda sul mercato italiano, ma questo viene spesso compensato dal buon andamento del mercato locale e di quello estero. I prezzi erogati ai produttori dovrebbero essere generalmente soddisfacenti nella frutticoltura e nella viticoltura e addirittura buoni per quanto riguarda il latte.

Come si può evincere dal grafico che segue (elaborazioni ASTAT: info n° 22 del 04/2014), il valore aggiunto registrato nel 2013 per il settore dell'agricoltura e della silvicoltura evidenzia con +7,4% il maggiore incremento economico, dato da ricondurre almeno parzialmente al prezzo più elevato della raccolta di mele.

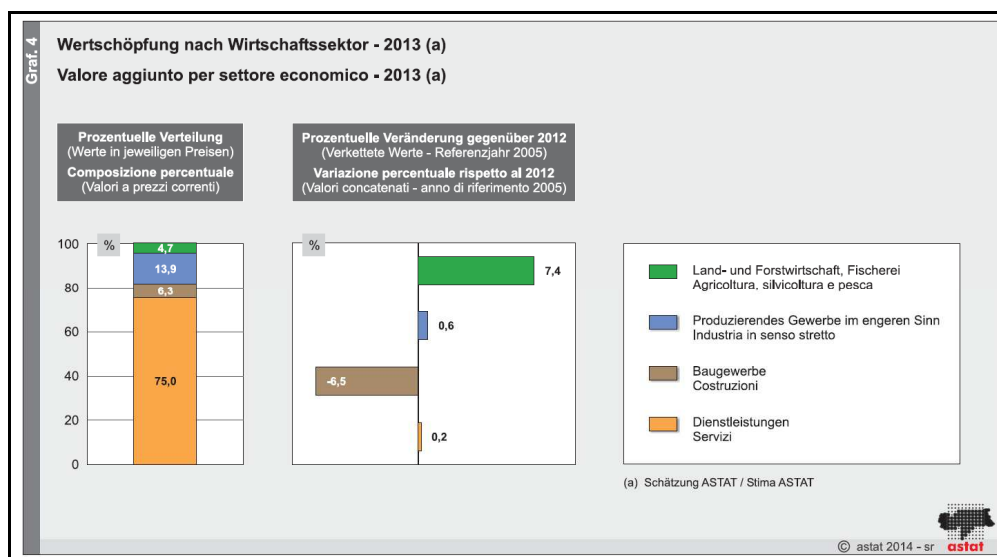

Andamento delle esportazioni⁴

Il 4° trimestre 2013 conferma la tendenza positiva registrata già nell'ultima parte del 2012 e proseguita nei primi tre segmenti del 2013. Le esportazioni superano per la prima volta in assoluto il miliardo di euro, attestandosi a quota 1.026,7 milioni. Rispetto allo stesso trimestre del 2012 si segnala una crescita pari al 4,0%.

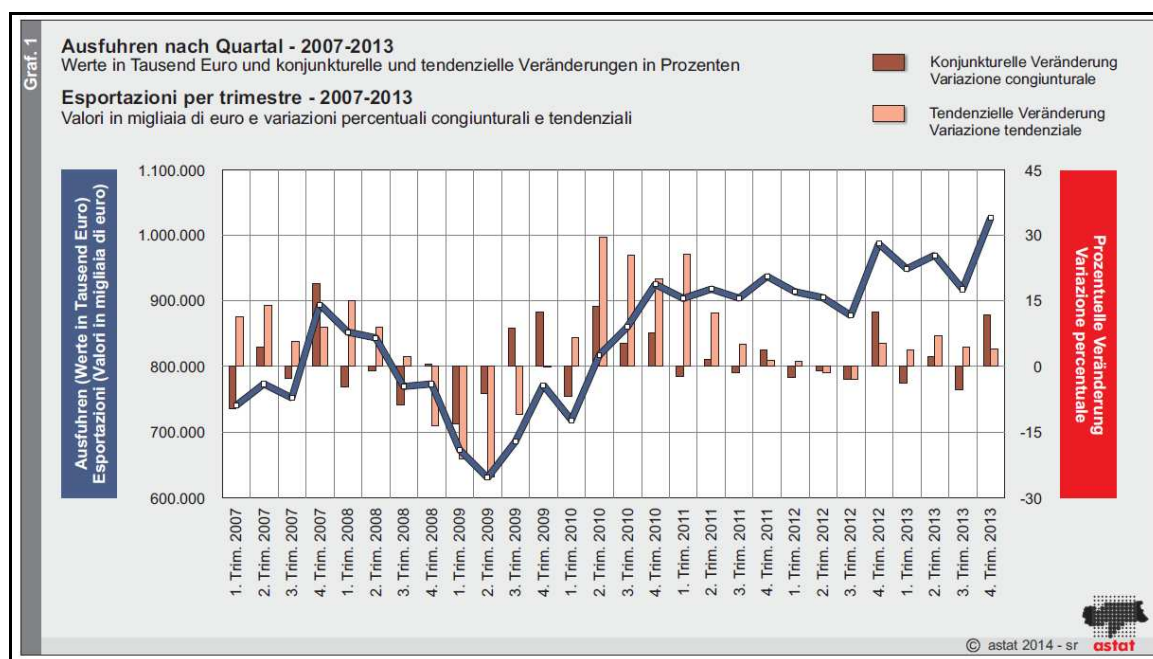

Il buon risultato delle esportazioni del 4° trimestre va a sommarsi agli incrementi fatti segnare nei primi 3 trimestri; l'anno 2013 si è chiuso quindi con una crescita del 4,8% rispetto all'anno precedente. In valore assoluto il 2013 ha superato per la prima volta la quota di 3,8 miliardi di euro.

Le destinazioni europee prevalenti sono Germania (34,7%), Austria (10,5%), Francia (5,8%) e Svizzera (5,6%). Al di fuori dell'Europa, Asia ed America assorbono rispettivamente una quota pari al 7,8% ed al 6,0% dell'export.


⁴ Dati Astat – Info n°14 03/2014

L'export verso i paesi dell'Unione Europea risulta aumentato del 3,8% rispetto al 2012. Tra i partner principali, la Spagna (+19,4%) fa segnare l'incremento maggiore, seguita dalla Francia (+15,8%), dalla Svizzera (+7,3%) e dalla Germania (+6,6%), mentre si evidenzia una flessione (-4,3%) per l'Austria. Si segnalano inoltre forti incrementi tendenziali verso alcuni partner commerciali che incidono poco sul totale esportazioni dell'Unione Europea: +38,6% verso la Croazia, +24,5% verso la Lituania, +22,2% verso l'Ungheria.

Si rileva anche una ripresa significativa delle esportazioni verso alcuni dei paesi maggiormente coinvolti dalla crisi economica (Spagna e Grecia), mentre sono in calo le esportazioni verso tutti i paesi del Benelux e verso alcuni Paesi del Nord e dell'Est Europa.

Nei paesi extra UE si evidenzia quasi ovunque una ripresa ancora più cospicua (+7,6%), più marcata in Oceania (+48,0%, ma su valori assoluti relativamente bassi); incrementi alti anche nei Paesi europei non-UE (+10,1%) ed in America (+9,8%). Anche l'Asia segna una ripresa (+5,6%) dopo il pesante calo (-24,4%) dell'anno precedente. Unico continente in controtendenza è quello africano, che registra un calo del 9,9% dopo il boom del 2012 (+63,2%).

Andamento dei prezzi e inflazione:⁵

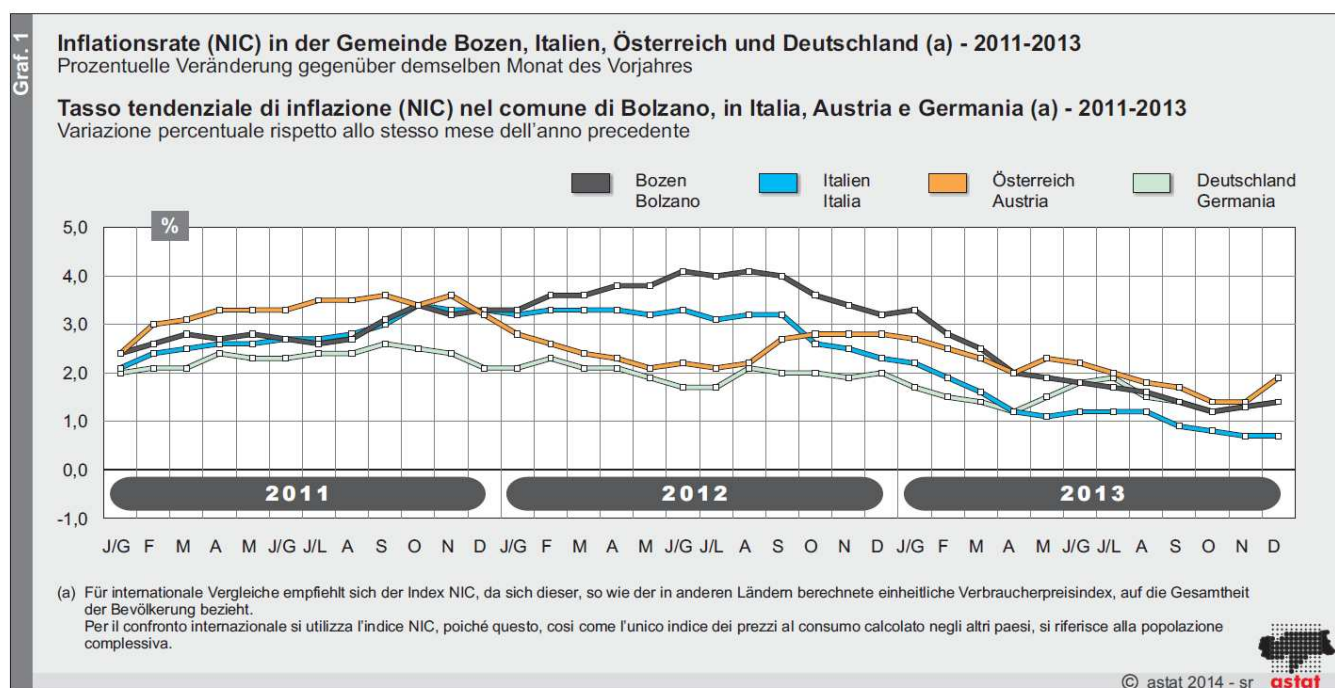

In Italia il tasso di inflazione medio ha raggiunto nel 2013 un valore pari all'1,1%, mentre nel comune di Bolzano si è attestato all'1,9%. Entrambi i valori risultano in netto calo rispetto al 2012, dove si erano attestati rispettivamente al 3,0% e al 3,5%. Rispetto al 2011, l'aumento medio dei prezzi è stato del 4,2% in Italia, mentre nel comune di Bolzano tale valore è stato del 5,4%. Nel biennio 2012-2013 i tassi tendenziali mensili e le medie annuali registrati in Italia non sono mai stati più alti rispetto a quelli rilevati a livello locale.

Dal confronto dei tassi d'inflazione mensili dell'anno 2013 si palesano principalmente due aspetti. Da un lato su base annua si registra un calo continuativo del tasso di inflazione. All'inizio dell'anno questo ammontava al 2,2% in Italia e al 3,3% a Bolzano, con una netta

⁵ Dati Astat – Info n°3 di gennaio 2014

inversione di tendenza fino ad aprile, quando il tasso di crescita dei prezzi è passato rispettivamente all'1,1% e all'1,9%. Questo livello si è mantenuto poi all'incirca fino ad agosto, per registrare in seguito un ulteriore ribasso generale, con valori minimi, per l'Italia dello 0,6% tra novembre e dicembre, a Bolzano dell'1,1% in ottobre. Dall'altro il dato del comune di Bolzano, a confronto con il dato nazionale, mostra tassi di crescita più elevati in tutto il corso dell'anno. La differenza, la quale in gennaio era ancora di 1,1 punti percentuali, è diminuita continuamente e nel mese di ottobre ha raggiunto il valore più basso (0,4 punti percentuali), sebbene poi sia tornata ad aumentare verso la fine dell'anno.

Occupazione:⁶

Indikatoren zur Erwerbstätigkeit - 2007-2013								
Indicatori sull'occupazione - 2007-2013								
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Erwerbstätige (a)	229.500	235.200	237.300	240.300	240.400	245.200	245.300	Occupati (a)
Männer	133.400	134.800	135.200	136.200	135.500	136.500	136.800	Maschi
Frauen	96.100	100.500	102.000	104.200	104.900	108.700	108.500	Femmine
Arbeitsuchende (a)	6.100	5.700	7.000	6.700	8.300	10.600	11.400	Personen in cerca di occupazione (a)
Männer	2.800	2.600	3.400	3.200	4.200	5.100	5.600	Maschi
Frauen	3.300	3.100	3.600	3.500	4.100	5.500	5.800	Femmine
Erwerbsquote (b)	71,7	72,3	72,6	73,1	73,5	75,0	74,9	Tasso di attività (b)
Männer	81,2	80,7	80,8	81,1	81,3	81,8	81,7	Maschi
Frauen	61,9	63,7	64,2	65,1	65,5	68,1	68,0	Femmine
Arbeitslosenquote (c)	2,6	2,4	2,9	2,7	3,3	4,1	4,4	Tasso di disoccupazione (c)
Männer	2,0	1,9	2,5	2,3	3,0	3,6	3,9	Maschi
Frauen	3,3	3,0	3,4	3,2	3,8	4,8	5,0	Femmine
Nichterwerbspersonen (ab 15 Jahren) (a)	164.900	165.200	166.500	168.100	170.500	167.400	170.300	Non forze di lavoro (15 anni e oltre) (a)
Männer	60.300	61.700	62.500	63.700	65.400	65.500	66.600	Maschi
Frauen	104.700	103.500	104.100	104.500	105.100	101.900	103.700	Femmine

(a) Die Werte wurden auf 100 gerundet; daher stimmen die Summen der Einzelwerte nicht immer mit den Gesamtsummen überein.
I valori sono stati arrotondati al centinaio e, pertanto, non sempre la somma delle singole cifre corrisponde al totale.

(b) Quotient aus Erwerbspersonen (= Erwerbstätige + Arbeitsuchende) und Bevölkerung zwischen 15 und einschließlich 64 Jahren
Rapporto tra le forze di lavoro (= occupati + persone in cerca di occupazione) e la popolazione tra 15 e 64 anni inclusi

(c) Quotient aus Arbeitsuchenden und Erwerbspersonen (= Erwerbstätige + Arbeitsuchende)
Rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le forze di lavoro (= occupati + persone in cerca di occupazione)

Quelle: ISTAT, Auswertung des ASTAT


Fonte: ISTAT, elaborazione ASTAT

Come emerge dalla rilevazione campionaria sulle forze di lavoro del 2013, delle 426.900 persone con almeno 15 anni di età residenti in provincia di Bolzano, 256.600 risultano attive nel mondo del lavoro (forze di lavoro), in quanto occupate (245.300) o in cerca di occupazione (11.400). Ne consegue un tasso di disoccupazione del 4,4%; la disoccupazione femminile si mantiene più alta (5,0%) rispetto a quella maschile (3,9%). Il tasso di attività si è attestato invece al 74,9%; anche in questo caso rimane grande la differenza tra il tasso maschile (81,7%) e quello femminile (68,0%), ma si nota un progressivo avvicinamento fra i due tassi. Il numero delle persone in cerca di lavoro rispetto all'anno precedente è nuovamente aumentato e ammonta nella media annuale 2013 a 11.400; ne deriva una quota di disoccupazione del 4,4%. Se invece consideriamo i valori stagionali, troviamo nel quarto trimestre 2013 un numero di persone in cerca d'occupazione di 10.500, da cui deriva per tale trimestre un tasso di disoccupazione congiunturale del 4,1% (3,8% femminile e 4,3% maschile).

⁶ Dati Astat – Info n°9 del 2/2014


Occupati per settore di attività:⁶

Nel grafico che segue sono riportati gli occupati per settore di attività economica e sesso rilevati nell'anno 2013. Si può evincere che lo scorso anno gli occupati nel settore dell'agricoltura sono stati rispettivamente l'8,1% ed il 4,3% del totale degli occupati maschi e femmine.

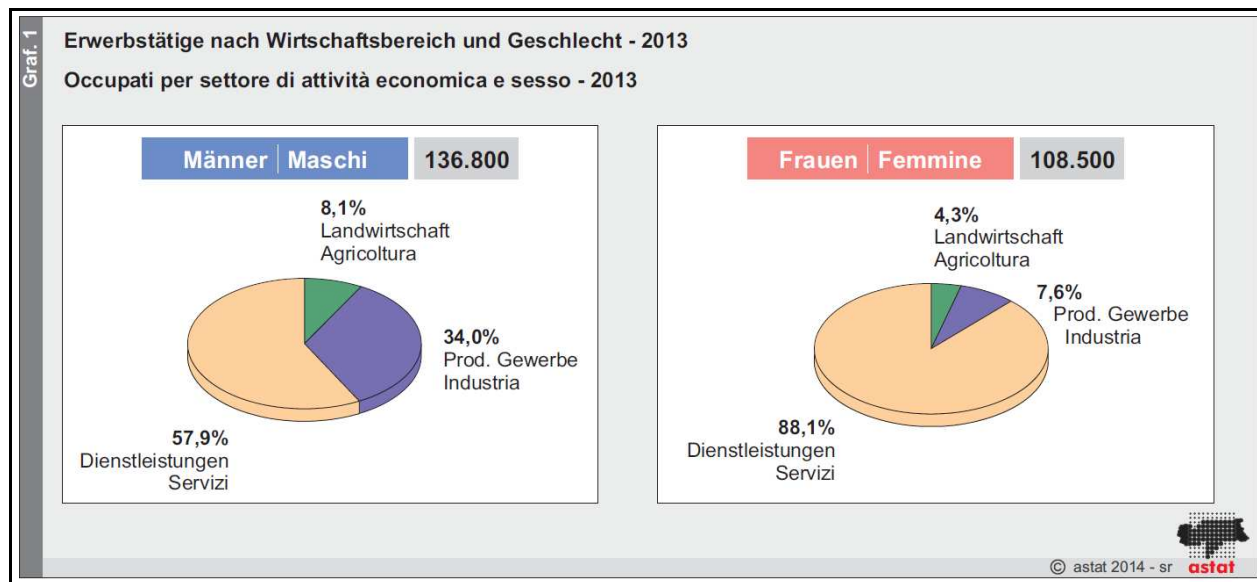

Se si analizza la serie storica evidenziata nella tabella e nel grafico che seguono, si noterà come siano aumentati nel 2013 gli occupati maschi in agricoltura, mentre per le donne si è registrato un leggero calo. Anche nel settore dell'industria il numero di maschi occupati è lievemente cresciuto, mentre è calato nel settore dei servizi. Per le donne viene rilevato un leggero aumento sia nel settore dei servizi che nel settore dell'industria.


Settori economici	2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine
Agricoltura	8,80%	5,60%	8,60%	4,20%	8,50%	4,30%	7,90%	3,80%	7,90%	4,80%	8,1%	4,3%
Servizi	57,10%	84,70%	56,50%	86,20%	56,60%	85,90%	56,70%	87,30%	58,20%	87,80%	57,9%	88,1%
Industria	34,10%	9,70%	34,90%	9,60%	34,90%	9,90%	35,40%	8,90%	33,90%	7,40%	34,0%	7,6%

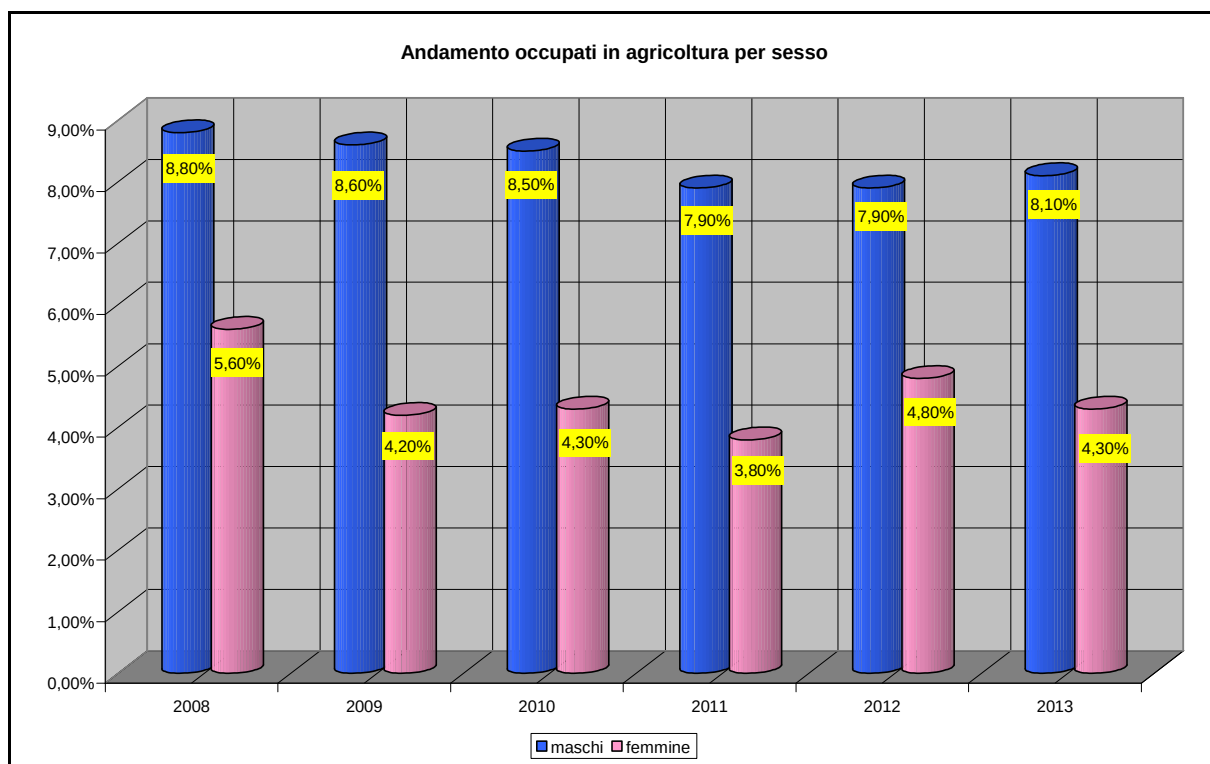

Andamento del settore del latte:⁷


Nel 2013 la produzione di latte in Italia è stata pari a circa di 10,7 milioni di tonnellate; la Provincia Autonoma di Bolzano ha contribuito per un 3,4% del valore rilevato.

Sul territorio provinciale nello scorso anno la produzione di latte conferita alle latterie sociali ha interessato 5.043 produttori e si è attestata sui 370,5 milioni di chilogrammi.

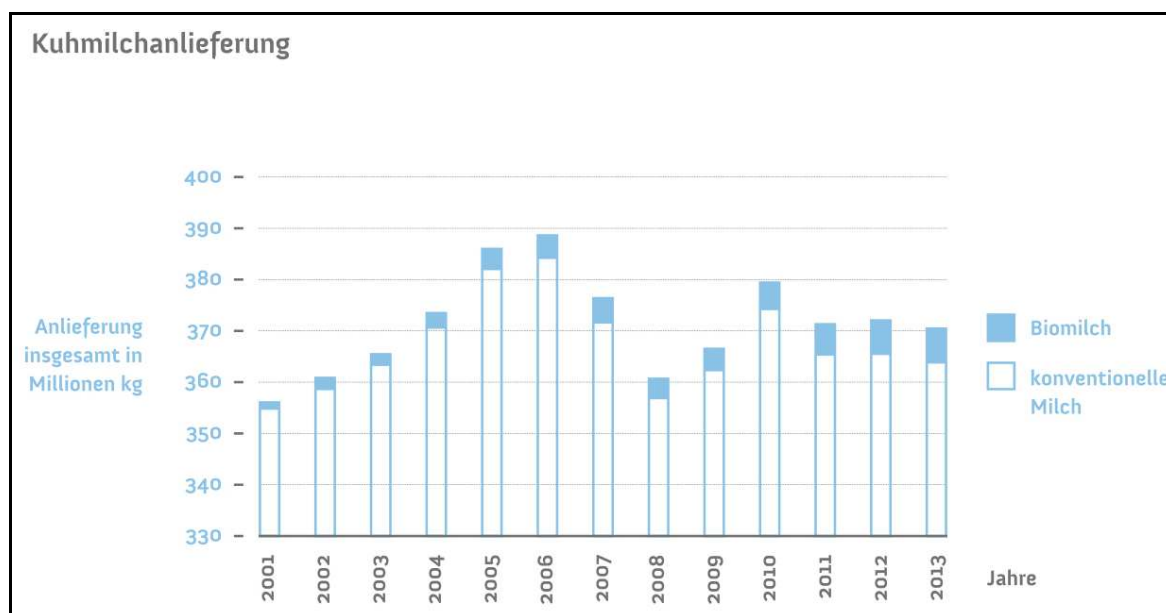


Ciò rappresenta un leggero calo pari allo 0,4% rispetto al 2012, anno in cui si era registrata una certa stabilizzazione nei conferimenti. Va segnalata con preoccupazione la costante diminuzione del numero di allevatori nel corso degli anni, proseguita anche nel 2013. Gli a-

agricoltori che restano sul mercato diminuiscono numericamente, ciò si sta riflettendo anche sui quantitativi di latte prodotti.

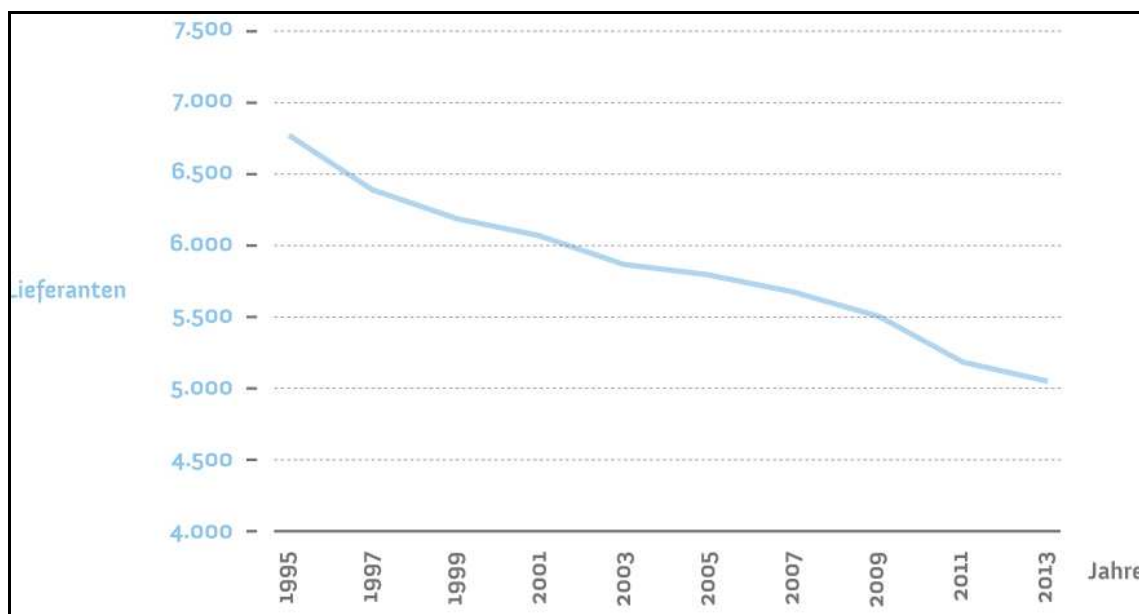

Il prezzo medio del latte del 2013 ammonta a 52,23 centesimi di € al chilo: ciò corrisponde ad un aumento rispetto al 2012 di 1,28 centesimi al chilo, pari al 2,5%. Complessivamente ai 5.043 produttori sono stati liquidati dalle latterie sociali 193,5 milioni di €. Ciò non determina però un incremento del reddito netto dei produttori provinciali a causa dei crescenti costi di produzione.

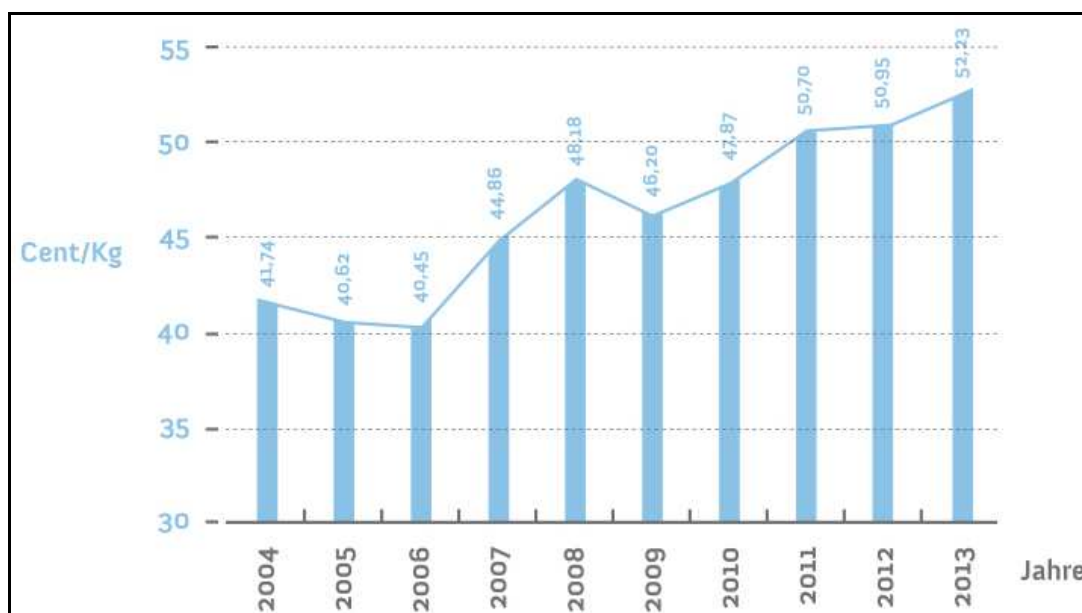

Possibili ricadute dell'attuale situazione economica sul PSR e meccanismi che possono favorire l'accesso agli aiuti:

Nei precedenti Rapporti Annuali di Esecuzione la preoccupazione delle ricadute negative nell'attuazione del Programma era incentrata sui rischi di un aumento delle difficoltà di autofinanziamento da parte dei beneficiari privati (investimenti aziendali, singoli e collettivi)

e, in secondo luogo, degli Enti pubblici chiamati a realizzare le infrastrutture nell'ambito del PSR attraverso appalti o comunque con l'affidamento dei lavori a ditte esterne.

La crisi finanziaria sembra aver colpito maggiormente i beneficiari pubblici rispetto a quelli privati. Mentre gli agricoltori e le cooperative di agricoltori hanno mantenuto costante il livello di investimenti rispetto al passato, sembrano essere i Comuni provinciali a risentire maggiormente della crisi. I mancati gettiti derivanti dalla riduzione del PIL hanno imposto tagli drastici nei bilanci comunali che possono ripercuotersi soprattutto sugli investimenti infrastrutturali del PSR localizzati nelle zone più marginali dei territori comunali. Considerando che la situazione congiunturale dell'economia non è certamente migliorata nel corso del 2013, si devono ipotizzare ritardi nella realizzazione delle misure a carattere pubblico, soprattutto dell'asse 4.

I meccanismi messi in atto per bilanciare la tendenza negativa nella realizzazione di investimenti sono i seguenti:

- 1) Aumento degli anticipi: il Reg. (CE) n. 1974/2006 così come modificato dal Reg. (CE) n. 679/2011, rende permanente il tasso del 50% degli anticipi. La possibilità di ricevere metà del contributo subito dopo l'approvazione del progetto può permettere un'accelerazione dell'esecuzione degli investimenti, privati e pubblici, garantendo la necessaria copertura finanziaria per il completamento delle opere. La modifica del PSR del 4 novembre 2011 (approvata dalla CE il 7 febbraio 2012) rende definitivi gli anticipi al 50% per 8 misure del PSR della Provincia Autonoma di Bolzano;
- 2) Costituzione di un fondo speciale IVA: il 29 luglio 2009 in Conferenza Stato - Regioni è stata sancita l'intesa sulla norma di non rendicontabilità dell'IVA, con l'istituzione presso ciascun Organismo pagatore di un Fondo speciale IVA, alimentato con risorse regionali, attraverso il quale lo stesso Organismo Pagatore è autorizzato a rimborsare l'importo dell'IVA non recuperabile e non rendicontabile alla Commissione Europea nel quadro delle operazioni finanziate dal FEASR.

In data 6 gennaio 2010 è entrata in vigore una modifica legislativa che autorizza l'Organismo pagatore provinciale a rimborsare l'importo dell'IVA non recuperabile e non rendicontabile agli aventi diritto, derivante dalla gestione degli aiuti e degli interventi previsti nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige.

In data 8 novembre 2010 è stata approvata dalla Giunta provinciale la delibera n. 1776 che definisce criteri e modalità per il rimborso dell'importo dell'IVA non recuperabile e non rendicontabile ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 6 della legge provinciale n. 11/98. La delibera è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol in data 16 novembre 2010.

Attraverso tale fondo provinciale i soggetti pubblici che realizzano con risorse del PSR interventi infrastrutturali stanno ottenendo un supporto finanziario non trascurabile.

- 3) Il ruolo centrale dei premi a superficie dell'asse 2, soprattutto nelle misure 211 e 214, si è confermato anche nel corso del 2013: in questa difficile fase di crisi economica e finanziaria questi aiuti rappresentano una percentuale importante del reddito medio annuo delle piccole aziende agricole di montagna provinciali.

1.1.2. Variazioni sostanziali delle condizioni generali relative all'ambiente:

Generalità:

Rispetto alle indicazioni del testo del programma approvato nel corso del 2007, non si segnalano nel corso del 2013 variazioni sostanziali delle condizioni legislative a livello provinciale in grado di influire sull'attuazione di una o più misure o del programma nel suo complesso. Di seguito si riportano informazioni di dettaglio sulle variazioni intercorse a livello legislativo per due settori di particolare importanza per la programmazione dello Sviluppo Rurale, l'attuazione della Direttiva Nitrati e di Natura 2000.

Modifiche 2013 relative all'attuazione delle direttive comunitarie "Habitat" e "Uccelli" (rete Natura 2000) in Provincia Autonoma di Bolzano:

Nel corso del 2013 non si segnalano variazioni sostanziali a livello provinciale riguardo l'attuazione delle direttive comunitarie 79/409/CEE ("Uccelli"), sostituita dalla direttiva 2009/147/CE, e 92/43/CEE ("Habitat"), relative alla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche. Non sono stati designati altri siti e zone vulnerabili ai sensi della rete Natura 2000.

Modifiche 2013 relative all'attuazione della Direttiva "Nitrati":

Con l'emanazione del regolamento di esecuzione alla Legge Provinciale 18 giugno 2002, n. 8 "Disposizioni sulle acque" in materia di tutela delle acque, decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, sono state definite al capo II le "norme di buona pratica agricola intese a ridurre o limitare l'inquinamento delle acque". Con tale regolamento si dà piena attuazione anche in provincia di Bolzano alla Direttiva "Nitrati" definendo i criteri e le limitazioni per l'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti, le dosi di applicazione, le caratteristiche dei depositi di stoccaggio degli effluenti di allevamento e le norme relative alle zone vulnerabili da nitrati.

L'Agenzia Provinciale per l'Ambiente provvede al regolare monitoraggio delle acque superficiali e delle acque sotterranee e, qualora si presentassero situazioni critiche per la contaminazione da nitrati di origine agricola, alla delimitazione delle zone vulnerabili. In tal caso predispone, in collaborazione con la Ripartizione Agricoltura, programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque.

Nel corso del 2013 non sono state individuate zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, in quanto non sono state riscontrate situazioni che necessitano particolari interventi di salvaguardia e risanamento. In particolare nella Provincia di Bolzano in base ai dati della rete di monitoraggio non sono presenti:

- acque superficiali che contengono una concentrazione di nitrati superiore a 50 mg/l;
- acque superficiali utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile, che contengono o possono contenere una concentrazione di nitrati superiore a 50 mg/l;
- acque sotterranee con una concentrazione di nitrati superiore a 50 mg/l;
- laghi naturali di acque dolci o altre acque dolci con la presenza di fenomeni di eutrofizzazione imputabili all'attività agricola.

Non essendo state individuate zone vulnerabili, non sono stati definiti programmi d'azione ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 152/2006.

Modifiche 2013 relative all'attuazione della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE in Provincia Autonoma di Bolzano:

La Provincia autonoma di Bolzano ha elaborato un progetto per il rinnovo del Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche attualmente in vigore, risalente al 1986. Tale progetto di piano è stato approvato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 704 del 26.04.2010 ed è in attesa di approvazione con Decreto del Presidente della Repubblica. Il distretto "Alpi orientali" ha provveduto ad elaborare il piano di gestione in applicazione della direttiva 2000/60/CE e lo ha inviato alle competenti strutture della Commissione.

Effetti derivanti dai cambiamenti climatici⁸:

Il 2013 dal punto di vista meteorologico può essere classificato come mite e piovoso. Gli scarti rispetto ai valori di riferimento risultano generalmente compresi tra 0.5° e 1.0° confermando di fatto il trend degli ultimi anni. Particolarmente miti sono stati i mesi di gennaio, luglio, agosto e dicembre mentre la stagione primaverile è stata piuttosto fredda.

La temperatura più elevata del 2013 è stata rilevata il 6 agosto a Bolzano (37.7 °C), valore più elevato degli ultimi 10 anni. La presenza del sole è stata minore rispetto agli anni precedenti. In particolare durante i mesi primaverili e durante la fine dell'autunno il soleggiamento è stato inferiore alla norma. In molti settori del territorio le precipitazioni cumulate sono state superiori del 20-30% rispetto alle medie di lungo periodo.

Di seguito le particolarità meteorologiche del 2013:

- gennaio molto mite
- primavera piuttosto fredda
- in giugno: temporale con chicchi di grandine molto grandi
- arrivo tardo dell'estate, giorni particolarmente caldi a partire da luglio, caldo fino a settembre
- ottobre con precipitazioni abbondanti e con un anticipo di inverno
- nevicate abbondanti a fine dicembre.

1.1.3. Variazioni sostanziali delle condizioni generali relative alla qualità della vita nelle aree rurali:

Banda larga:

Storia: fino al 2004 la copertura a banda larga in Alto Adige era affidata ai singoli operatori di telefonia presenti sul territorio e quindi fortemente influenzata dal ritorno economico che la copertura di una determinata area poteva garantire nel breve periodo. A partire dal 2005, la Giunta Provinciale si attiva per garantire la copertura a banda larga del territorio, vista come un elemento fondamentale per la crescita e lo sviluppo dell'Alto Adige. Per tale motivo nello stesso anno la Giunta approva una delibera con un obiettivo molto preciso: entro il 2009 deve essere garantita la copertura del territorio provinciale con connessioni a banda larga alle seguenti categorie:

- a tutte le aziende con più di 3 dipendenti
- al 95 % di tutte le aziende con 3 o meno dipendenti
- al 90% della popolazione locale.

⁸ Elaborazioni dell'Ufficio Idrografico – Provincia Autonoma di Bolzano – Clima Report n. 216– Dicembre 2013

Sapendo che l'obiettivo non poteva essere raggiunto nella data prefissata solo attraverso l'utilizzo di cavi a fibra ottiche, si sono studiate delle soluzioni alternative in grado di soddisfare la sempre più pressante richiesta di connessioni ad alta velocità. Sono quindi state indette gare d'appalto per costruire una rete wireless con tecnologia HiperLAN che utilizza le frequenze radio per il trasporto di dati garantendo così la copertura del territorio. Il primo bando di gara pubblicato nel 2006 ha riguardato la "Messa a disposizione manutenzione e assistenza di connessioni a banda larga in 14 comuni" divisi in 13 lotti: Castelrotto, Valle Aurina, Predoi, Renon, Badia, Malles Nova Ponente, Racines, Tirolo, Marebbe, Fié allo Sciliar, Termeno, Rasun Anterselva, Gais.

Il secondo bando di gara, pubblicato nel 2007 si prefiggeva la stessa finalità in ben 44 comuni: Aldino, Andriano, Anterivo, Avelengo, Braies, Caines, Casies, Castebello Ciardes, Cornedo all'Isarco, Curon Venosta, Falzes, Funes, Glorenza, Lasa, Lauregno, La Valle, Lusson, Madonna di Senale, Martello, Meltina, Moso in Passiria, San Martino in Badia, San Martino in Passiria, San Pancrazio, Selva dei Molini, Senales, Sluderno, Stelvio, Terento, Tesimo, Tires, Tubre, Ultimo, Vandoies, Verano, Villandro.


Si è aggiudicata la gara l'associazione temporanea di imprese BB44+ costituita da Brennercom, Raiffeisen online e RUN. Nel 2009 in seguito ad una trattativa con la BB44+ la copertura in banda larga è stata estesa a ulteriori 46 frazioni di 21 comuni, alle stesse condizioni previste nel secondo bando di gara. Il risultato: gli obiettivi dichiarati alla Giunta Provinciale nel 2005 sono stati raggiunti. È chiaro però che in questo modo non tutta la popolazione altoatesina avrebbe avuto a disposizione un collegamento ADSL, per questo è stato deciso di sollecitare gli operatori di telefonia affinché mettessero a disposizione un collegamento attraverso la rete satellitare per chi abita in aree lontane dai centri abitati, oppure in zone in cui la copertura con la rete wireless risulta tecnicamente molto complessa o totalmente antieconomica.

Parallelamente alla copertura wireless si è continuato a lavorare alla realizzazione della rete telematica provinciale vale a dire alla connessione di tutti i 116 comuni dell'Alto Adige in fibra ottica. La realizzazione di questa rete richiede molto più tempo, in quanto comporta dapprima la posa di tubazioni e pozzetti negli appositi scavi realizzati lungo le direttrici principali del territorio e successivamente il cablaggio attraverso l'utilizzo di cavi in fibra ottica. L'esecuzione dei necessari interventi è stata affidata all'Ufficio Provinciale Infrastrutture ed Opere Ambientali. Attualmente la rete provinciale è costituita da 530 km di cavidotti ai quali vanno aggiunti i 230 km di fibra già posati.

Sviluppi futuri: la Provincia ha programmato i finanziamenti necessari al completamento della rete primaria e secondaria entro la fine del 2014, in modo tale da garantire a tutti i gestori l'utilizzo di una rete ad alta velocità che permetta poi di fornire ai cittadini ed alle imprese servizi di alta qualità. Terminata questa fase, l'attenzione della Pubblica amministrazione si concentrerà sulla realizzazione della rete d'accesso che consentirà a ognuno di avere a disposizione, a casa propria, una connessione in fibra ottica.

Fino a quel momento rimane comunque anche l'obiettivo del completamento della rete wireless che garantirà anche alle piccole realtà (frazioni con pochi nuclei familiari) di avere a disposizione una connessione in banda larga.

Progetti di banda larga in Alto Adige

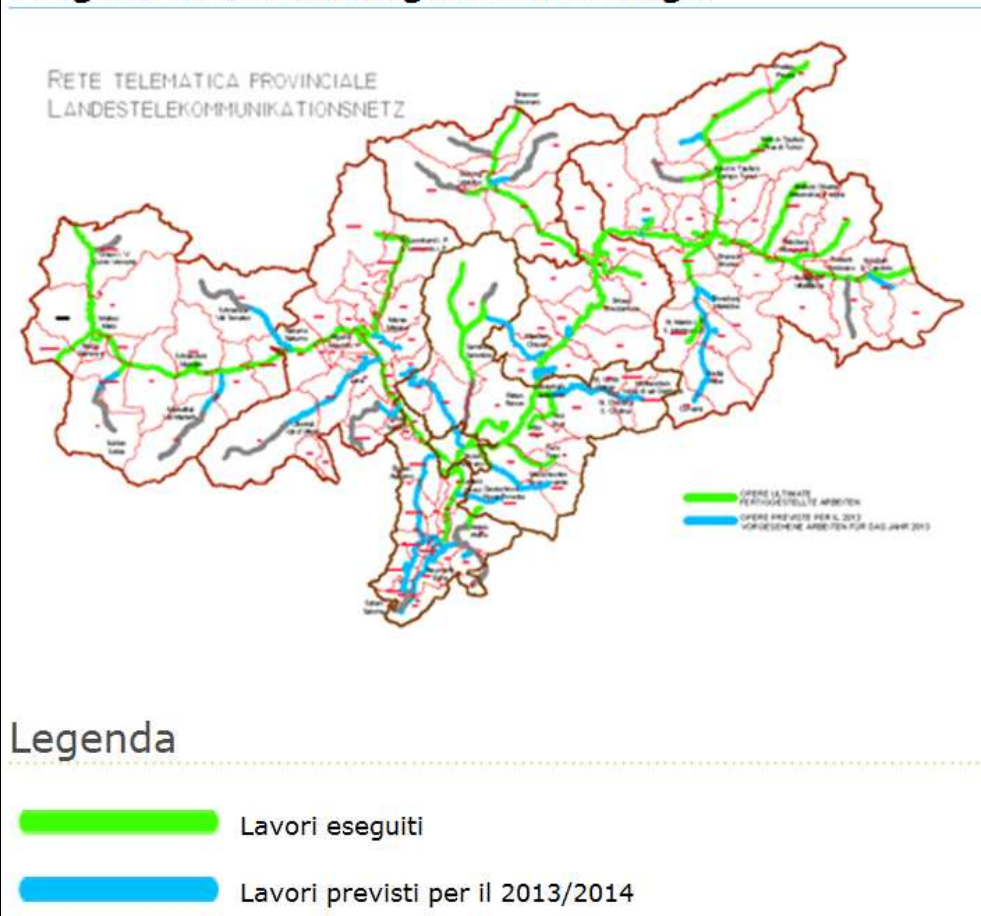

Opere pubbliche:

Nel corso del 2013 l'Amministrazione provinciale ha destinato 58 milioni di € per opere relative ai settori dell'edilizia scolastica (28 milioni di €), delle scuole materne (10 milioni di €), per opere di acquedottistica, canalizzazione, case di riposo, centri di degenza e alloggi per anziani (10 milioni di €) ed altri progetti finanziabili (10 milioni di €).

L'Amministrazione provinciale prosegue, anche in una situazione di oggettiva difficoltà finanziaria legata agli effetti della crisi economica, negli investimenti sul territorio provinciale puntando al costante miglioramento dei servizi essenziali per i cittadini: le azioni promosse nell'ambito del PSR vanno intese quindi come un'attività complementare rispetto a quella istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano svolta con fondi del proprio bilancio, attività in grado di avere un effetto sinergico sullo sviluppo dei servizi essenziali nelle zone rurali.

1.2. Modifiche della politica nazionale o comunitaria:

1.2.1. Variazioni sostanziali delle condizioni legislative a livello comunitario:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione, del 12 aprile 2013:

È stata accolta dal Comitato sviluppo rurale del 20 marzo 2013 la proposta di modifica del Reg. (CE) 1974/2006 relativa all'identificazione del primo gruppo di regole per la transizione degli interventi di sviluppo rurale dalla corrente alla futura programmazione.

La proposta di modifica del Reg. (CE) 1974/2006 prevede:

- l'incremento della flessibilità dall' 1% al 3% del limite massimo per le modifiche finanziarie dei PSR 2007-2013 nell'ambito della procedure delle modifiche in assenza di Decisione comunitaria;
- la possibilità di estendere sino al 2014 (e quindi non più sino al 2013) la durata degli impegni pluriennali a valere dei contratti in corso per agro-ambiente-foreste-benessere animali;
- l'inclusione delle sole misure "113 - Prepensionamento", 131 "Rispetto delle norme basate sulla legislazione comunitaria", "221 - Primo imboschimento dei terreni agricoli" e "223 - Imboschimento dei terreni non agricoli" all'interno della cosiddetta "lista negativa" ovvero delle misure dei PSR 2007-2013 per le quali non sarà possibile assumere nuovi impegni nei confronti dei beneficiari dopo il 31 dicembre 2013;
- la definizione delle regole per l'identificazione del momento in cui le autorità di gestione finiscono di assumere impegni a valere sulla corrente programmazione ed iniziano ad assumere impegni sui PSR 2014-2020 (cosiddetta regola del "cut-off").

Nella Gazzetta Ufficiale della UE Serie L 347 del 20 dicembre 2013 sono stati pubblicati i regolamenti di base della Politica di coesione, della PAC e della ricerca per la programmazione 2014-2020.

Si segnalano i principali regolamenti di base di riferimento per lo sviluppo rurale:

- Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che

abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014.

1.2.2. Variazioni sostanziali delle condizioni legislative a livello nazionale:

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 12704 del 17 ottobre 2013:
con tale decreto vengono aggiornate e prorogate fino al 31.12.2017 la Strategia Nazionale 2009-2013 e la Disciplina ambientale nazionale, in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di programmi operativi.

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 15938 del 20 dicembre 2013:
con tale decreto vengono stabilite le modalità e le condizioni per applicare la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti inserita nel programma nazionale di sostegno alla viticoltura per le campagne vitivinicole dal 2013/2014 al 2017/2018 e corrispondere gli aiuti previsti.

Piano Strategico Nazionale:

Nel corso dell'anno 2013 il PSN non è stato cambiato e pertanto non ci sono variazioni che impattano sull'attuazione del PSR.

Condizionalità:

Non si segnalano modifiche nel corso del 2013 al Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Aiuti diretti – articolo 68:

Relativamente agli aiuti diretti nel 2013 non ci sono state variazioni rilevanti.

Tabacco, Zucchero, Fondo Europeo per la Pesca (FEP):

I settori in questione non hanno rilevanza per la Provincia Autonoma di Bolzano.

1.2.3. Variazioni sostanziali delle condizioni legislative a livello provinciale:

Condizionalità:

Con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1310 del 9 settembre 2013, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige n. 38 del 17 settembre 2013, sono stati aggiornati alcuni riferimenti normativi relativamente al recepimento provinciale in materia di benessere degli animali.

Disposizioni in materia di violazioni (in riferimento al Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, modificato dal DM 10346 del 13 maggio 2011):

Con Delibera n. 1312 del 09.09.2013 sono state riapprovate le direttive di applicazione relative alle misure 211 e 214 del PSR. In particolare, è stato aggiornato nei parametri per il calcolo del premio l'importo unitario massimo per l'intervento base della misura 214.1 – colture foraggere. Il testo della Delibera è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige n. 38 del 17 settembre 2013.

Per le misure strutturali, invece, vengono applicati direttamente l'articolo 72, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1698/2005 e gli articoli 30 e 31 del Reg. (CE) n. 1975/2006 per le domande di pagamento presentate anteriormente al 1 gennaio 2011, per le domande di pagamento presentate successivamente a tale data gli articoli 29 e 30 del Reg. (UE) n. 65/2011 che sostituisce ed abroga il Reg. CE n. 1975/2006.

Aiuti diretti – articolo 68:

Il PSR Health Check approvato il 17 dicembre 2009 contiene una tabella di demarcazione tra misure agroambientali ed art. 68. La demarcazione approvata nel 2009 tiene conto delle tipologie di intervento ammissibili con i due strumenti comunitari evitando sovrapposizioni tra PSR e domanda unica. Di particolare rilevanza per la Provincia Autonoma di Bolzano sono le norme di demarcazione tra i premi dell'intervento 214-2 (razze minacciate) del PSR ed i premi per vacche nutrici (primipare e pluripare) di razze da carne ed a duplice attitudine purché iscritte a libri genealogici od a registri anagrafici dell'articolo 68. Prima di poter considerare erogabile il saldo e della domanda unica e delle domande della misura 214 del PSR da parte dell'Organismo Pagatore, è stato concordato con quest'ultimo di richiedere al Mipaaf una verifica della validità della demarcazione contenuta nel PSR. La demarcazione del PSR ha trovato conferma ufficiale da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con la circolare del 30 marzo 2011. Nel corso del 2013 non si devono segnalare modifiche a livello provinciale.

Agriturismo:

Nel corso del 2013 non si devono segnalare modifiche normative a livello provinciale.

Foreste:

Nel corso del 2013 non si devono segnalare modifiche normative a livello provinciale.

Distretti agroalimentari e rurali:

Nel corso del 2013 non sono state operate modifiche normative a livello provinciale per quanto concerne i distretti agroalimentari e rurali.

 ELER	 AUTONOMIE PROVINZ SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO	 REPUBBLICA ITALIANA
Hier werden Europa- und Bundesmittel	 ES - von 1993/2005	 Reg. (CE) 1060/2005

Aiuti di Stato (sostegno agli agricoltori in difficoltà a causa della crisi economica e finanziaria):
 Nel corso del 2013 tale regime di aiuti non è stato attivato da parte della Provincia Autonoma di Bolzano.

Commissione Tecnica – Legge Provinciale 23 del 19 novembre 1993:

Con la Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14, pubblicata nel Supplemento n. 1 al B.U. 20 dicembre 2011, n. 51, l'importo di preventivo sopra al quale i progetti vengono valutati dalla Commissione Tecnica è stato aumentato a 1.500.000 €.

1.3. Cronistoria del PSR:

Anno 2013:

Principali novità amministrative del 2013	Data
Convocazione a Bolzano della settima seduta del Comitato di Sorveglianza, in cui presentare il rapporto annuale d'esecuzione 2012 e discutere la programmazione dello sviluppo rurale per il periodo 2014 - 2020.	7 giugno 2013
Approvazione attraverso la procedura scritta di consultazione del comitato di sorveglianza e successiva notifica alla Commissione Europea (25 giugno) di una decima proposta di modifica del PSR. Si riportano brevemente i contenuti della proposta di modifica: A) ai sensi dell'articolo 6.1.(a) del Reg. (CE) n. 1974/2006 viene proposto di introdurre una distinzione tra tasso di partecipazione medio indicativo e tasso applicabile per i pagamenti per quanto riguarda il FEASR, al fine di chiarire i tassi reali da applicare per la conclusione del PSR. Inoltre, si propone di sostituire con la quota di cofinanziamento nazionale le attuali quote statale e provinciale di cofinanziamento; B) ai sensi dell'articolo 6.1.(c) del Reg. (CE) n. 1974/2006 viene proposto un aggiornamento della tabella 9.B ("Elenco dei regimi di aiuto autorizzati a norma degli articoli 87, 88 e 89 del trattato che saranno utilizzati per l'attuazione del programma - Parte B: misure e operazioni che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 36 del Trattato").; C) ai sensi dell'articolo 6.1.(c) del Reg. (CE) n. 1974/2006, nel punto "Sintesi dei requisiti previsti dal business plan, inclusi i dettagli sulla frequenza e sulle modalità di revisione del business plan", si ritiene necessario introdurre la possibilità di rivedere, a certe condizioni, il business plan in funzione delle mutate condizioni di mercato in cui gli agricoltori provinciali si trovano ad operare; D) ai sensi dell'articolo 6.1.(c) del Reg. (CE) n. 1974/2006, è emerso un refuso tipografico nella misura 123: il limite minimo utilizzato per il settore ortofrutticolo è stato erroneamente inserito anche per il settore vino, portando ad una contraddizione con quanto riportato in altri punti della stessa misura. La proposta riallinea il valore minimo a 0,8 Milioni di €. Inoltre, nella misura 214, quale base legale di riferimento per l'intervento biologico, viene sostituito il Reg. (CE) n. 2092/91 con il Reg. (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007; E) ai sensi dell'articolo 6.1.(c) del Reg. (CE) n. 1974/2006, viene proposto un lieve rifinanziamento della misura relativa ai servizi di sostituzione, assistenza e consulenza aziendali, al fine di utilizzare fondi del Programma che resterebbero inutilizzati in altre misure (112, 211 e 227) per il sostegno all'avviamento di servizi di consulenza a favore delle aziende agricole provinciali;	25 giugno 2013

F) Ai sensi dell'articolo 6.1.(c) del Reg. (CE) n. 1974/2006, viene proposto un trasferimento di risorse finanziarie all'interno delle misure che compongono la misura 413 ed un trasferimento di risorse dalla misura 421 alla 413 al fine di allineare il PSR con i piani finanziari dei PSL.	
Decisione della Commissione Europea che approva la revisione del PSR (Decisione n. C(2013) 7158 del 28.10.2013).	28 ottobre 2013
Approvazione del nuovo testo del PSR da parte della Giunta Provinciale con deliberazione n. 1859 del 9 dicembre 2013.	9 dicembre 2013

1.4. Organigramma:

L'organigramma allegato riporta l'indicazione degli Uffici provinciali incaricati dell'attuazione delle diverse misure del PSR (non sono da segnalare novità rispetto al 2012):

431	Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione	Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura; Ripartizione Foreste
421	Cooperazione interterritoriale e transnazionale	Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura; Ripartizione Foreste
323	Promozione e valorizzazione del patrimonio rurale	Ripartizione Natura e Paesaggio
322	Riqualificazione e sviluppo dei villaggi	Ufficio Servizi agrari
321	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale	Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura; Ufficio Edilizia rurale; Ripartizione Foreste
313	Incentivazione di attività turistiche	Ripartizione Foreste; Ufficio edilizia rurale
311	Diversificazione verso attività non agricole	Ufficio edilizia rurale.
227	Sostegno agli investimenti non produttivi	Ripartizione Foreste.
226	Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi	Ripartizione Foreste.
214	Pagamenti agro-ambientali	Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura.
211	Pagamenti per imprenditori agricoli per gli svantaggi naturali presenti nelle zone di montagna	Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura.
133	Sostegno alle associazioni di produttori per le attività di promozione e informazione riguardanti i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare	Ufficio Zootechnia.
132	Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare	Ufficio Zootechnia.
125	Infrastrutture connesse allo sviluppo ed all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	Ufficio edilizia rurale; Ripartizione Foreste.
124	Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo ed in quello alimentare	Ufficio Zootechnia; Ripartizione Foreste.
123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura; Ripartizione Foreste.
122	miglioramento del valore economico delle foreste	Ripartizione Foreste.
121	Ammodernamento delle aziende agricole	Ufficio edilizia rurale.
115	Avviamento di servizi di assistenza, di sostituzione e di consulenza aziendale	Ufficio meccanizzazione agricola.
112	Insediamiento di giovani agricoltori	Ufficio proprietà coltivatrice.
111	Azioni di formazione professionale e di informazione delle persone attive nei settori agricolo e forestale	Ripartizione Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica; Ripartizione Foreste.
Misure		
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	Uffici provinciali responsabili dell'attuazione	

2. Andamento del programma rispetto agli obiettivi fissati, sulla base di indicatori di prodotto e di risultato (articolo 82, paragrafo 2, lettera b) – situazione al 31 dicembre 2013:

2.1. Misure attivate:

Nelle due tabelle seguenti viene riportato lo stato di ciascuna misura del PSR 2007-2013, sintetizzando se la misura nel corso del 2013 sia stata attivata e cioè se siano state protocollate nuove domande di aiuto e, in tal caso, il loro numero. I dati sono suddivisi tenendo conto separatamente delle risorse ordinarie e di quelle Health Check. Non necessariamente la presentazione di domande ha permesso l'erogazione di aiuti già nel corso del 2013, considerati i tempi necessari per la realizzazione di investimenti, tipo quelli aziendali o per le infrastrutture in zona di montagna. I dati relativi ai pagamenti per misura effettuati nel corso del 2013 vengono presentati in uno specifico capitolo della presente relazione annuale a cui si rimanda.

2.1.1. Risorse ordinarie - elenco delle misure attivate:

Misura/Asse	Stato della misura - anno 2013	Domande presentate ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 - anno 2008	Domande presentate ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 - anno 2009	Domande presentate ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 - anno 2010	Domande presentate ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 - anno 2011	Domande presentate ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 - anno 2012	Domande presentate ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 - anno 2013
Misura 111 [1]	Attivata	4 nel settore formazione professionale 3 nel settore forestale	8 nel settore formazione professionale 5 nel settore forestale	7 nel settore formazione professionale 1 nel settore forestale	0 nel settore formazione professionale 0 nel settore forestale	7 nel settore formazione professionale 7 nel settore forestale	0 nel settore formazione professionale 7 nel settore forestale
Misura 112 (*) [2]	Attivata	164	301	289	266	273	150(*****)
Misura 113	Non prevista	No	No	No	No	No	No
Misura 114	Non prevista	No	No	No	No	No	No
Misura 115 [3]	Attivata	1	1	1	0	0	1
Misura 121 [4]	Attivata	42	10	58	1	0	1
Misura 122 [5]	Attivata	313 per interventi selvicol- turali 217 per macchinari forestali	251 per interventi selvicol- turali 181 domande per macchinari forestali	286 domande per macchinari forestali	61 domande per macchinari forestali	306 domande per macchinari forestali	0
Misura 123 [6]	Attivata	12 nel settore agro-industriale 17 nel settore forestale	9 nel settore agro-industriale 12 nel settore forestale	16 nel settore forestale	6 nel settore agro-industriale 14 nel settore forestale	2 nel settore agro-industriale 25 nel settore forestale	1 nel settore agro-industriale (*****) 3 domande nel settore forestale
Misura 124 [7]	Attivata	No	1 nel settore agricolo	No	1 nel settore forestale	1 nel settore agricolo 2 nel settore forestale	0 domande nel settore forestale 0 nel settore agricolo
Misura 125 [8]	Attivata	1 nel settore agricolo 38 nel settore forestale	2 nel settore agricolo 17 nel settore forestale	21 nel settore forestale	35 nel settore forestale	2 nel settore agricolo 27 nel settore forestale	2 nel settore agricolo 0 domande nel settore forestale
Misura 126	Non prevista	No	No	No	No	No	No
Misura 131	Non prevista	No	No	No	No	No	No

Misura 132 [9]	Non attivata	0	0	0	0	0	0
Misura 133 [10]	Attivata	No	1	0	0	1	0
Misura 141	Non prevista	No	No	No	No	No	No
Misura 142	Non prevista	No	No	No	No	No	No
TOTALE ASSE 1		806	799	679	384	653	165
Misura 211 (**) [11]	Attivata	8.426	8.449	8.392	8.415	8.345	8.290
Misura 212	Non prevista	No	No	No	No	No	No
Misura 213	Non prevista	No	No	No	No	No	No
Misura 214 (***) [12]	Attivata	10.233	10.222	10.532 (di cui HC 2.196); (di cui 2.110 solo intervento 214- 7)	10.785 (di cui HC 2.271); (di cui 2.166 solo intervento 214-7)	10.536 (di cui HC 2.237); (di cui 2.120 solo intervento 214-7)	10.574 (di cui HC 2.174); (di cui 2.037 solo intervento 214-7)
Misura 215	Non prevista	No	No	No	No	No	No
Misura 216	Non prevista	No	No	No	No	No	No
Misura 222	Non prevista	No	No	No	No	No	No
Misura 223	Non prevista	No	No	No	No	No	No
Misura 224	Non prevista	No	No	No	No	No	No
Misura 225	Non prevista	No	No	No	No	No	No
Misura 226 [13]	Attivata	10	21	19	20	19	0
Misura 227 [14]	Attivata	2	5	4	2	5	5
TOTALE ASSE 2		18.671	18.697	18.947	19.222	18.905	18.869
Misura 311 [15]	Attivata	95	36	66	12	9	0
Misura 312	Non prevista	No	No	No	No	No	No
Misura 313 [16]	Attivata	12	2	6	23	17	16
Misura 321 [17]	Attivata	37 acquedotti rurali 22 rete rurale	14 acquedotti rurali 1 rete rurale	5 acquedotti rurali	3 acquedotti rurali	5 acquedotti rurali 3 rete viaria rurale	0 acquedotti rurali 0 rete viaria rurale
Misura 322 (****)	Non prevista	No	No	No	No	No	No
Misura 323 [18]	Attivata	5	13	12	15	10	11
Misura 331	Non prevista	No	No	No	No	No	No
Misura 341	Non prevista	No	No	No	No	No	No
TOTALE ASSE 3		171	66	89	53	44	27
411 Competitivi- tà [19]	Attivata	No	5 (111) 1 (123) 2 (124)	2(111)	2 (111)	1 (111)	0 (111) 0 (123) 0 (124)
412 Gestione del- l'ambiente/del ter- ritorio	Non prevista	No	No	No	No	No	No
413 Qualità della vi- ta/diversificazion e [20]	Attivata	1 (sottomisura 313)	4 (313 A) 7 (313 C) 6 (322) (****)	13 (313 A/B) 10 (313C) 9 (322) (****)	13 (313 A/B) 3 (313 C) 5 (322) (****)	9 (313 A/B) 17 (313 C) 11 (322) (****)	24 (313 A/B) 23 (313 C) 15 (322) (****)
421 Coop. inter- terr.le e transn.le [21]	Attivata	0	0	0	0	5	2
431 Gestione gruppi di azione locale, acquisi- zione di compe- tenze, animazio- ne [22]	Attivata	5	6	4	4	3	5
TOTALE ASSE 4		6	31	38	27	46	69
511 Assistenza tecnica	Non prevista	No	No	No	No	No	No
TOTALE PSR		19.654	19.593	19.753	19.686	19.648	19.130

(*) Per la misura 112, Insediamento di giovani agricoltori, i dati delle domande si riferiscono sia alla quota cofinanziata ordinaria che alle risorse aggiuntive provinciali Top Up previste dal PSR.

(**) Per la misura 211, Indennità compensativa, i dati delle domande si riferiscono sia alla quota cofinanziata ordinaria che alle risorse aggiuntive provinciali Top Up previste dal PSR.

(***) Per la misura 214, Misure agroambientali, i dati in tabella si riferiscono a tutte le domande pervenute e approvate nel corso del 2010 - 2013; le domande che sono state quantificate nella successiva tabella Health Check (intervento 214-1) sono qui comprese; con le risorse Health Check è stata infatti finanziata una parte delle domande dell'intervento 214-1.

(****) La misura 322 è prevista esclusivamente nell'ambito della misura 413 (LEADER); tutti i dati relativi alla misura quindi sono stati riferiti alla misura 413.

(*****) La misura 112 e la misura 123 sono interessate dalla transizione ai sensi degli articoli 1 e 3 del Reg. (UE) n. 1310/2013: le domande presentate verranno istruite ed approvate entro il 2014 e la liquidazione sarà a carico dei fondi del PSR 2014-2020.

Misura/Asse	Stato della misura - <u>anno 2013</u>	Domande <u>ap-provate</u> dalla Giunta Provinciale - anno 2008	Domande <u>ap-provate</u> dall'Assessore competente - <u>anno 2009</u>	Domande <u>ap-provate</u> dall'Assessore competente - <u>anno 2010</u>	Domande <u>ap-provate</u> dall'Assessore competente - <u>anno 2011</u>	Domande <u>ap-provate</u> dall'Assessore competente - <u>anno 2012</u>	Domande <u>ap-provate</u> dall'Assessore competente - <u>anno 2013</u>
Misura 111 [1]	Attivata	4 nel settore formazione professionale 3 nel settore forestale	8 nel settore formazione professionale 5 nel settore forestale	7 nel settore formazione professionale 1 nel settore forestale	0 nel settore formazione professionale 0 nel settore forestale	5 nel settore formazione professionale 7 nel settore forestale	0 nel settore formazione professionale 7 nel settore forestale
Misura 112 (*) [2]	Attivata	128	126	181	141	137	0
Misura 113	Non prevista	No	No	No	No	No	No
Misura 114	Non prevista	No	No	No	No	No	No
Misura 115 [3]	Attivata	No	1	2	0	0	1
Misura 121 [4]	Attivata	No	45	29	6	0	1
Misura 122 [5]	Attivata	506	413	259 domande per macchinari forestali	61 domande per macchinari forestali	270 domande per macchinari forestali	0
Misura 123 [6]	Attivata	7 nel settore agro-industriale 9 nel settore forestale	5 nel settore agro-industriale 9 nel settore forestale	8 nel settore agro-industriale 9 nel settore forestale	0 nel settore agro-industriale 9 nel settore forestale	5 nel settore agro-industriale 23 nel settore forestale	2 nel settore agro-industriale 23 nel settore forestale
Misura 124 [7]	Attivata	No	No	No	1 nel settore forestale	1 nel settore agricolo 2 nel settore forestale	0 nel settore forestale 0 nel settore agricolo
Misura 125 [8]	Attivata	38 nel settore forestale	17 nel settore forestale	2 nel settore agricolo 21 nel settore forestale	35 nel settore forestale	0	4 nel settore agricolo 0 nel settore forestale
Misura 126	Non prevista	No	No	No	No	No	No
Misura 131	Non prevista	No	No	No	No	No	No
Misura 132 [9]	Non attivata	0	0	0	0	0	0
Misura 133 [10]	Attivata	No	No	1	0	1	0
Misura 141	Non prevista	No	No	No	No	No	No
Misura 142	Non prevista	No	No	No	No	No	No
TOTALE ASSE 1		695	629	520	253	451	76
Misura 211 (**) [11]	Attivata	8372	8.443	8.385	8407	8337	8.274
Misura 212	Non prevista	No	No	No	No	No	No
Misura 213	Non prevista	No	No	No	No	No	No
Misura 214 (***) [12]	Attivata	10.100	10.072	10.493 (di cui HC 2.196); (di cui 2.106 solo intervento 214-	10.768 (di cui HC 2.271); (di cui 2.163 solo intervento	10.490 (di cui HC 2.237); (di cui 2.112 solo intervento	10.566 (di cui HC 2.174); (di cui 2.037

				7)	214-7)	214-7)	solo intervento 214-7
Misura 215	Non prevista	No	No	No	No	No	No
Misura 216	Non prevista	No	No	No	No	No	No
Misura 222	Non prevista	No	No	No	No	No	No
Misura 223	Non prevista	No	No	No	No	No	No
Misura 224	Non prevista	No	No	No	No	No	No
Misura 225	Non prevista	No	No	No	No	No	No
Misura 226 [13]	Attivata	10	21	19	20	0	0
Misura 227 [14]	Attivata	1	5	4	2	5	5
TOTALE ASSE 2		18.483	18.541	18.901	19.197	18.832	18.845
Misura 311 [15]	Attivata	57	48	53	10	23	0
Misura 312	Non prevista	No	No	No	No	No	No
Misura 313 [16]	Attivata	12	2	6	23	17	16
Misura 321 [17]	Attivata	21 acquedotti rurali 22 rete rurale	16 acquedotti rurali 1 rete rurale	6 acquedotti rurali	3 acquedotti rurali	4 acquedotti rurali 3 rete viaria ru- rale	6 acquedotti rurali 0 rete viaria rurale
Misura 322 (****)	Non prevista	No	No	No	No	No	No
Misura 323 [18]	Attivata	5	13	12	15	10	11
Misura 331	Non prevista	No	No	No	No	No	No
Misura 341	Non prevista	No	No	No	No	No	No
TOTALE ASSE 3		117	80	77	51	57	33
411 Competitività [19]	Attivata	No	5 (111) 1 (123) 2 (124)	2(111)	0 (111)	3 (111)	0 (111) 0 (123) 0 (124)
412 Gestione dell'am- biente/del territorio	Non prevista	No	No	No	No	No	No
413 Qualità della vi- ta/diversificazione [20]	Attivata	No	4 (313 A) 4 (313 C) 4 (322) (****)	13 (313 A/B) 6 (313C) 11 (322) (****)	13 (313 A/B) 3 (313 C) 3 (322) (****)	9 (313 A/B) 12 (313 C) 7 (322) (****)	24 (313 A/B) 23 (313 C) 21 (322) (****)
421 Coop. interterr.le e transn.le [21]	Attivata	0	0	0	0	5	2
431 Gestione gruppi di azione locale, ac- quisizione di compe- tenze, animazione [22]	Attivata	No	8	4	4	4	7
TOTALE ASSE 4		-	27	36	23	40	77
511 Assistenza tecnica	Non prevista	No	No	No	No	No	No
TOTALE PSR		19.295	19.277	19.534	19.524	19.380	19.031

Domande complessivamente pervenute:

Nel corso del 2013 sono pervenute complessivamente 19.130 domande, di cui 165 (0,9%) sono relative a misure dell'asse 1, 18.869 (98,6%) a misure dell'asse 2, 27 (0,1%) a quelle dell'asse 3 e 69 (0,4%) alle misure dell'asse 4.

I dati sono stabili negli anni e quindi sono da giudicare in maniera positiva, sia per le misure a superficie che per quelle d'investimento. I timori della fase iniziale del programma legati a ripercussioni della crisi economica sul volume degli investimenti aziendali, singoli e non, non hanno avuto seguito.

Si sono rivelate necessarie e giustificate le rimodulazioni finanziarie effettuate durante l'attuazione del programma dall'Autorità di Gestione. Rispetto alla decisione iniziale di approvazione del PSR le risorse disponibili sono state ottimizzate riducendole per alcune misure e concentrandole su quelle di maggiore interesse per i potenziali beneficiari

Misure attivate/non attivate:

Per quasi tutte le misure sono pervenute all'Amministrazione provinciale nuove domande di aiuto, che sono state protocollate e, successivamente ad una valutazione tecnico-economica da parte dei funzionari delle Ripartizioni coinvolte nell'esecuzione del programma, approvate formalmente con Decreto dell'Assessore competente.

Le misure previste nel PSR 2007-2013 sono complessivamente 22; al 31 dicembre 2013 risultano attivate 21 misure, pari al 95%.

Riguardo la misura 132, la mancata attivazione dipende dal fatto che il sostegno alla partecipazione degli agricoltori provinciali a sistemi di qualità è già finanziato dall'Amministrazione provinciale con fondi propri e non con i fondi del PSR. Non essendo stato possibile azzerare completamente fondi previsti per questa misura, si è proceduto ad una rimodulazione finanziaria trasferendo la quasi totalità delle risorse verso altre misure dello stesso asse per le quali sussiste un maggiore bisogno finanziario.

Domande presentate/approvate ai sensi delle misure dell'asse 1:

Complessivamente nel corso degli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 sono state presentate 3.486 domande (rispettivamente 806, 799, 679, 384, 653 e 165). Di queste risultano approvate 2.624 domande (75%).

Di seguito viene illustrata la situazione di ciascuna misura:

- Misura 111: le domande presentate/approvate complessivamente sono 49 / 47.
- Misura 112: le domande presentate/approvate complessivamente sono 1.443/ 713.
- Misura 115: sono state presentate ed approvate 4 domande relative.
- Misura 121: le domande presentate/approvate complessivamente sono 112 / 81.
- Misura 122: le domande presentate/approvate complessivamente sono 1.615/ 1.509.
- Misura 123: le domande presentate/approvate complessivamente sono 117/ 109.
- Misura 124: le domande presentate/approvate complessivamente sono 5 / 4: dopo ripetute verifiche dell'effettivo fabbisogno sulla base delle domande di aiuto presentate, le Ripartizioni provinciali 31 e 32, Agricoltura e Foreste, sono pervenute alla conclusione della necessità di rimodulare le risorse assegnate a questa misura a favore di altri interventi dell'asse 1, per i quali le richieste si sono rivelate superiori all'attuale disponibilità.
- Misura 125: le domande presentate/approvate complessivamente sono 145 / 117; da segnalare che per la parte agricola i progetti previsti sono complessivamente 6, di notevoli dimensioni finanziarie.
- Misura 133: sono state presentate ed approvate complessivamente due domande. Per questa misura è stata operata una riduzione delle risorse assegnate in funzione del reale fabbisogno evidenziato.

Domande presentate/approvate ai sensi delle misure dell'asse 2:

Tutte e 4 le misure previste sono state attivate: le domande pervenute ai sensi delle due misure forestali (226 e 227) sono complessivamente 112, di cui 92 approvate.

Per quanto riguarda la misura 211 le domande pervenute ammontano in media a 8.386 all'anno, con oscillazioni minime nei sei anni trascorsi. Il dato va considerato molto positivamente e consente di affermare che l'indennità compensativa rappresenta una misura fondamentale per l'agricoltura di montagna, ampiamente diffusa presso gli agricoltori e per questo in grado di estrinsecare un effetto positivo sia sull'economia della montagna che sugli equilibri idrogeologici e sugli aspetti ambientali e paesaggistici del territorio.

Come esplicitato nella nota a piè della tabella delle risorse ordinarie, il dato del 2011, 2012 e 2013 comprende tutte le domande pervenute, le quali sono state liquidate oltre che con risorse comunitarie anche con fondi Top Up provinciali. Ciò è dovuto al pieno utilizzo delle risorse comunitarie e del relativo cofinanziamento statale. Anche per il 2014 è previsto che le domande dell'indennità compensativa siano liquidate con fondi Top Up (è in corso una richiesta di modifica del programma alla Commissione Europea per innalzare la dotazione finanziaria provinciale Top Up per questa misura).

Per quanto riguarda la misura 214, il numero di domande pervenute nel 2013 ha raggiunto quota 10.574; il dato medio relativo ai sei anni di campagna è pari a 10.480. Va precisato, inoltre, che parte delle domande del 2013 (precisamente 2.174 domande), relative all'intervento 214-1 (Colture foraggere), sono state liquidate con fondi addizionali Health Check; il dato indicato nella tabella "fondi ordinari" comprende tali domande, il cui numero è riportato anche nella tabella specifica delle risorse HC.

Domande presentate/approvate ai sensi delle misure dell'asse 3:

Complessivamente nel corso nel periodo 2008 - 2013 sono state presentate 450 domande (rispettivamente 171, 66, 89, 53, 44 e 27). Di queste, 415 domande risultano approvate (92%).

Di seguito viene illustrata la situazione di ciascuna misura:

- Misura 311: le domande presentate/approvate complessivamente sono 218 / 191.
- Misura 313: le domande presentate/approvate complessivamente sono 76 / 76.
- Misura 321: le domande presentate/approvate complessivamente sono 90 / 82.
- Misura 322: la misura viene attivata esclusivamente nell'ambito dell'asse LEADER, per cui i dati di attuazione sono rimandati alla misura 413.
- Misura 323: le domande presentate/approvate complessivamente sono 66 / 66.

Rimane globalmente soddisfacente il giudizio sul numero delle domande pervenute ed approvate per le misure dell'asse 3; anche i pagamenti sembrano essere andati finalmente a regime dopo un inizio un po' difficoltoso. Probabilmente, visto il ritardo accumulato nei primi anni, le liquidazioni si protrarranno fino al 2015.

Domande presentate/approvate ai sensi delle misure dell'asse 4:

Complessivamente nel corso del periodo 2008 - 2013 sono state presentate 217 domande (rispettivamente 6, 31, 38, 27, 46 e 69). Di queste, 203 domande risultano approvate (94%).

Di seguito viene illustrata la situazione di ciascuna misura:

- Misura 411: le domande presentate/approvate complessivamente sono 13 / 13; le domande riguardano progetti attinenti alle misure 111, 123 e 124.
- Misura 413: le domande presentate/approvate complessivamente sono 170 / 157; le domande riguardano progetti attinenti alle misure 313 e 322.
- Misura 421: le domande presentate/approvate complessivamente sono 7 / 7.
- Misura 431: le domande presentate/approvate complessivamente sono 27 / 27.

Se globalmente è soddisfacente il giudizio sul numero delle domande pervenute ed approvate per le misure dell'asse 4, va segnalato il ritardo con cui per i progetti finora approvati dai GAL vengono presentate le richieste di liquidazione finale. La situazione, benché continui a migliorare, non è ancora completamente soddisfacente: in ciò ha un grosso peso la ridotta capacità di autofinanziamento dei Comuni rurali, soprattutto di quelli più piccoli e marginali che rientrano nei territori LEADER. Considerato l'attuale stato d'avanzamento finanziario, le liquidazioni si protrarranno fino al 2015.

2.1.2. Risorse Health Check - elenco delle misure attivate:

Misura/Asse	Stato della misura - <u>anno 2013</u>	Domande <u>presentate</u> ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 - anno 2009	Domande <u>presentate</u> ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 - anno 2010	Domande <u>presentate</u> ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 - anno 2011	Domande <u>presentate</u> ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 - anno 2012	Domande <u>presentate</u> ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 - anno 2013	Domande <u>approvate</u> dall'Assessore competente - <u>anno 2009</u>	Domande <u>approvate</u> dall'Assessore competente - <u>anno 2010</u>	Domande <u>approvate</u> dall'Assessore competente - <u>anno 2011</u>	Domande <u>approvate</u> dall'Assessore competente - <u>anno 2012</u>	Domande <u>approvate</u> dall'Assessore competente - <u>anno 2013</u>
Misura 111	Non prevista										
Misura 112	Non prevista										
Misura 113	Non prevista										
Misura 114	Non prevista										
Misura 115	Non prevista										
Misura 121	Attivata	12	12	0	0	0	0	17	7	0	0
Misura 122	Non prevista										
Misura 123	Non prevista										
Misura 124	Non prevista										
Misura 125	Non prevista										
Misura 126	Non prevista										
Misura 131	Non prevista										
Misura 132	Non prevista										
Misura 133	Non prevista										
Misura 141	Non prevista										
Misura 142	Non prevista										
TOTALE ASSE 1		12	12	0	0	0	0	17	7	0	0
Misura 211	Non prevista										
Misura 212	Non prevista										
Misura 213	Non prevista										
Misura 214	Attivata	0	2.196	2.271	2.237	2.174	0	2.196	2.271	2.237	2.174
Misura 215	Non prevista										
Misura 216	Non prevista										
Misura 222	Non prevista										
Misura 223	Non prevista										
Misura 224	Non prevista										
Misura 225	Non prevista										
Misura	Non prevista										

226	sta										
Misura 227	Non prevista										
TOTALE ASSE 2		0	2.196	2.271	2.237	2.174	0	2.196	2.271	2.237	2.174
Misura 311	Non prevista										
Misura 312	Non prevista										
Misura 313	Non prevista										
Misura 321	Non prevista										
Misura 322	Non prevista										
Misura 323	Non prevista										
Misura 331	Non prevista										
Misura 341	Non prevista										
TOTALE ASSE 3											
411 Competitività	Non prevista										
412 Gestione dell'ambiente/del territorio	Non prevista										
413 Qualità della vita/diversificazione	Non prevista										
421 Cooperazione interterritoriale e transnazionale	Non prevista										
431 Gestione gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione	Non prevista										
TOTALE ASSE 4											
511 Assistenza tecnica	Non prevista										
TOTALE PSR		12	2.208	2.271	2.237	2.174	0	2.213	2.278	2.237	2.174

Si ricorda che la modifica Health Check del PSR presentata alla CE il 15 luglio 2009 ed approvata il 17 dicembre 2009 prevedeva inizialmente l'utilizzo delle risorse aggiuntive per tre misure del Programma: la misura 121, la misura 125 e la misura 214 (intervento 214-1). Le richieste di aiuto per le stalle a stabulazione libera (misura 121) nel corso del 2009 e 2010 sono risultate ben superiori alle attese e per poter far fronte alle domande presentate si è re-

sa necessaria nel 2011 una modifica del PSR per trasferire le risorse HC assegnate alla misura 125 alla misura 121. Le risorse aggiuntive HC vengono quindi utilizzate solo nell'ambito di due misure: misura 121 e misura 214 - intervento 1.

Domande complessivamente pervenute:

Nel corso del 2013 sono pervenute complessivamente 2.174 domande, tutte riconducibili alla misura 214 – intervento 1.

Per la misura 121 nel corso del 2013 non sono pervenute domande relative alla realizzazione di progetti HC: tutte e 24 le domande di aiuto presentate a partire dal 2009 risultano approvate con Decreto dell'Assessore.

Misure attivate/non attivate:

Per la misura 121 le domande pervenute sono state superiori alle previsioni, ciò ha comportato, come accennato prima, una rimodulazione finanziaria delle misure a finalità Health Check 121 e 125.

A causa del numero superiore alle previsioni di domande pervenute e liquidate ai sensi dei diversi interventi della 214, le risorse "ordinarie" da destinare all'intervento 214-1 (il più importante del PSR) non sarebbero state sufficienti da sole a garantire il completamento degli impegni per il periodo di programmazione fino a tutto il 2013. Per questo motivo è stata presa la decisione di utilizzare una parte rilevante dei fondi HC per potenziare la dotazione finanziaria dell'intervento 214-1.

Con la campagna 2013 sono proseguite le liquidazioni delle domande della misura 214, intervento 1, con i fondi HC, portando il tasso di realizzazione finanziaria della misura al 92,15%. Ciò ha permesso di rispondere in maniera adeguata alle richieste pervenute, mantenendo forte e variegato l'impatto del PSR dal punto di vista agroambientale fino alla sua conclusione.

2.1.3. Modalità di raccolta ed approvazione delle domande di aiuto:

Qui di seguito si riportano le regole generali adottate per la raccolta e l'approvazione delle domande relative alle misure di investimento del PSR, approvate dal CDS del 6 novembre 2007 e contenute nel testo del PSR approvato:

PSR 2007-2013 (Reg. (CE) n. 1698/2005) Provincia Autonoma di Bolzano Procedure generali di ammissione delle singole iniziative	L'attività di ciascun Ufficio responsabile di misura prevede l'esame delle domande di finanziamento che pervengono da parte dei beneficiari. Se necessario, prima del ricevimento ufficiale delle domande di finanziamento possono essere chiarite con i richiedenti le principali caratteristiche dei progetti, la tipologia delle opere previste ed i costi preventivati, verificando preliminarmente l'ammissibilità dei progetti sulla base dei criteri di selezione stabiliti dal presente Programma. Preliminarmente, per i progetti ritenuti finanziabili, viene verificata, se necessario, anche la presenza delle autorizzazioni necessarie, viene definito con il beneficiario un calendario operativo, che definisca la data di presentazione formale delle domande di contributo, le presumibili date di inizio e di fine lavori, la presumibile data di approvazione dei progetti e la presumibile data di collaudo amministrativo dei lavori eseguiti. Il finanziamento dei progetti dipende dalla loro ammissibilità, dalla disponibilità dei fondi comunitari per la misura del PSR, dalla compatibilità dei tempi di esecuzione dei lavori con i tempi di esecuzione del PSR e dalla compatibilità dei termini presumibili per l'approvazione

	del rendiconto finale delle opere con il termine di chiusura del PSR. I fondi sul bilancio provinciale (cofinanziamento della Provincia Autonoma di Bolzano) vengono stanziati in funzione dei progetti previsti per ciascun anno di programma. Le domande di finanziamento vengono protocollate ed archiviate in ufficio. Le singole domande di contributo possono essere presentate nei nove mesi che intercorrono tra il primo di novembre ed il 31 luglio. Fino all'approvazione del presente documento e per la misura 112, il periodo di presentazione delle domande è compreso tra il primo gennaio ed il 30 settembre. Seguendo l'ordine della data di protocollo, viene svolta la fase istruttoria durante la quale viene eseguito se necessario un sopralluogo presso il beneficiario e viene elaborato, in conformità alla Legge Provinciale 19 novembre 1993, n. 23, un parere del funzionario per le opere di preventivo inferiore a 516.457,00 € (#), oppure, per le opere di preventivo superiore a tale importo e per tutte le opere eseguite direttamente dalla Provincia Autonoma di Bolzano, una relazione tecnico – economica per la Commissione Tecnica della Provincia Autonoma di Bolzano. Quest'ultima approva mensilmente i progetti esaminati esprimendo un parere tecnico – economico e verificando l'ammissibilità degli stessi rispetto ai criteri di ammissibilità previsti nel PSR ed il rispetto di tutti gli adempimenti regolamentari in materia di protezione dell'ambiente. I progetti sono valutati dall'organismo competente ai sensi della Legge Provinciale 19 novembre 1993, n. 23, verificandone la corrispondenza con gli obiettivi del PSR, la coerenza delle opere previste rispetto ai criteri di ammissibilità stabiliti nelle schede descrittive di ciascuna misura del PSR dando priorità alle operazioni che promuovano le pari opportunità, l'inserimento occupazionale dei giovani o la riduzione dell'impatto ambientale.
Regola di warning	Sulla base delle considerazioni fin qui riassunte, i progetti presentati e ritenuti ammissibili vengono finanziati fino al raggiungimento della spesa ammissibile totale prevista dal piano finanziario della misura per l'intero periodo di programmazione. Qualora si abbiano ulteriori richieste, temporaneamente prive di finanziamento, queste verranno finanziate o nell'ambito del PSR in vigore qualora venga garantita la disponibilità di fondi aggiuntivi derivanti da rimodulazioni finanziarie stabilite dalla Commissione Europea, oppure verranno finanziate ai sensi di un nuovo programma. Per ottimizzare le risorse sarà possibile procedere anche al finanziamento di stralci di progetto, purché i lavori previsti vengano realizzati integralmente ed possiedano il necessario requisito della piena funzionalità. In tal caso sarà possibile procedere anche ad un arrotondamento della spesa ammissibile, da determinarsi in funzione dei fondi disponibili e con il fine del rispetto dei massimali previsti per la misura.

(#) l'importo di preventivo è stato aumentato a 1.500.000 € con la Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14 (Pubblicata nel Supplemento n. 1 al B.U. 20 dicembre 2011, n. 51).

2.2. Analisi degli esiti sulla base degli indicatori di monitoraggio, compresa un'analisi qualitativa dei progressi compiuti in rapporto agli obiettivi prefissati:

2.2.1. Andamento generale del PSR – analisi dell'attuazione per asse sulla base degli obiettivi quantificati di risultato (R):

Asse 1:

Nella tabella seguente sono sintetizzati i valori degli indicatori di risultato relativi alle misure dell'asse 1 (in grigio le misure per le quali lo specifico indicatore R non è previsto):

Tabella 1: indicatori di risultato - misure dell'asse 1 (dato cumulato 2007-2013):

Asse 1	MISURE										TOTALE	PREVISIONI	% DI REALIZZAZIONE (DATO CUMULATO)
	111	112	115	121	122	123	124	125	132	133			
(R1) Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione in materia agricola e/o forestale	2.447										2.447	3.290	74,4%
(R2) Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie ('000 EUR)		1.851,4	26,5	1.230,5	624,3	5.319,3	129,4	685,3			9.866,6	12.306	80,2%
(R3) Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche				5	4	15	3				27	34	79,4%
(R4) Valore della produzione agricola soggetta a marchi/norme di qualità riconosciuti ('000 EUR)									0	10.260	10.260	28.020	36,6%

Tre dei quattro indicatori di risultato relativi alle misure dell'asse 1 evidenziano un tasso di raggiungimento degli obiettivi prefissati compresi tra il 74% e l'80%: il dato può essere considerato soddisfacente.

R1 (Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione in materia agricola e/o forestale): il numero complessivo di partecipanti ai corsi di formazione offerti dalla misura 111 ha raggiunto il valore di 2.447, pari al 74,4% delle previsioni.

R2 (Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie ('000 EUR): si stima un aumento di 9.866.600 €, corrispondente all'80,2% dell'obiettivo quantificato per questo indicatore di risultato. Per il settore agricolo, l'incremento del valore aggiunto stimato è di 3.681.299 €, pari al 37,3% dell'incremento totale raggiunto. Per il settore della silvicoltura si evidenzia un incremento di 1.089.341 €, pari all'11,0%. Per il settore agroindustriale, l'indicatore mostra un aumento stimato del valore aggiunto pari a 5.095.940 € (51,7%) dell'incremento totale. Il dato medio per domanda è il seguente: misura 112 (insediamento giovani), 4.050 €, misura 121 (investimenti aziendali) 15.770 €, misura 123 (accrescimento del valore aggiunto

dei prodotti agricoli e forestali), rispettivamente 196.000 € per il settore agroindustriale e 2.978 € per quello forestale. I dati per il settore agroalimentare si riferiscono a società cooperative attive nel settore della commercializzazione di mele per il mercato fresco, a cantine sociali ed a strutture per la trasformazione della frutta, per le quali ovviamente gli ingenti investimenti sostenuti devono avere un adeguato riscontro in termini d'aumento del fatturato. Ben diversa è la realtà del settore forestale, in cui le minime dimensioni aziendali limitano fortemente sia gli investimenti medi che i redditi derivanti dall'attività forestale.

R3 (Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche): è possibile stimare in 27 le aziende che hanno introdotto nuove tecniche grazie agli aiuti del PSR; si tratta del 79,4% delle previsioni. In gran parte le aziende sono state sostenute con i fondi della misura 123 (15), mentre le misure 121, 122 e 124 hanno numeri minori.

R4 (Valore della produzione agricola soggetta a marchi/norme di qualità riconosciuti ('000 EUR): dal momento che non sono state presentate domande di aiuto per la misura 132, non se ne possono evidenziare concreti risultati. Come già evidenziato nei precedenti rapporti annuali, la mancata attivazione dipende dal fatto che il sostegno alla partecipazione degli agricoltori provinciali a sistemi di qualità è già finanziato dall'Amministrazione provinciale con fondi propri e non con i fondi del PSR. Nel corso del 2012 la misura è stata oggetto di una rimodulazione finanziaria che ha comportato il trasferimento di gran parte delle risorse previste ad altri settori.

Per la misura 133 sono stati liquidati tre stati d'avanzamento lavori relativi ad una singola domanda presentata da un'associazione di produttori operante nel sistema di qualità "Formaggio Stelvio". Viene stimato in 10.260.000 €, pari al 36,6% delle previsioni, il valore della produzione agricola soggetta a marchi/norme di qualità riconosciuti. Anche per questa misura il budget, già ridotto nel corso della modifica del PSR del febbraio 2010 in funzione delle novità emerse per quanto riguarda la demarcazione con i PO dell'OCM ortofrutta e la decisione di sostenere l'attività promozionale delle mele al di fuori del PSR, è stato riquantificato in occasione della modifica finanziaria sopra menzionata.

Asse 2:

Nella tabella seguente sono sintetizzati i valori degli indicatori di risultato relativi alle misure dell'asse 2 (in grigio le misure per le quali lo specifico indicatore R non è previsto):

Tabella 2: indicatori di risultato - misure dell'asse 2 (dato cumulato 2007-2013 e media per anno):

Asse 2	MISURE				TOTALE 2007- 2013	TOTALE MEDIA PER ANNO	PREVISIONI (valori per anno)	% DI REALIZZAZIONE	Note
(R6) Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo:	211	214	226	227					
- Biodiversità	11.438	31.595		100	43.133	6.162	6.543	94,17%	
- Qualità dell'acqua		375.233			375.233	53.605	60.000	89,34%	
- Cambiamento climatico	115.488 (*)	193.821	133		309.442	51.574	53.857	95,76%	(*) misura 211: calcolata per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
- Qualità del suolo	228.759	410.389	26		639.174	91.311	90.071	101,37%	
- Riduzione marginalizzazione	332.545				332.545	47.506	40.000	118,76%	

Complessivamente il grado di raggiungimento degli obiettivi ambientali del PSR per l'asse 2 è in linea con le previsioni: l'estensione delle superfici della Provincia Autonoma di Bolzano interessate dalle misure a premio è da ritenere soddisfacente ed in grado di contribuire in maniera importante agli obiettivi ambientali della programmazione.

R6 (Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo): le superfici riportate nella tabella 2 sono valori incrementali riferiti agli anni 2007-2013; in considerazione del fatto che le previsioni sono state quantificate come dato medio annuo, il tasso di realizzazione può essere ottenuto dal confronto della previsione con il dato medio annuo.

- La superficie media annua sotto contratto per la quale è possibile stimare un effetto positivo sulla biodiversità è pari a 6.162 ettari, pari al 94,17% circa delle previsioni (6.543 ha). Prevalle la misura 214, seguita dalla 211, mentre più ridotta è l'azione della 227.
- Con riferimento all'indicatore relativo alla qualità dell'acqua, la superficie media annua sotto contratto riferita alla misura 214 è pari a 53.605 ettari, pari all'89,34% della superficie prevista.
- Cambiamenti climatici: va precisato che il dato medio annuo per la misura 211 è stato calcolato a partire dal 2009, ovvero per il periodo successivo all'introduzione dell'indennità compensativa tra le misure con un impatto su questo indicatore R6. Le tre misure 214, 211 e 226 hanno una superficie a premio media annua complessiva per la quale si stima un effetto positivo sui cambiamenti climatici pari a 51.574 ettari, dato che è pari al 95,76% delle previsioni.
- Per quanto riguarda gli effetti sulla qualità del suolo, il dato medio annuo è pari a 91.311 ettari e pertanto in linea con la superficie prevista.
- Riduzione della marginalizzazione: la superficie media annua riferita alla misura 211 con un risultato favorevole contro la marginalizzazione delle zone rurali è pari a 47.506 ettari pari ad un grado di realizzazione del 118,76%; la previsione di 40.000 ettari risulta quindi

sottostimata. Le superfici che possono essere ricondotte all'indennità compensativa sono molto vaste e evidenziano l'importanza della misura 211 per l'agricoltura di montagna della Provincia Autonoma di Bolzano.

Asse 3:

Nella tabella seguente sono sintetizzati i valori degli indicatori di risultato relativi alle misure dell'asse 3 (in grigio le misure per le quali lo specifico indicatore R non è previsto):

Tabella 3: indicatori di risultato - misure dell'asse 3 (dato cumulato 2007-2013):

Asse 3	MISURE					TOTALE	PREVISIONI	% DI REALIZZAZIONE (DATO CUMULATO)
	311	313	321	322	323			
(R7) Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie ('000 EUR)	2.056	469				2.525	3.350	75,4%
(R8) Numero lordo di posti di lavoro creati	13	20				33	40	82,5%
(R9) Numero di turisti in più		1.980				1.980	2.100	94,3%
(R10) Popolazione rurale utente di servizi migliorati			2.764	1.914	68	4.746	7.050	67,3%

Mediante l'attuazione delle misure ha permesso di stimare in un 80% circa il grado di raggiungimento delle previsioni di programma. Dai valori degli indicatori di risultato relativi all'asse 3 emerge il notevole e continuo miglioramento dell'attuazione delle relative misure rispetto agli anni precedenti, quando la crisi economica pareva aver rallentato maggiormente gli appalti pubblici rispetto ai lavori di operatori privati, andando ad agire soprattutto sulla capacità di autofinanziamento dei Comuni rurali a cui spetta l'onere della realizzazione di queste opere. A ciò si aggiungono gli usuali ostacoli strutturali della montagna che agiscono come un freno tradizionalmente all'attuazione di infrastrutture, come per esempio i complessi aspetti amministrativi e procedurali, la localizzazione in zona di montagna dei lavori previsti, la ridotta durata della stagione estiva in cui poter realizzare i lavori previsti.

Molto importante è l'elevato numero di domande pervenute e ammesse a contributo per le misure dell'asse 3: ciò consentirà di rispettare le previsioni del programma nei prossimi anni, recuperando il ritardo accumulato nei pagamenti utilizzando il periodo di tempo previsto dal Regolamento fino al 31 dicembre 2015.

R7 (Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie ('000 EUR)): è possibile stimare in circa 2.525.000 € il dato raggiunto, il che porta al 75% circa il tasso di raggiungimento degli obiettivi programmati. Il dato medio per domanda e per i 7 anni di durata del programma è stimabile in 12.300 € per la misura 311, mentre per la 313 il dato è stimato in circa 11.100 €.

R8 (Numero lordo di posti di lavoro creati): i posti di lavoro creati vengono stimati in 33, pari all'82,5% delle previsioni. È molto difficile quantificare i nuovi posti di lavoro; più verosimilmente, considerando le caratteristiche medie delle aziende di montagna provinciali, la misura 311 permette soprattutto il mantenimento dei posti di lavoro esistenti. I titolari ed il

nucleo familiare svolgono, accanto alle tradizionali attività agricole, anche l'attività agrituristica, favorendo in tal modo soprattutto la componente femminile della famiglia contadina. Analogamente, con la misura 313 viene favorita soprattutto la manodopera locale che può trovare occupazione durante la realizzazione delle opere in economia diretta da parte del Servizio Forestale provinciale.

R9 (Numero di turisti in più): il dato stimato può essere quantificato in 1.980 turisti, pari ad un 94,3% delle previsioni.

R10 (Popolazione rurale utente di servizi migliorati): il valore raggiunto è quantificato in circa 4.746 persone, per un valore per progetto di circa 40 persone (in media 10-12 abitazioni rurali per frazione) che possono beneficiare dei servizi creati con le infrastrutture finanziate. Si tratta del 67,3% del valore previsto in fase di programmazione. Si ricorda che la misura 322 è attuata esclusivamente con l'approccio LEADER e partecipa per il 40%.

Asse 4:

Nella tabella seguente sono sintetizzati i valori degli indicatori di risultato relativi alle misure dell'asse 4:

Tabella 4: indicatori di risultato - misure dell'asse 4 (dato cumulato 2007-2013):

Asse 4	MISURE	TOTALE	PREVISIONI	% DI REALIZZAZIONE (DATO CUMULATO)
	431			
(R12) Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione (acquisizione di competenze e animazione)	11	11	10	110%

Per l'asse Leader la quantificazione degli obiettivi di risultato appare soddisfacente e va ritenuta in linea con le previsioni di programma. L'asse 4 riscuote un ottimo interesse presso la popolazione rurale ed anche i responsabili dei gruppi Leader denotano professionalità ed adeguate competenze circa l'animazione del proprio territorio rurale.

R12 (Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione (acquisizione di competenze e animazione)): con la fine del 2013 sono 11 le persone che hanno completato una formazione finalizzata all'acquisizione di competenze ed all'animazione. Il dato è pari al 110% delle previsioni.

2.2.2. Andamento del PSR – stato di esecuzione delle misure:

Nelle successive quattro tabelle vengono sintetizzate le spese sostenute effettivamente negli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 per asse e per misura, distinguendo tra spese transitorie (i cosiddetti “trascinamenti”) e spese per domande ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005. Il commento dei dati è contenuto nelle successive schede descrittive dell’attuazione delle singole misure e nel capitolo 3 sull’esecuzione finanziaria.

2.2.2.1. Spesa per misura effettivamente sostenuta a livello nazionale (Amministrazione provinciale) – risorse complessive (risorse ordinarie e risorse Health Check):

La tabella 5 sintetizza la spesa pubblica degli anni solari 2007-2013 per ciascuna misura del Programma:

Tabella 5: Dettaglio per misura delle spese effettivamente sostenute negli anni 2007 - 2013 per anno solare:

Misura/Asse	Spesa pubblica prevista	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2007	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2008	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2009	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2010	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2011	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2012	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2013	Tasso di realizzazione finanziaria del PSR (spesa pubblica 2007+2013 sul previsto)	Versamenti cumulativi (Spesa pubblica) – 2007+2013
Asse 1 (fondi ordinari e fondi Health Check)										
Misura 111	1.398.444,00	300,00	-	160.322,30	94.568,80	131.756,29	58.474,41	222.630,98	47,77%	668.052,78
di cui spese per nuove domande		-	-	160.322,30	94.568,80	131.756,29	58.474,41	222.630,98		667.752,78
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		300,00	-	-	-	-	-	-		300,00
Misura 112	9.887.500,00	20.000,00	2.512.500,00	3.147.500,00	2.965.000,00	1.262.500,00	- 10.578,37	- 14.448,04	99,95%	9.882.473,59
di cui spese per nuove domande		-	2.512.500,00	3.147.500,00	2.965.000,00	1.262.500,00	- 10.578,37	- 14.448,04		9.862.473,59
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		20.000,00	-	-	-	-	-	-		20.000,00
Misura 115	400.065,00	-	-	86.650,00	113.350,00	-	-	-	49,99%	200.000,00
di cui spese per nuove domande		-	-	86.650,00	113.350,00	-	-	-		200.000,00
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-	-	-		-
Misura 121 (fondi ordinari e fondi Health Check)	14.729.918,00	-	-	1.857.088,41	1.685.757,68	6.290.473,06	2.909.392,56	597.867,86	90,57%	13.340.579,57
di cui spese per nuove domande		-	-	1.857.088,41	1.685.757,68	6.290.473,06	2.909.392,56	597.867,86		13.340.579,57
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-	-	-		-
Misura 122	4.095.445,00	96.469,45	6.612,23	1.933.784,16	1.070.623,61	146.706,60	751.535,52	36.540,46	98,70%	4.042.272,03
di cui spese per nuove domande		-	-	1.933.784,16	1.070.623,61	146.706,60	751.535,52	36.540,46		3.939.190,35
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		96.469,45	6.612,23	-	-	-	-	-		103.081,68
Misura 123	35.104.606,00	1.523.893,68	951.600,00	3.257.974,34	13.685.775,72	1.305.545,23	4.469.428,81	3.800.849,20	82,6%	28.995.066,98
di cui spese per nuove domande		-	951.600,00	3.257.974,34	13.685.775,72	1.305.545,23	4.469.428,81	3.800.849,20		27.471.173,30
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		1.523.893,68	-	-	-	-	-	-		1.523.893,68

Misura 124	559.377,00	-	-	-	-	-	-	544.177,64	97,28%	544.177,64-
di cui spese per nuove domande		-	-	-	-	-	-	544.177,64		544.177,64
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-	-	-		-
Misura 125	12.124.487,00	2.579.185,72	-	-	827.398,96	2.757.217,74	519.190,13	512.041,49	59,34%	7.195.034,04
di cui spese per nuove domande		-	-	-	827.398,96	2.757.217,74	519.190,13	512.041,49		4.615.848,32
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		2.579.185,72	-	-	-	-	-	-		2.579.185,72
Misura 132	19.978,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
di cui spese per nuove domande		-	-	-	-	-	-	-		-
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-	-	-		-
Misura 133	749.167,00	-	-	-	73.142,00	102.578,00	94.475,00	-	36,07%	270.195,00
di cui spese per nuove domande		-	-	-	73.142,00	102.578,00	94.475,00	-		270.195,00
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-	-	-		-
Totale asse 1	79.068.987,00	4.219.848,85	3.470.712,23	10.443.319,21	20.515.616,77	11.996.776,92	8.791.918,06	5.699.659,59	82,38%	65.137.851,63
di cui spese per nuove domande		-	3.464.100,00	10.443.319,21	20.515.616,77	11.996.776,92	8.791.918,06	5.699.659,59		60.911.390,55
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		4.219.848,85	6.612,23	-	-	-	-	-		4.226.461,08
Asse 2 (fondi ordinari e fondi Health Check)										
Misura 211	62.351.211,00	10.803.639,82	13.124.813,84	28.010.657,32	8.745.320,47	1.621.304,25	49.694,89	- 10.261,23	99,99%	62.345.169,36
di cui spese per nuove domande		-	13.094.388,34	28.010.657,32	8.745.320,47	1.621.304,25	49.694,89	- 10.261,23		51.511.104,04
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		10.803.639,82	30.425,50	-	-	-	-	-		10.834.065,32
Misura 214 (fondi ordinari e fondi Health Check)	142.344.897,00	18.046.321,80	14.027.997,41	27.657.918,99	18.867.783,45	19.247.783,65	17.526.101,11	18.529.834,95	94,07%	133.903.741,36
di cui spese per nuove domande		-	13.827.364,01	27.657.918,99	18.867.783,45	19.247.783,65	17.526.101,11	18.529.834,95		115.656.786,16
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		18.046.321,80	200.633,40	-	-	-	-	-		18.246.955,20
Misura 226	2.591.974,00	1.313.442,15	-	-	481.568,70	756.498,60	33.843,14	-	99,74%	2.585.352,59
di cui spese per nuove domande		-	-	-	481.568,70	756.498,60	33.843,14	-		1.271.910,44
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		1.313.442,15	-	-	-	-	-	-		1.313.442,15
Misura 227	370.985,00	14.567,00	-	-	90.973,08	17.550,58	50.851,76	34.181,40	56,10%	208.123,82
di cui spese per nuove domande		-	-	-	90.973,08	17.550,58	50.851,76	34.181,40		193.556,82
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		14.567,00	-	-	-	-	-	-		14.567,00
Totale asse 2	207.659.067,00	30.177.970,77	27.152.811,25	55.668.576,31	28.185.645,70	21.643.137,08	17.660.490,90	18.553.755,12	95,85%	199.042.387,13
di cui spese per nuove domande		-	26.921.752,35	55.668.576,31	28.185.645,70	21.643.137,08	17.660.490,90	18.553.755,12		168.633.357,46
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		30.177.970,77	231.058,90	-	-	-	-	-		30.409.029,67
Asse 3 (fondi ordinari e fondi Health Check)										
Misura 311	6.785.200,00	-	-	1.425.695,00	1.062.225,00	1.759.339,92	909.811,68	685.785,00	86,11%	5.842.856,60
di cui spese per nuove domande		-	-	1.425.695,00	1.062.225,00	1.759.339,92	909.811,68	685.785,00		5.842.856,60
di cui spese transitorie Reg. (CE)		-	-	-	-	-	-	-		-

n. 1320/2006										
Misura 313	2.550.000,00	-	-	-	70.362,92	259.501,51	431.232,75	568.809,48	52,15%	1.329.906,66
di cui spese per nuove domande		-	-	-	70.362,92	259.501,51	431.232,75	568.809,48		1.329.906,66
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-	-	-		-
Misura 321	17.137.220,00	117.600,00	-	1.449.233,38	3.374.186,87	3.048.750,00	3.935.690,00	1.727.712,93	79,67%	13.653.173,18
di cui spese per nuove domande		-	-	1.449.233,38	3.374.186,87	3.048.750,00	3.935.690,00	1.727.712,93		13.535.573,18
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		117.600,00	-	-	-	-	-	-		117.600,00
Misura 323	1.275.909,00	-	-	-	262.785,25	216.247,09	212.732,53	250.403,07	73,84%	942.167,94
di cui spese per nuove domande		-	-	-	262.785,25	216.247,09	212.732,53	250.403,07		942.167,94
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-	-	-		-
Totale asse 3	27.748.329,00	117.600,00	-	2.874.928,38	4.769.560,04	5.283.838,52	5.489.466,96	3.232.710,48	78,45%	21.768.104,38
di cui spese per nuove domande		-	-	2.874.928,38	4.769.560,04	5.283.838,52	5.489.466,96	3.232.710,48		21.650.504,38
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		117.600,00	-	-	-	-	-	-		117.600,00
Asse 4 (fondi ordinari e fondi Health Check)										
411 Competitività	585.236,00	-	-	-	-	84.886,58	28.467,44	167.128,84	47,93%	280.482,86
di cui spese per nuove domande		-	-	-	-	84.886,58	28.467,44	167.128,84		280.482,86
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-	-	-		-
413 Qualità della vita/ diversificazione	12.781.464,00	-	-	-	212.560,00	1.368.407,13	1.892.109,15	2.337.032,69	45,46%	5.810.108,97
di cui spese per nuove domande		-	-	-	212.560,00	1.368.407,13	1.892.109,15	2.337.032,69		5.810.108,97
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-	-	-		-
421 Cooperazione interterritoriale e transnazionale	348.991,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
di cui spese per nuove domande		-	-	-	-	-	-	-		-
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-	-	-		-
431 Gestione gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione	1.999.952,00	-	-	147.000,00	248.690,00	339.960,00	196.500,00	338.597,68	63,54%	1.270.747,68
di cui spese per nuove domande		-	-	147.000,00	248.690,00	339.960,00	196.500,00	338.597,68		1.270.747,68
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-	-	-		-
Totale asse 4	15.715.643,00	-	-	147.000,00	461.250,00	1.793.253,71	2.117.076,59	2.842.759,21	46,84%	7.361.339,51
di cui spese per nuove domande		-	-	147.000,00	461.250,00	1.793.253,71	2.117.076,59	2.842.759,21		7.361.339,51
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-	-	-		-
TOTALE COMPLESSIVO (fondi ordinari e fondi Health Check)	330.192.026,00	34.515.419,62	30.623.523,48	69.133.823,90	53.932.072,51	40.717.006,23	34.058.952,51	30.328.884,40	88,83%	293.309.682,65
di cui spese per nuove domande		-	30.385.852,35	69.133.823,90	53.932.072,51	40.717.006,23	34.058.952,51	30.328.884,40		258.556.591,90

di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		34.515.419,62	237.671,13	-	-	-	-	-	34.753.090,75

2.2.2.2. Spesa per misura effettivamente sostenuta a livello nazionale (Amministrazione provinciale) – solo risorse ordinarie:

La tabella 6 descrive la spesa pubblica degli anni solari 2007-2013 per ciascuna misura del Programma:

Tabella 6: Dettaglio per misura delle spese *effettivamente sostenute* negli anni 2007 – 2013 *per anno solare*:

Misura/Asse	Spesa pubblica prevista	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2007	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2008	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2009	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2010	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2011	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2012	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2013	Tasso di realizzazione finanziaria del PSR (spesa pubblica 2007+2013 sul previsto)	Versamenti cumulativi (Spesa pubblica) – 2007+2013
Asse 1 (fondi ordinari)										
Misura 111	1.398.444,00	300,00	-	160.322,30	94.568,80	131.756,29	58.474,41	222.630,98	47,77%	668.052,78
di cui spese per nuove domande		-	-	160.322,30	94.568,80	131.756,29	58.474,41	222.630,98		667.752,78
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		300,00	-	-	-	-	-	-		300,00
Misura 112	9.887.500,00	20.000,00	2.512.500,00	3.147.500,00	2.965.000,00	1.262.500,00	- 10.578,37	- 14.448,04	99,95%	9.882.473,59
di cui spese per nuove domande		-	2.512.500,00	3.147.500,00	2.965.000,00	1.262.500,00	- 10.578,37	- 14.448,04		9.862.473,59
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		20.000,00	-	-	-	-	-	-		20.000,00
Misura 115	400.065,00	-	-	86.650,00	113.350,00	-	-	-	49,99%	200.000,00
di cui spese per nuove domande		-	-	86.650,00	113.350,00	-	-	-		200.000,00
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-	-	-		-
Misura 121 (fondi ordinari e fondi Health Check)	10.563.251,00	-	-	1.857.088,41	1.685.757,68	3.886.887,41	2.029.285,80	313.467,86	92,51%	9.772.487,16
di cui spese per nuove domande		-	-	1.857.088,41	1.685.757,68	3.886.887,41	2.029.285,80	313.467,86		9.772.487,16
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-	-	-		-
Misura 122	4.095.445,00	96.469,45	6.612,23	1.933.784,16	1.070.623,61	146.706,60	751.535,52	36.540,46	98,70%	4.042.272,03
di cui spese per nuove domande		-	-	1.933.784,16	1.070.623,61	146.706,60	751.535,52	36.540,46		3.939.190,35
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		96.469,45	6.612,23	-	-	-	-	-		103.081,68
Misura 123	35.104.606,00	1.523.893,68	951.600,00	3.257.974,34	13.685.775,72	1.305.545,23	4.469.428,81	3.800.849,20	82,6%	28.995.066,98
di cui spese per nuove domande		-	951.600,00	3.257.974,34	13.685.775,72	1.305.545,23	4.469.428,81	3.800.849,20		27.471.173,30
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		1.523.893,68	-	-	-	-	-	-		1.523.893,68
Misura 124	559.377,00	-	-	-	-	-	-	544.177,64	97,28%	544.177,64
di cui spese per nuove domande		-	-	-	-	-	-	544.177,64		544.177,64
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-	-	-		-

storie Reg. (CE) n. 1320/2006										
Misura 125	12.124.487,00	2.579.185,72	-	-	827.398,96	2.757.217,74	519.190,13	512.041,49	59,34%	7.195.034,04
di cui spese per nuove domande		-	-	-	827.398,96	2.757.217,74	519.190,13	512.041,49		4.615.848,32
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		2.579.185,72	-	-	-	-	-			2.579.185,72
Misura 132	19.978,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
di cui spese per nuove domande		-	-	-	-	-	-	-		-
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-	-	-		-
Misura 133	749.167,00	-	-	-	73.142,00	102.578,00	94.475,00	-	36,07%	270.195,00
di cui spese per nuove domande		-	-	-	73.142,00	102.578,00	94.475,00	-		270.195,00
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-	-	-		-
Totale asse 1	74.722.519,00	4.219.848,85	3.470.712,23	10.443.319,21	20.515.616,77	9.593.191,27	7.911.811,30	5.415.259,59	82,20%	61.569.759,22
di cui spese per nuove domande		-	3.464.100,00	10.443.319,21	20.515.616,77	9.593.191,27	7.911.811,30	5.415.259,59		57.343.298,14
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		4.219.848,85	6.612,23	-	-	-	-	-		4.226.461,08
Asse 2 (fondi ordinari)										
Misura 211	62.351.211,00	10.803.639,82	13.124.813,84	28.010.657,32	8.745.320,47	1.621.304,25	49.694,89	- 10.261,23	99,99%	62.345.169,36
di cui spese per nuove domande		-	13.094.388,34	28.010.657,32	8.745.320,47	1.621.304,25	49.694,89	- 10.261,23		51.511.104,04
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		10.803.639,82	30.425,50	-	-	-	-	-		10.834.065,32
Misura 214 (fondi ordinari e fondi Health Check)	128.488.230,00	18.046.321,80	14.027.997,41	27.657.918,99	16.423.707,55	15.809.333,44	14.156.790,42	15.012.995,04	94,28%	121.135.064,65
di cui spese per nuove domande		-	13.827.364,01	27.657.918,99	16.423.707,55	15.809.333,44	14.156.790,42	15.012.995,04		102.888.109,45
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		18.046.321,80	200.633,40	-	-	-	-	-		18.246.955,20
Misura 226	2.591.974,00	1.313.442,15	-	-	481.568,70	756.498,60	33.843,14	-	99,74%	2.585.352,59
di cui spese per nuove domande		-	-	-	481.568,70	756.498,60	33.843,14	-		1.271.910,44
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		1.313.442,15	-	-	-	-	-	-		1.313.442,15
Misura 227	370.985,00	14.567,00	-	-	90.973,08	17.550,58	50.851,76	34.181,40	56,10%	208.123,82
di cui spese per nuove domande		-	-	-	90.973,08	17.550,58	50.851,76	34.181,40		193.556,82
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		14.567,00	-	-	-	-	-	-		14.567,00
Totale asse 2	128.488.230,00	18.046.321,80	14.027.997,41	27.657.918,99	16.423.707,55	15.809.333,44	14.156.790,42	15.036.915,21	96,12%	186.273.710,42
di cui spese per nuove domande		-	13.827.364,01	27.657.918,99	16.423.707,55	15.809.333,44	14.156.790,42	15.036.915,21		155.864.680,75
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		18.046.321,80	200.633,40	-	-	-	-	-		30.409.029,67
Asse 3 (fondi ordinari)										
Misura 311	6.785.200,00	-	-	1.425.695,00	1.062.225,00	1.759.339,92	909.811,68	685.785,00	86,11%	5.842.856,60
di cui spese per nuove domande		-	-	1.425.695,00	1.062.225,00	1.759.339,92	909.811,68	685.785,00		5.842.856,60
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-	-	-		-
Misura 313	2.550.000,00	-	-	-	70.362,92	259.501,51	431.232,75	568.809,48	52,15%	1.329.906,66
di cui spese per nuove domande		-	-	-	70.362,92	259.501,51	431.232,75	568.809,48		1.329.906,66

di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-	-	-		-
Misura 321	17.137.220,00	117.600,00	-	1.449.233,38	3.374.186,87	3.048.750,00	3.935.690,00	1.727.712,93	79,67%	13.653.173,18
di cui spese per nuove domande		-	-	1.449.233,38	3.374.186,87	3.048.750,00	3.935.690,00	1.727.712,93		13.535.573,18
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		117.600,00	-	-	-	-	-	-		117.600,00
Misura 323	1.275.909,00	-	-	-	262.785,25	216.247,09	212.732,53	250.403,07	73,84%	942.167,94
di cui spese per nuove domande		-	-	-	262.785,25	216.247,09	212.732,53	250.403,07		942.167,94
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-	-	-		-
Totale asse 3	27.748.329,00	117.600,00	-	2.874.928,38	4.769.560,04	5.283.838,52	5.489.466,96	3.232.710,48	78,45%	21.768.104,38
di cui spese per nuove domande		-	-	2.874.928,38	4.769.560,04	5.283.838,52	5.489.466,96	3.232.710,48		21.650.504,38
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		117.600,00	-	-	-	-	-	-		117.600,00
Asse 4 (fondi ordinari)										
411 Competitività	585.236,00	-	-	-	-	84.886,58	28.467,44	167.128,84	47,93%	280.482,86
di cui spese per nuove domande		-	-	-	-	84.886,58	28.467,44	167.128,84		280.482,86
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-	-	-		-
413 Qualità della vita/ diversificazione	12.781.464,00	-	-	-	212.560,00	1.368.407,13	1.892.109,15	2.337.032,69	45,46%	5.810.108,97
di cui spese per nuove domande		-	-	-	212.560,00	1.368.407,13	1.892.109,15	2.337.032,69		5.810.108,97
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-	-	-		-
421 Cooperazione interterritoriale e transnazionale	348.991,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
di cui spese per nuove domande		-	-	-	-	-	-	-		-
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-	-	-		-
431 Gestione gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione	1.999.952,00	-	-	147.000,00	248.690,00	339.960,00	196.500,00	338.597,68	63,54%	1.270.747,68
di cui spese per nuove domande		-	-	147.000,00	248.690,00	339.960,00	196.500,00	338.597,68		1.270.747,68
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-	-	-		-
Totale asse 4	15.715.643,00	-	-	147.000,00	461.250,00	1.793.253,71	2.117.076,59	2.842.759,21	46,84%	7.361.339,51
di cui spese per nuove domande		-	-	147.000,00	461.250,00	1.793.253,71	2.117.076,59	2.842.759,21		7.361.339,51
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-	-	-		-
TOTALE COMPLESSIVO (fondi ordinari e fondi Health Check)	312.168.890,00	34.515.419,62	30.623.523,48	69.133.823,90	51.487.996,61	34.874.970,37	29.809.535,06	26.527.644,49	88,73%	276.972.913,53
di cui spese per nuove domande		-	30.385.852,35	69.133.823,90	51.487.996,61	34.874.970,37	29.809.535,06	26.527.644,49		242.219.822,78
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		34.515.419,62	237.671,13	-	-	-	-	-		34.753.090,75

2.2.2.3. Spesa per misura effettivamente sostenuta a livello nazionale (Amministrazione provinciale)
– solo risorse Health Check:

La tabella 7 descrive la spesa pubblica dell'anno 2013 per ciascuna misura del Programma interessata dal rifinanziamento:

Tabella 7: Dettaglio per misura delle spese *effettivamente sostenute* negli anni 2007 - 2013 *per anno solare*:

Misura/Asse	Spesa pubblica prevista	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2007	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2008	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2009	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2010	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2011	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2012	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2013	Tasso di realizzazione finanziaria del PSR (spesa pubblica 2007+2013 sul previsto)	Versamenti cumulativi (Spesa pubblica) - 2007+2013
Asse 1 (fondi Health Check)										
Misura 111	-	-	-	-	-	-				-
di cui spese per nuove domande		-	-	-	-	-				-
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-				-
Misura 112	-	-	-	-	-	-				-
di cui spese per nuove domande		-	-	-	-	-				-
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-				-
Misura 115	-	-	-	-	-	-				
di cui spese per nuove domande		-	-	-	-	-				
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-				
Misura 121	4.166.667,00	-	-	-	-	2.403.585,65	880.106,76	284.400,00	85,63%	3.568.092,41
di cui spese per nuove domande		-	-	-	-	2.403.585,65	880.106,76	284.400,00		3.568.092,41
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-	-	-		-
Misura 122	-	-	-	-	-	-				
di cui spese per nuove domande		-	-	-	-	-				
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-				
Misura 123	-	-	-	-	-	-				
di cui spese per nuove domande		-	-	-	-	-				
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-				
Misura 124	-	-	-	-	-	-				
di cui spese per nuove domande		-	-	-	-	-				
di cui spese tran-		-	-	-	-	-				

itoriale Reg. (CE) n. 1320/2006										
Misura 125	-	-	-	-	-	-				
di cui spese per nuove domande		-	-	-	-	-				
di cui spese tran- sitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-				
Misura 132	-	-	-	-	-	-				
di cui spese per nuove domande		-	-	-	-	-				
di cui spese tran- sitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-				
Misura 133	-	-	-	-	-	-				
di cui spese per nuove domande		-	-	-	-	-				
di cui spese tran- sitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-				
Totale asse 1	4.166.667,00	-	-	-	-	2.403.585,65	880.106,76	284.400,00	85,63%	3.568.092,41
di cui spese per nuove domande		-	-	-	-	2.403.585,65	880.106,76	284.400,00		3.568.092,41
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-	-	-		-
Asse 2 (fondi Health Check)										
Misura 211	-	-	-	-	-	-				-
di cui spese per nuove domande		-	-	-	-	-				-
di cui spese tran- sitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-				-
Misura 214	13.856.667,00	-	-	-	2.444.075,90	3.438.450,21	3.369.310,69	3.516.839,91	92,15%	12.768.676,71
di cui spese per nuove domande		-	-	-	2.444.075,90	3.438.450,21	3.369.310,69	3.516.839,91		12.768.676,71
di cui spese tran- sitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-	-	-		-
Misura 226	-	-	-	-	-	-				-
di cui spese per nuove domande		-	-	-	-	-				-
di cui spese tran- sitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-				-
Misura 227	-	-	-	-	-	-				-
di cui spese per nuove domande		-	-	-	-	-				-
di cui spese tran- sitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-				-
Totale asse 2	13.856.667,00	-	-	-	2.444.075,90	3.438.450,21	3.369.310,69	3.516.839,91	92,15%	12.768.676,71
di cui spese per nuove domande		-	-	-	2.444.075,90	3.438.450,21	3.369.310,69	3.516.839,91		12.768.676,71
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-	-	-		-
Asse 3 (fondi Health Check)										
Misura 311	-	-	-	-	-	-				-
di cui spese per nuove domande		-	-	-	-	-				-
di cui spese tran-		-	-	-	-	-				-

ditorie Reg. (CE) n. 1320/2006										
Misura 313	-	-	-	-	-	-				-
di cui spese per nuove domande		-	-	-	-	-				-
di cui spese tran- sitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-				-
Misura 321	-	-	-	-	-	-				-
di cui spese per nuove domande		-	-	-	-	-				-
di cui spese tran- sitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-				-
Misura 323	-	-	-	-	-	-				-
di cui spese per nuove domande		-	-	-	-	-				-
di cui spese tran- sitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-				-
Totale asse 3	-	-	-	-	-	-	-			-
di cui spese per nuove domande		-	-	-	-	-	-			-
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-	-			-
Asse 4 (fondi Health Check)										
411 Competitivi- tà	-	-	-	-	-	-				-
di cui spese per nuove domande		-	-	-	-	-				-
di cui spese tran- sitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-				-
413 Qualità della vi- ta/diversificazion e	-	-	-	-	-	-				-
di cui spese per nuove domande		-	-	-	-	-				-
di cui spese tran- sitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-				-
421 Cooperazio- ne interterritoria- le e transnaziona- le	-	-	-	-	-	-				-
di cui spese per nuove domande		-	-	-	-	-				-
di cui spese tran- sitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-				-
431 Gestione gruppi di azione locale, acquisi- zione di compe- tenze, animazio- ne	-	-	-							-
di cui spese per nuove domande		-	-	-	-	-				-
di cui spese tran- sitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-				-
Totale asse 4	-	-	-	-	-	-	-			-

di cui spese per nuove domande		-	-	-	-	-	-	-	-
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COMPLESSIVO (fondi Health Check)		-	-	-	2.444.075,90	5.842.035,86	4.249.417,45	3.801.239,91	16.336.769,12
di cui spese per nuove domande	18.023.334,00	-	-	-	2.444.075,90	5.842.035,86	4.249.417,45	3.801.239,91	16.336.769,12
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-	-	-	-	-

2.2.2.4. Spesa per misura effettivamente sostenuta a livello nazionale (Amministrazione provinciale) – solo risorse Top Up:

La tabella 8 descrive la spesa pubblica Top Up dell'anno 2013 per ciascuna misura del Programma interessata dalle risorse aggiuntive esclusivamente provinciali:

Tabella 8: Risorse Top Up - Dettaglio per misura delle spese *effettivamente sostenute* negli anni 2007 - 2013 *per anno solare*:

Misura/Asse	Spesa pubblica prevista - TOP UP	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2007 - TOP UP	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2008 - TOP UP	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2009 - TOP UP	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2010 - TOP UP	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2011 - TOP UP	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2012 - TOP UP	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2013 - TOP UP	Tasso di realizzazione finanziaria del PSR (spesa pubblica Top Up 2007+2013 sul previsto)	Versamenti cumulativi (Spesa pubblica Top Up) – 2007+2013
Asse 2 - Fondi provinciali Top Up										
Misura 112	31.000.000,00	-	-	-	-	1.347.500,00	3.575.000,00	1.580.000,00	20,98%	6.502.500,00
Misura 211	74.300.000,00	-	-	-	11.120.793,32	18.894.963,18	19.742.687,32	19.079.176,33	92,65%	68.837.620,15
Misura 214 – intervento 7	10.300.000,00	522.699,00	567.388,00	557.822,00	597.480,00	636.721,40	507.210,40	679.100,80	39,50%	4.068.421,60
TOTALE	115.600.000,00	522.699,00	567.388,00	557.822,00	11.718.273,32	20.879.184,58	23.824.897,72	21.338.277,13	68,69%	79.408.541,75

Sono proseguiti nel 2013 i pagamenti con risorse provinciali Top Up per l'insediamento dei giovani agricoltori, in quanto i fondi cofinanziati (UE e Stato) assegnati alla misura 112 risultano esauriti già dal 2011. Il tasso di realizzazione sale al 20,98% del totale approvato. Per continuare a sostenere l'insediamento dei giovani agricoltori la Provincia Autonoma di Bolzano sta ricorrendo all'utilizzo di propri fondi nell'ambito del top up previsto dal PSR. Nel 2014, viste le continue riduzioni subite dal bilancio provinciale in seguito alla profonda crisi economica dalla quale lo Stato italiano fatica ad uscire, non sarà probabilmente possibile finanziare tale misura con risorse provinciali. Per poter garantire la necessaria continuità nel sostegno dei giovani agricoltori, la Provincia Autonoma di Bolzano intende applicare le norme comunitarie previste dagli articoli 1 e 3 del Reg. (UE) n. 1310/2013 nella gestione della transizione del sostegno allo Sviluppo Rurale nell'anno 2014.

Per la misura 211, indennità compensativa, è stato ripetutamente sottolineato come le risorse cofinanziate siano insufficienti a garantire l'erogazione dei premi per tutto il periodo di programmazione. Per questo motivo, anche nel 2013 tutte le domande della 211 (campagna

2013) sono state pagate utilizzando fondi provinciali Top Up per un importo di circa 19 milioni di €. Il tasso di utilizzo di queste risorse è pari al 92,65% del totale approvato. Il 22 gennaio 2014 è stata inoltrata alla Commissione Europea una proposta di modifica del PSR che prevede di aumentare i fondi provinciali top up da destinare al finanziamento della misura 211, al fine di permettere la copertura della liquidazione della campagna 2014 con fondi provinciali. L'incremento proposto per il top up della misura 211 è pari a 20 milioni di € e corrisponde al fabbisogno della campagna 2014, che in tal modo potrebbe essere coperta integralmente con fondi provinciali, se disponibili. La nuova misura dell'indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'ambito del PSR 2014-2020, avrà inizio soltanto a partire dalla campagna 2015. I fondi top up aggiuntivi potranno essere utilizzati per impegni annuali nel 2014 e dovranno essere liquidati entro e non oltre il 31 dicembre 2015. È volontà dell'Amministrazione provinciale quella di pagare l'indennità compensativa nel corso dell'anno 2014 riducendo il più possibile i ritardi dovuti alla fase di approvazione del nuovo PSR 2014-2020. L'Amministrazione provinciale si riserva in ogni modo di prevedere anche la possibilità di rendicontare i costi della campagna 2014 della misura 211 con la nuova programmazione 2014-2020.



Per quanto riguarda l'intervento 7 della misura 214, si allega, a completamento delle informazioni fornite, il dettaglio delle spese top up sostenute nei sette anni, che sommano al 39,50% della somma prevista dal PSR.

Le sopra citate spese non sono state rendicontate alla CE. È importante sottolineare che, sulla base del trend di spesa evidenziato, i massimali delle risorse provinciali Top Up autorizzate dalla CE non sono stati superati: a tutto il 2013 la spesa Top Up ha raggiunto infatti il 68,69% delle somme autorizzate.

Tabella G4 - ripartizione geografica del sostegno:

La ripartizione geografica del sostegno per alcune misure del PSR è sintetizzata nella tabella successiva:

Misura	2007-2013 Nuove misure	Zona normale	%	Zona svantaggiata di montagna	%	Totale
112	numero domande	62	14%	395	86%	457
	spesa pubblica (000 €)	1.228	12%	8.654	88%	9.882
121	numero domande	0	0%	78	100%	78
	spesa pubblica (000 €)	0,00	0%	9.772	100%	9.772
122	numero domande	0	0%	1.639	100%	1.639
	spesa pubblica (000 €)	0,00	0%	4.042	100%	4.042
214	numero domande	3.778	5%	65.732	95%	69.510
	spesa pubblica (000 €)	5.785	5%	115.350	95%	121.135
totale	numero domande	3.840	5%	67.844	95%	71.684
	spesa pubblica (000 €)	7.013	5%	137.818	95%	144.831

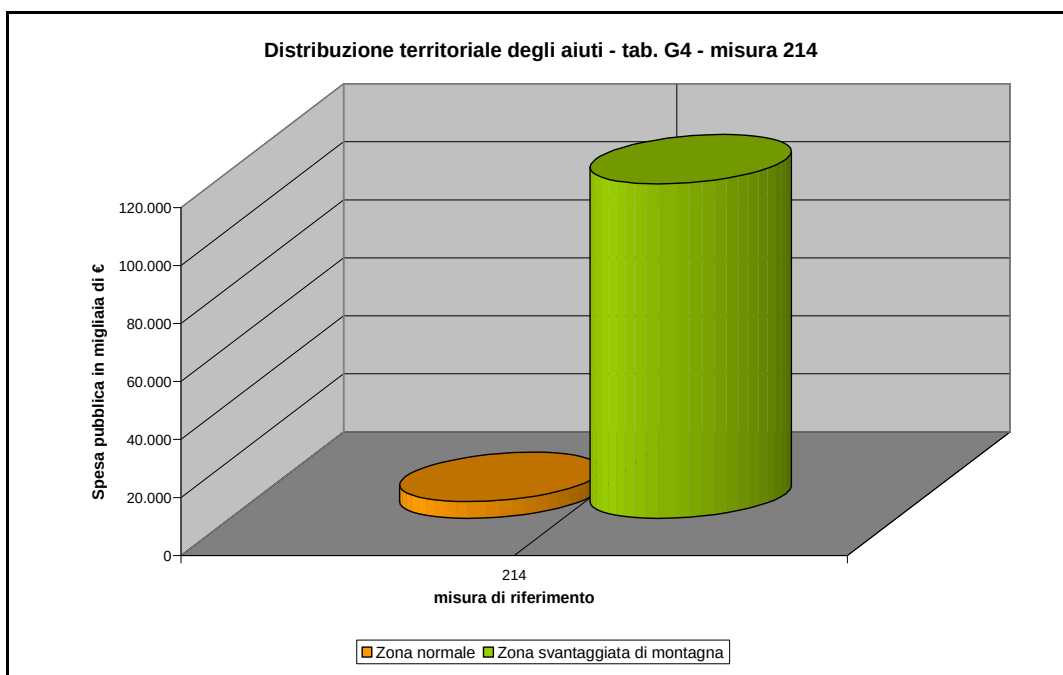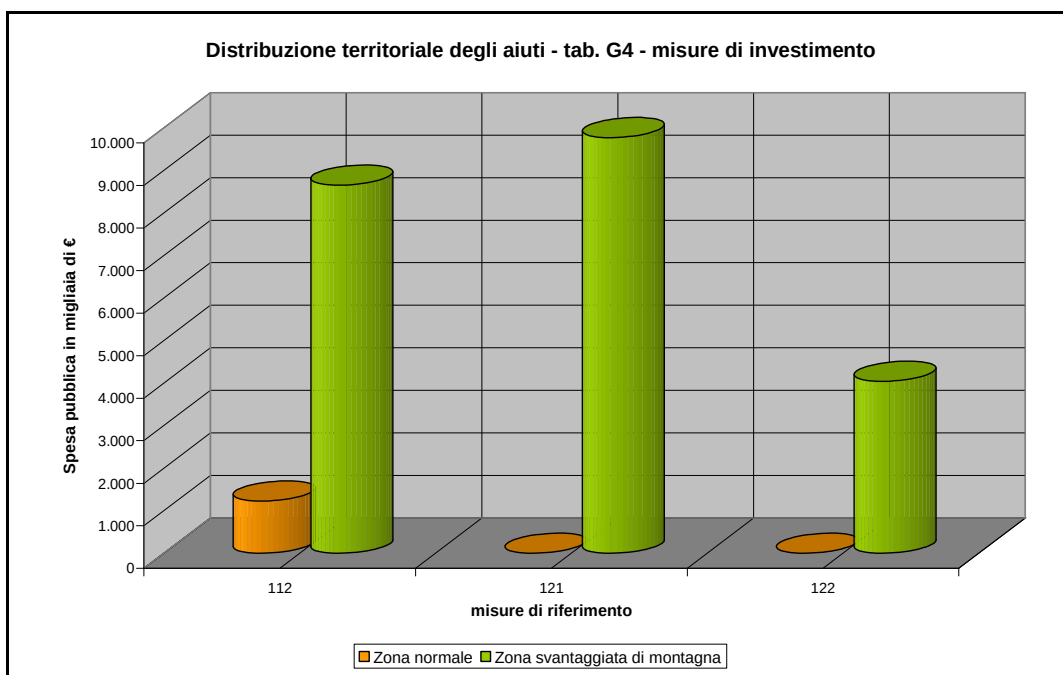

Complessivamente per il periodo 2007-2013, per tutte le spese pubbliche sostenute (trasciamenti e nuove domande), con riferimento alle misure di riferimento delle tabelle ufficiali della CE (misure 112, 121, 122 e 214), le domande liquidate in zona svantaggiata di montagna ammontano a 67.844, per una spesa pubblica pari a 137,818 Milioni di €. Si tratta del 95% della spesa dei sette anni di programmazione: il dato è superiore a quanto riportato nelle stime del PSR (91%) e permette di considerare pienamente coerenti i risultati operativi finora raggiunti rispetto alla strategia proposta nel Programma di Sviluppo Rurale. I fondi vengono in gran parte spesi a favore delle zone di montagna in considerazione delle difficoltà che tali zone subiscono rispetto a quelle di fondovalle. I dati di spesa, considerando anche la misura 211, verrebbero spostati ulteriormente a favore di tali zone: per l'Amministrazione provinciale la montagna è essenziale e la scelta di sostenerla in via preferenziale viene confermata dai dati presentati.

Misura 112: l'86% delle domande di primo insediamento si riferiscono a beneficiari situati in zona di montagna, con l'88% della spesa pubblica liquidata.

Misura 121: il 100% degli aiuti per gli investimenti aziendali ricade in zona svantaggiata di montagna, in considerazione del fatto che la misura prevede il sostegno alle aziende a vocazione zootecnica (produzione di latte).

Misura 122: anche per la misura forestale volta all'accrescimento del valore economico dei boschi la totalità delle domande e della spesa pubblica ricade in zona di montagna.

Misura 214: la situazione anche per questa misura non cambia. Il 95% della spesa per i premi agroambientali si distribuisce in zona svantaggiata di montagna. L'agroambiente, assieme alla misura 211, rappresenta il fondamento dell'intervento della pubblica amministrazione finalizzata al sostegno dell'agricoltura provinciale delle zone montane.

2.2.2.5. Schede descrittive dell'attuazione delle singole misure:

Asse 1:

Misura 111 - Articolo 20 (a) (i): Azioni di formazione professionale e d'informazione delle persone attive nei settori agricolo e forestale.

Obiettivi in sintesi:

Favorire il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali; sensibilizzare e informare gli agricoltori sui flussi materiali e sui processi aziendali che hanno attinenza con l'ambiente, la biodiversità e la gestione sostenibile delle risorse naturali; favorire il rispetto dei requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale; sostenere il miglioramento del rendimento globale delle imprese agricole e forestali, in coerenza con gli obiettivi di politica agricola e rurale, tramite un miglioramento delle competenze tecniche ed economiche, comprendente conoscenze specialistiche nelle nuove tecnologie di informazione; qualificare professionalmente gli addetti ai lavori per il miglioramento della competitività del settore forestale.

Piano finanziario in sintesi:

	costo totale (inclusi i trascinamenti)	spesa pubblica totale	QUOTA FEASR	QUOTA NAZIONALE	spesa privata
TOTALE	1.523.305	1.398.444	616.000	782.444	124.861

Piano finanziario della parte LEADER:

	costo totale	spesa pubblica totale	QUOTA FEASR	QUOTA NAZIONALE	spesa privata
TOTALE	265.244	265.244	116.710	148.534	0

Aiuti di stato supplementari (Top Up):


Non saranno utilizzati fondi supplementari della Provincia Autonoma di Bolzano.

Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti):

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006: € 132,00
 Spesa pubblica totale: € 300,00

Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro):

Misura 111 - Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione	Spesa pubblica (FEASR) - Anno 2013	Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi dal 2007 all'anno 2013		Spesa pubblica programmata 2007 - 2013		Esecuzione finanziaria del PSR
		FEASR	TOTALE	Di cui FEASR	TOTALE	
Ordinario	98,07	294,19	668,05	616,00	1.398,44	47,8%
Ordinario – parte LEADER(quota inclusa nella tabella G5-411/412/413)	58,28	96,12	218,45	116,71	265,24	82,4%
Health Check	Misura non attivata ai sensi dell'HC					

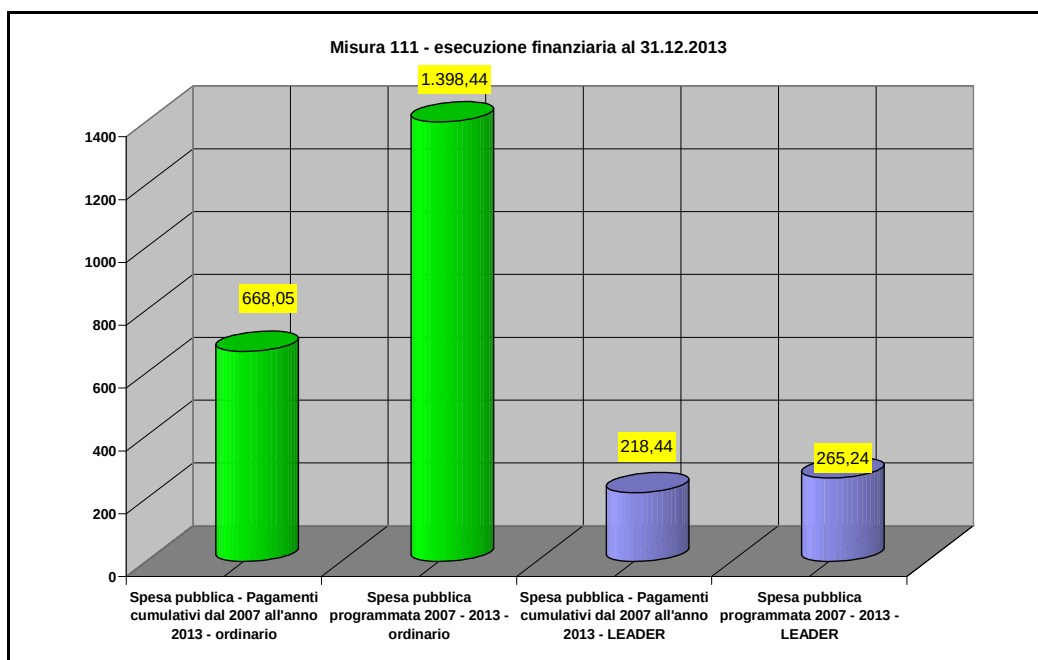

Quota ordinaria: le spese relative alla misura della formazione in agricoltura e nel settore forestale liquidate nell'anno solare 2013 ammontano a 222.630,98 € con una quota comunitaria pari a 98.068,95 €. La spesa pubblica complessivamente liquidata finora è pari a 668.052,78 €, pari al 47,8% delle disponibilità previste dal PSR.

Per il settore forestale circa il 10% delle risorse assegnate alla misura non risultano impegnate al 31.12.2013.

Quota ordinaria – quota parte LEADER: si ritiene utile aggiungere un'informazione che le tabelle ufficiali UE non contengono se non in forma cumulata alla voce 411/412/413 della tabella G5. La spesa pubblica 2013 per la parte Leader della 111 ammonta a 132.460,16 € (quota FEASR: 58.282,47 €). Il tasso di esecuzione è più che raddoppiato rispetto al 2012 risultando pari all'82,4% delle risorse programmate.

Stato di attuazione fisico:

Misura 111 - Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione	Indicatori di prodotto	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2007 all'anno 2013	Obiettivi 2007-2013	Tasso di esecuzione del PSR - anno 2013	Tasso di esecuzione cumulato del PSR
Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1)	Numero di partecipanti alla formazione	171	2.458	3.290	5,2%	74,7%
	Numero di giorni di formazione impartita	223	1.944	2.550	8,7%	76,2%
Risorse ordinarie (cfr. tabella	Numero di partecipanti alla for-	81	211	600	13,5%	35,2%

O41(2) parte LEADER (quota non inclusa nella tabella G5-411/412/413)	mazione					
	Numero di giorni di formazione impartita	80	248	300	26,7%	82,7%
Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2)	Numero di partecipanti alla formazione	0	1	1	0%	100%
Health Check (cfr. tabelle G3.HC)	Numero di partecipanti alla formazione	Misura non attivata ai sensi dell'HC				
	Numero di giorni di formazione impartita					

Quota ordinaria: nel corso del 2013, per la misura 111, sono state liquidate 7 domande relative a corsi di formazione a cui hanno aderito complessivamente 171 partecipanti per un totale di 223 giornate formative. La Ripartizione Foreste ha effettuato liquidazioni per 1 domanda di pagamento, mentre la Formazione professionale in agricoltura ha effettuato liquidazioni per 6 domande.

Il tasso d'attuazione fisico, pari al 74,7% dei partecipanti ed al 76,2% delle giornate di formazione previste, denota un elevato interesse da parte del mondo agricolo e di quello forestale. Il numero di giorni di formazione impartita finora è pari a 1.944, mentre complessivamente i partecipanti risultano essere 2.458.

Quota ordinaria – quota parte LEADER: nel corso del 2013 sono state liquidate 5 domande relative a corsi di formazione in ambito agricolo a cui hanno aderito complessivamente 81 persone per un totale di 80 giornate formative. Il tasso di attuazione fisico raggiunge rispettivamente il 35,2% e l'82,7% delle previsioni.

Non sono state eseguite liquidazioni per misure del vecchio PSR 2000-2006; non sono previsti fondi Health Check per la misura.

Risultato:

Misura 111 - Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2007 all'anno 2013	Obiettivi 2007-2013	Tasso di esecuzione del PSR - anno 2013	Tasso di esecuzione cumulato del PSR
(R1) Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione in materia agricola e/o forestale	171	2.447	3.290	5,2%	74,4%

Tutti e 171 i partecipanti hanno terminato con successo nel 2013 corsi di formazione finalizzati all'ottenimento di un certificato. Il tasso di esecuzione cumulato evidenzia un buon risultato per questa misura (74,4%)

Tabella O111:

L'Amministrazione provinciale ha realizzato complessivamente 27 corsi di formazione (14 sono stati organizzati dalla Ripartizione Formazione Professionale in agricoltura e 13 dalla Ripartizione Foreste), che hanno avuto come oggetto: le capacità gestionali, amministrative e di marketing nel settore agricolo per il 3,2% dei partecipanti totali e per il 77,3% delle giornate di formazione; nuovi macchinari e processi tecnologici/pratiche innovative nel settore forestale rispettivamente per il 2,8% dei partecipanti e lo 0,9% delle giornate; nuovi requisiti (settori agricolo e forestale) rispettivamente per il 66,7% dei partecipanti ed il 20,7% delle giornate; la qualità dei prodotti agricoli per lo 0,6% dei partecipanti e lo 0,6% delle giornate; la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e la protezione dell'ambiente per il 20,3% dei

partecipanti e lo 0,1% delle giornate, altri corsi in selvicoltura per il 6,3% dei partecipanti e per lo 0,4% delle giornate di formazione.

Ai corsi hanno partecipato complessivamente 2.458 persone, per un totale di 1.944 giorni di formazione.

Per quanto riguarda il sesso dei partecipanti ai corsi di formazione, 1.902 sono maschi, per un 77,4% del totale. Di essi 986 hanno età superiore ai 40 anni (51,8%). Le donne (556, pari al 22,6% dei partecipanti) che hanno più di 40 anni sono complessivamente 438 (78,8%), mentre quelle sotto questa soglia anagrafica sono 118 (21,2%).

Nel settore forestale 567 partecipanti sono maschi e 219 partecipanti sono femmine; la percentuale delle persone con meno di 40 anni raggiunge il 34,9% del totale dei maschi e il 23,3% del totale delle femmine.

Nel settore agricolo i maschi sono l'80,1% del totale dei partecipanti, di questi il 52,9% ha meno di 40 anni.

Misura 112 - Articolo 20 (a) (ii): Insediamento di giovani agricoltori.

Obiettivi in sintesi:

Favorire l'inserimento dei giovani agricoltori nel mondo agricolo; contribuire allo sviluppo del settore agricolo e contrastare l'emigrazione dal territorio rurale; favorire la nascita di una nuova classe imprenditoriale giovanile in grado di acquisire specifiche capacità professionali soprattutto per il riorientamento qualitativo della produzione, per l'applicazione di metodi di produzione compatibili con la protezione dello spazio naturale, per il mantenimento del paesaggio, per la tutela dell'ambiente.

Piano finanziario in sintesi:

	costo totale (inclusi i trascinamenti)	spesa pubblica totale	QUOTA FEASR	QUOTA NAZIONALE	spesa privata
TOTALE	9.887.500	9.887.500	4.355.339	5.532.161	-

Aiuti di stato supplementari (Top Up):

È previsto un finanziamento supplementare con fondi provinciali, finalizzato ad estendere il numero dei potenziali beneficiari finali che potranno aderire alla misura stessa. L'importo supplementare a carico della Provincia Autonoma di Bolzano è di 31.000.000,00 €.


Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti):

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006: € 8.800,00

Spesa pubblica totale: € 20.000,00

Stato di attuazione finanziaria (in migliaia di euro):

Misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori	Spesa pubblica (FEASR) - Anno 2013	Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi dal 2007 all'anno 2013		Spesa pubblica programmata 2007 - 2013		Esecuzione finanziaria del PSR
		FEASR	TOTALE	Di cui FEASR	TOTALE	
Ordinario	-6,36	4.349,56	9.882,47	4.355,34	9.887,50	99,9%
Health Check	Misura non attivata ai sensi dell'HC					

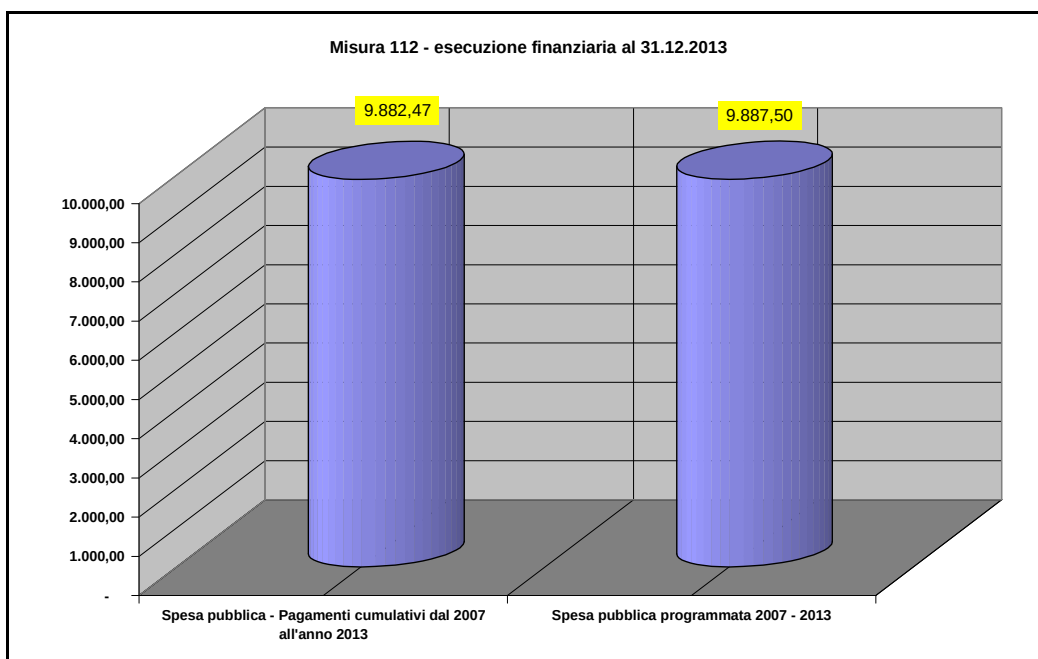

Per l'insediamento dei giovani agricoltori non ci sono stati pagamenti cofinanziati dall'Unione Europea nel corso del 2013, in quanto le risorse ordinarie della misura risultavano in pratica già esaurite al 31.12.2011. La spesa pubblica complessiva per il periodo 2007-2013 è di 9.882.473,59 €, corrispondente ad una quota comunitaria pari a 4.349.560,37 €, con un tasso di realizzazione del 99,9%. Per continuare a sostenere l'insediamento dei giovani agricoltori la Provincia Autonoma di Bolzano sta ricorrendo all'utilizzo di propri fondi nell'ambito del top up previsto dal PSR. Si sottolinea come per questa misura la Provincia Autonoma di Bolzano intenda applicare le norme comunitarie previste dagli articoli 1 e 3 del Reg. (UE) n. 1310/2013 nella gestione della transizione del sostegno allo Sviluppo Rurale nell'anno 2014.

Stato di attuazione fisico:

Misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori	Indicatori di prodotto	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2007 all'anno 2013	Obiettivi 2007-2013	Tasso di esecuzione del PSR - anno 2013	Tasso di esecuzione cumulato del PSR
Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1)	Numero di giovani agricoltori beneficiari	0	456	450	0%	101%
	Volume totale di investimenti (000 euro)	-14,45	9.862,47	9.868,00	- 0,1%	100%
Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2)	Numero di domande approvate	0	1	1	0%	100%
Health Check (cfr. tabelle G3.HC)	Numero di giovani agricoltori beneficiari	Misura non attivata ai sensi dell'HC				
	Volume totale di investimenti (000 euro)					

Per la misura 112, giovani agricoltori, sono state liquidate complessivamente 456 domande pari all'101% della previsione complessiva, dato questo che conferma il raggiungimento degli obiettivi prefissati. I fondi comunitari non sono risultati sufficienti a garantire la copertura di tutti gli anni di programmazione, imponendo quindi all'Amministrazione provinciale uno sforzo finanziario particolarmente oneroso utilizzando i fondi provinciali top up. Nel

2013 non sono state liquidate domande relative al vecchio PSR e non sono previsti fondi HC per questa misura.

Risultato:

Misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2007 all'anno 2013	Obiettivi 2007-2013	Tasso di esecuzione del PSR - anno 2013	Tasso di esecuzione cumulato del PSR
(R2) Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie (000 EUR)	0	1.851,36	1.827	0	101%

Per quanto riguarda l'incremento del valore aggiunto nelle aziende sostenute nel periodo 2007 - 2013, si stima un aumento pari a circa 1.851.360 €, corrispondente al 101% dell'obiettivo quantificato per questo indicatore di risultato. Per azienda il dato medio è pari approssimativamente a 4.000 €.

Tabella O112:

Delle 456 nuove domande di primo insediamento liquidate nel periodo 2007-2013, 20 (4,4%) riguardano il settore vitivinicolo, 117 (25,6%) il settore frutticolo (mele), 295 (64,7%) il settore lattiero-caseario. Altre 24 domande sono relative ad aziende miste coltivazioni – allevamento (5,3%).

Le domande liquidate nel periodo 2007-2013 hanno riguardato 398 giovani di sesso maschile su un totale di 456: il dato è pari al 87,3%. Le giovani finora sostenute sono complessivamente 58 e il 12,7% del totale.

Misura 115 - Articolo 20 (a) (v): Avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza, per le aziende agricole e silvicole

Obiettivi in sintesi:

Agevolare la gestione delle aziende agricole permettendo agli imprenditori agricoli periodi di assenza in quanto il servizio di sostituzione aziendale fornisce in servizio richiesto in azienda; ottimizzare le risorse tramite l'istituzione di servizi di sostituzione e di gestione; favorire la creazione di forme di cooperazione fra imprese agricole e silvicole, sfruttando le sinergie esistenti e rafforzando la solidarietà tra imprenditori agricoli a tempo pieno e a tempo parziale al fine di creare una rete collettiva di servizi di assistenza, di sostituzione e di consulenza alle aziende agricole e silvicole singole e associate; incentivare la collaborazione tra agricoltori e/o selvicoltori finalizzata al raggiungimento di un migliore utilizzo del parco macchine esistente, contrastando in tal modo una eccessiva meccanizzazione a livello di singola impresa, e valorizzando lo sviluppo e l'innovazione tecnologici; ridurre le punte di lavoro attraverso l'aiuto reciproco tra agricoltori, offrendo servizi in situazioni di emergenza, potenziando i servizi presenti sul territorio e sperimentando metodi e forme di organizzazione del lavoro nuove e promuovendo la collaborazione con le imprese; garantire la continuità della gestione delle aziende; migliorare la competitività delle aziende e la loro produttività riducendo i costi di esercizio.

Piano finanziario in sintesi:

	costo totale (inclusi i trascinamenti)	spesa pubblica totale	QUOTA FEASR	QUOTA NAZIONALE	spesa privata
TOTALE	500.081	400.065	176.224	223.841	100.016

Aiuti di stato supplementari (Top Up):

Non saranno utilizzati fondi supplementari della Provincia Autonoma di Bolzano.


Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti):

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006: € 0,00

Spesa pubblica totale: € 0,00

Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro):

Misura 115 - Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione	Spesa pubblica (FEASR) - Anno 2013	Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi dal 2007 all'anno 2013		Spesa pubblica programmata 2007 - 2013		Esecuzione finanziaria del PSR
		FEASR	TOTALE	Di cui FEASR	TOTALE	
Ordinario	-	88,21	200,00	176,22	400,07	50,0%
Health Check	Misura non attivata ai sensi dell'HC					

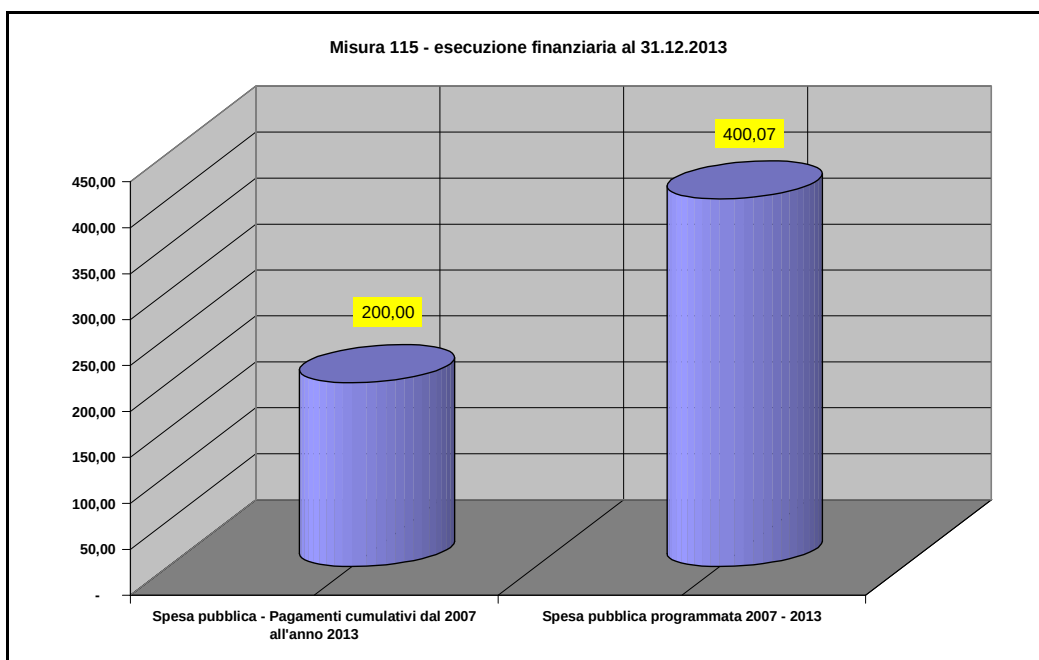

Nel corso del 2013 non ci sono aiuti liquidati per la misura 115. La spesa pubblica complessiva ha raggiunto la somma di 200.000,00 € ed è stata erogata per finanziare l'avviamento del servizio di sostituzione del "Maschinenring"; questo importo corrisponde al limite massimo previsto dal regime del de minimis. Il tasso di attuazione complessivo della misura è pari al 50,0% delle previsioni. È importante sottolineare che nel corso del 2013 la misura è stata oggetto di rifinanziamento, al fine di utilizzare fondi del PSR, che sarebbero rimasti inutilizzati in altre misure, per il sostegno all'avviamento di nuovi servizi di consulenza a favore delle aziende agricole provinciali. Le risorse aggiuntive sono state impegnate per sostenere una nuova domanda d'aiuto.

Stato di attuazione fisico:

Misura 115 - Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione	Indicatori di prodotto	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2007 all'anno 2013	Obiettivi 2007-2013	Tasso di esecuzione del PSR - anno 2013	Tasso di esecuzione cumulato del PSR
Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1)	Numero di nuovi servizi avviati	0	1	2	0%	50%
Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2)	Numero di nuovi servizi avviati	0	0	0	0%	0%
Health Check (cfr. tabelle G3.HC)	Numero di nuovi servizi avviati	Misura non attivata ai sensi dell'HC				

Per la misura 115 è stata liquidata una domanda relativa all'avviamento di servizi di sostituzione e di impiego collettivo dei macchinari agricoli ("Maschinenring"). Il servizio di sostituzione in questione appare come una delle innovazioni più importanti e significative introdotte nel settore agricolo e forestale in Provincia Autonoma di Bolzano negli ultimi dieci anni; il suo successo è giustificato dall'elevato numero di aziende che hanno aderito all'iniziativa. Certamente in una situazione connotata da dimensioni aziendali molto ridotte, il risparmio in termini di capitali investiti in macchinari è importante e consente di ridurre l'indebitamento degli agricoltori e di aumentare il reddito netto aziendale.

Anche se il tasso di attuazione fisico risulta pari al 50%, non si intravedono difficoltà per il raggiungimento degli obiettivi prefissati entro il 2015, in quanto è stata presentata ed approvata una domanda d'aiuto finalizzata a sostenere le spese di avviamento di un nuovo servizio di consulenza aziendale.

Risultato:

Misura 115 - Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2007 all'anno 2013	Obiettivi 2007-2013	Tasso di esecuzione del PSR - anno 2013	Tasso di esecuzione cumulato del PSR
(R2) Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie (000 EUR)	-	26,5	53	0%	50%

Per quanto riguarda l'incremento del valore aggiunto nelle aziende sostenute, si stima un aumento pari a 26.500 €, corrispondente al 50% dell'obiettivo quantificato per questo indicatore di risultato.

Tabella O115:

Nel periodo 2007-2013 sono state liquidate tre domande annuali presentate da un'associazione provinciale senza fini di lucro creata tra agricoltori, che si occupa della gestione collettiva delle macchine agricole.

Misura 121 - Articolo 20 (b) (i): Ammodernamento delle aziende agricole

Obiettivi in sintesi:

Ridurre i costi di produzione; migliorare qualitativamente la produzione; migliorare la redditività delle aziende agricole; tutelare e migliorare l'ambiente naturale e le condizioni di igiene e benessere degli animali. Recepire la nuova sfida "Misure di accompagnamento del settore lattiero - caseario" attraverso la riqualificazione delle aziende singole sotto l'aspetto igienico sanitario e di produzione di latte di alta qualità, il miglioramento della salute e del

benessere degli animali ed il potenziamento della redditività riferita all'attività agricola tramite il miglioramento dei metodi di produzione.

Piano finanziario in sintesi:

	costo totale (inclusi i trascinamenti)	spesa pubblica totale	QUOTA FEASR	QUOTA NAZIONALE	spesa privata
TOTALE	30.418.335	14.729.918	7.153.000	7.576.918	15.688.417

Aiuti di stato supplementari (Top Up):

Non saranno utilizzati fondi supplementari della Provincia Autonoma di Bolzano.


Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti):

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006: € 0,00

Spesa pubblica totale: € 0,00


Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro):

Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole	Spesa pubblica (FEASR) - Anno 2013	Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi dal 2007 all'anno 2013		Spesa pubblica programmata 2007 - 2013		Esecuzione finanziaria del PSR
		FEASR	TOTALE	Di cui FEASR	TOTALE	
Ordinario	138,15	4.304,91	9.772,49	4.653,00	10.563,25	92,5%
Health Check	170,64	2.140,85	3.568,09	2.500,00	4.166,67	85,6%

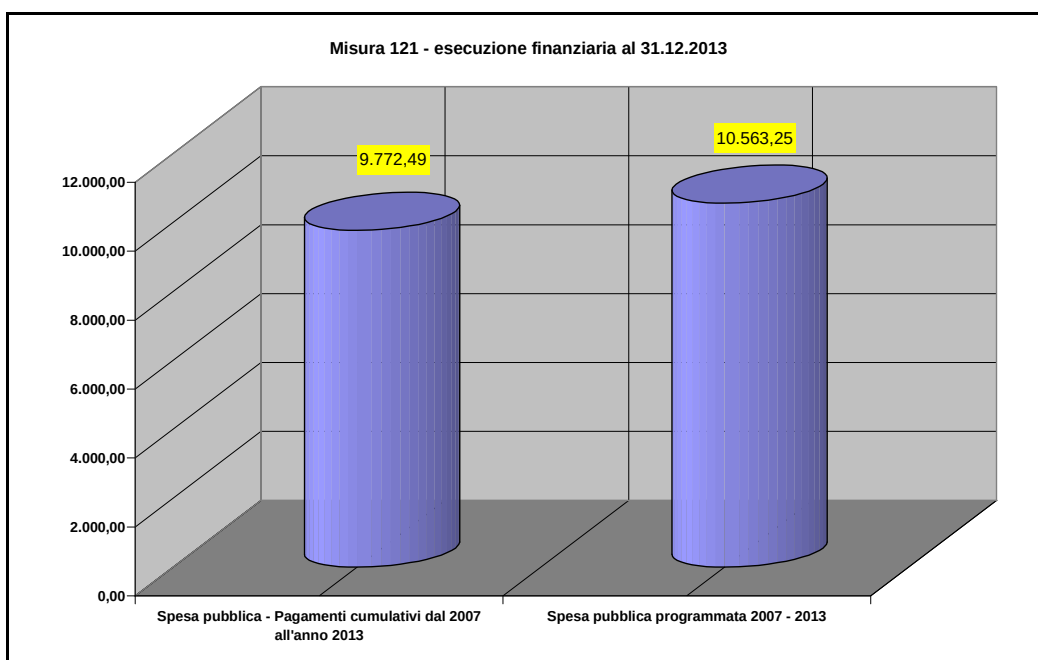

Per gli investimenti aziendali della misura 121 nel corso del 2013 sono stati liquidati aiuti pubblici per un importo pari a 313.467,86 €, con una corrispondente quota comunitaria pari a 138.146,23 €. Il tasso di avanzamento risulta molto buono (92,5%). Il completamento della spesa relativa a questa misura dovrebbe essere garantito.

Si sottolinea come per questa misura la Provincia Autonoma di Bolzano intenda applicare le norme comunitarie previste dagli articoli 1 e 3 del Reg. (UE) n. 1310/2013 nella gestione della transizione del sostegno allo Sviluppo Rurale nell'anno 2014.

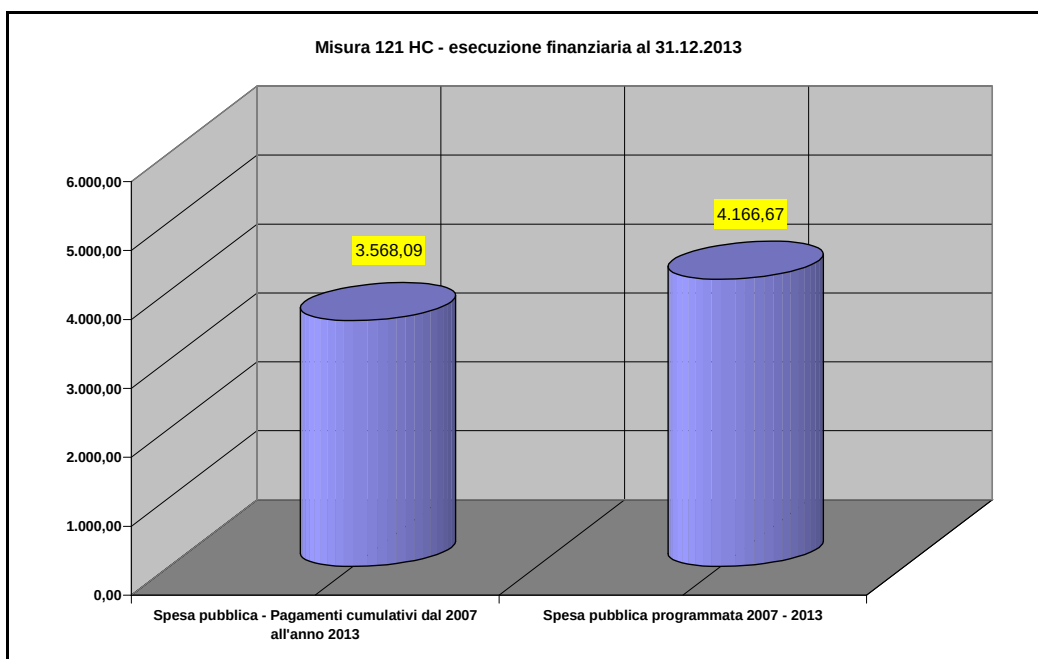

Accanto ai fondi ordinari, si deve ricordare quelli Health Check: nel corso del 2013 sono stati liquidati aiuti pubblici per un importo pari a 284.400,00 €. Il tasso di avanzamento è dell'85,6%. L'avanzamento della misura risulta molto soddisfacente ed il raggiungimento dell'obiettivo di spesa dovrebbe essere garantito.

Non sono previste infine liquidazioni per domande relative al vecchio PSR.

Stato di attuazione fisico:

Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole	Indicatori di prodotto	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2007 all'anno 2013	Obiettivi 2007-2013	Tasso di esecuzione del PSR - anno 2013	Tasso di esecuzione cumulato del PSR
Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1)	Numero di aziende agricole beneficiarie	1	78	120	0,8%	65%
	Volume totale di investimenti (000 euro)	617,13	21.553,30	23.474,00	2,6%	92%
Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2)	Numero di domande approvate	0	0	0	0%	0%
Health Check (cfr. tabelle G3.HC)	Numero di aziende agricole beneficiarie	1	23	30	3,3%	77%
	Volume totale di investimenti (000 euro)	486,25	6.061,04	6.944	7,0%	87%

Risorse ordinarie:

Nel 2013, per la misura 121, sono stati liquidati contributi a favore di una nuova azienda agricola, pari allo 0,8% della previsione complessiva (120 domande). Gli investimenti realizzati ed ammessi a contributo nel 2013 ammontano circa 0,6 Meuro, pari al 2,6% del totale previsto. Nel complesso la misura denota un buon tasso di realizzazione: finora il numero di aziende che ha potuto beneficiare degli aiuti è pari complessivamente a 78 (65% delle previsioni), mentre i costi totali ammessi ammontano a circa 21,5 Meuro (92% rispetto alle previsioni).

Risorse Health Check

Le domande complessivamente liquidate con fondi Health Check sono 23 (di cui una nuova azienda beneficiaria finanziata nel corso del 2103), pari al 77% della previsione. Gli investimenti realizzati ammontano a circa 6,1 Meuro, corrispondente ad un tasso di realizzazione dell'87%. Questo è un valore più che considerevole dato che i fondi sono stati messi a disposizione solamente nell'anno 2009.

Risultato:

Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2007 all'anno 2013	Obiettivi 2007-2013	Tasso di esecuzione del PSR - anno 2013	Tasso di esecuzione cumulato del PSR
(R2) Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie (000 EUR)	0,4	1.230,4	1.893	0,02%	65%
(R3) Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche	0	5	6	-	83%

Per quanto riguarda l'incremento del valore aggiunto nelle aziende sostenute nel corso del periodo 2007-2013, si stima un aumento pari a 1.230.450 €, corrispondente al 65% dell'obiettivo quantificato per questo indicatore di risultato. Il dato corrisponde ad un valore di 15.770 € per azienda.

Cinque delle aziende agricole ammesse ai sensi della misura 121 hanno introdotto nuove tecniche di produzione e/o trasformazione. Non sono stati invece finanziati progetti finalizzati all'ottenimento di nuovi prodotti.

Tabella O121:

Tutte e 78 le domande liquidate relative agli investimenti aziendali sono da riferire al settore lattiero – caseario, per il quale è stato privilegiato il sostegno ad investimenti sui fabbricati rurali.

Gli agricoltori di sesso maschile sono complessivamente 70 (89,7%), di cui 26 (37,1%) sotto i 40 anni e 44 (62,9%) sopra; il sesso femminile è costituito da 8 richiedenti (10,3%) di cui 1 sotto i 40 anni.

Tutte le domande sono relative ad aziende in territorio svantaggiato di montagna dedite alla produzione di tipo tradizionale di latte.

Tabella H121:

Le 23 domande complessivamente liquidate si riferiscono al sostegno degli investimenti connessi alla produzione lattiero - casearia con un volume di investimento complessivo di 6,06 Meuro.

Tutte le domande sono relative ad aziende in territorio svantaggiato di montagna dedite alla produzione di tipo tradizionale di latte.

Misura 122 Articolo 20 (b) (ii): Miglioramento del valore economico delle foreste

Obiettivi in sintesi:

Migliorare la capacità produttiva dei boschi, considerando la loro stabilità bioecologica e/o il mantenimento della loro piena multifunzionalità ed intera gamma ecosistemica; sostenere

una gestione attiva e sostenibile delle foreste; migliorare l'accessibilità ai boschi; migliorare le attrezzature di taglio, di allestimento, di esbosco per aumentare l'efficienza e produttività del lavoro boschivo e ridurre i costi di produzione; recuperare e valorizzare nuovi prodotti forestali come le biomasse forestali ai fini energetici, assicurando comunque il rispetto della biodiversità e delle risorse acqua e suolo ed escludendo le aree paesaggistiche di particolare importanza.

Piano finanziario in sintesi:

	costo totale (inclusi i trascinamenti)	spesa pubblica totale	QUOTA FEASR	QUOTA NAZIONALE	spesa privata
TOTALE	6.825.742	4.095.445	1.804.000	2.291.445	2.730.297

Aiuti di stato supplementari (Top Up):

Non saranno utilizzati fondi supplementari della Provincia Autonoma di Bolzano.


Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti):

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006: € 46.000,00

Spesa pubblica totale: € 104.545,45

Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro):

Misura 122 - Miglioramento del valore economico delle foreste	Spesa pubblica (FEASR) - Anno 2013	Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi dal 2007 all'anno 2013		Spesa pubblica programmata 2007 - 2013		Esecuzione finanziaria del PSR
		FEASR	TOTALE	Di cui FEASR	TOTALE	
Ordinario	16,10	1.782,48	4.042,27	1.804,00	4.095,45	98,7%
Health Check	Misura non attivata ai sensi dell'HC					

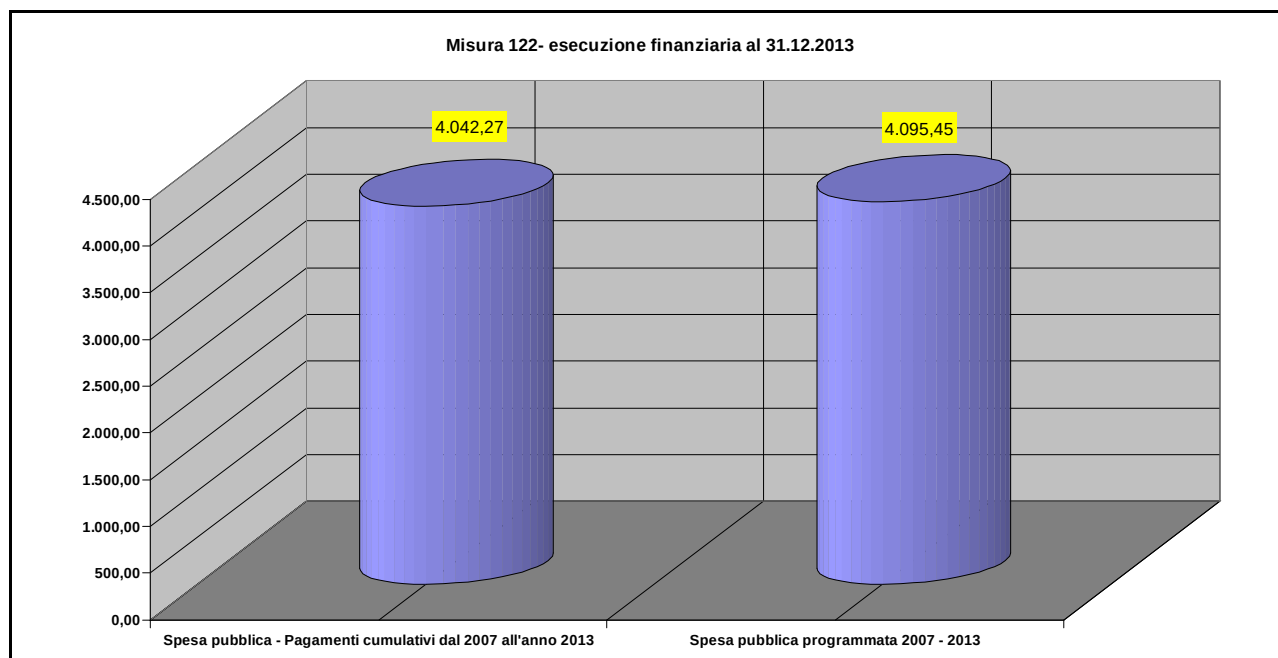

Nel corso del 2013 sono state liquidate domande per un importo pari a 36.540,46 €, con una quota dell'UE corrispondente di 16.096,07 €. È stato raggiunto un tasso di esecuzione del 98,7% rispetto alla disponibilità complessiva della misura: la spesa pubblica liquidata finora con il PSR ammonta a circa 4 milioni di €. Non si sono avute liquidazioni per trascinamenti e non sono previsti fondi HC.

Stato di attuazione fisico:

Misura 122 - Miglioramento del valore economico delle foreste	Indicatori di prodotto	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2007 all'anno 2013	Obiettivi 2007-2013	Tasso di esecuzione del PSR - anno 2013	Tasso di esecuzione cumulato del PSR
Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1)	Numero di aziende agricole beneficiarie	7	1.427	1.600	0,4%	89%
	Volume totale di investimenti (000 euro)	101,49	9.385,79	6.621,00	30%	142%
Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2)	Numero di domande approvate	0	46	42	0%	110%
Health Check (cfr. tabelle G3.HC)	Numero di aziende agricole beneficiarie	Misura non attivata ai sensi dell'HC				
	Volume totale di investimenti (000 euro)					

Per la misura 122 sono stati liquidati nel 2013 contributi a favore di 7 nuove aziende, per un ammontare degli investimenti pari a 101.494,52 €: nei sette anni di programma è stato raggiunto un numero di aziende beneficiarie pari a 1.427, corrispondente all'89% dell'obiettivo prefissato. L'obiettivo relativo agli investimenti approvati è già stato raggiunto e superato, con un valore percentuale pari al 142% delle previsioni. Ciò è da imputare, oltre che primariamente alle elevate richieste pervenute, al fatto che le previsioni di programmazione sono state effettuate con il tasso d'aiuto massimo del 60%, tasso che in realtà è stato modulato al ribasso in funzione delle caratteristiche di ciascuna domanda presentata.

Risultato:

Misura 122 - Miglioramento del valore economico delle foreste	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2007 all'anno 2013	Obiettivi 2007-2013	Tasso di esecuzione del PSR - anno 2013	Tasso di esecuzione cumulato del PSR
(R2) Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie (000 EUR)	3	624	700	0,4%	89%
(R3) Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche	0	4	4	0%	100%

Per quanto riguarda l'incremento del valore aggiunto nelle aziende sostenute nel corso del periodo 2007-2013, si stima un aumento pari a circa 624.000 €, corrispondente all'89% dell'obiettivo quantificato per questo indicatore di risultato. Il dato è pari in media a 437 € per azienda.

Quattro sono rimaste le aziende forestali ammesse che hanno introdotto nuove tecniche di produzione e/o trasformazione ai sensi della misura 122. Non sono stati invece finanziati progetti finalizzati all'ottenimento di nuovi prodotti.

Tabella O122:

Delle 1.593 domande liquidate sulla misura 122, 1.478 (93%) riguardano privati (agricoltori con un'azienda forestale in attività); 21 domande sono state presentate da Comuni (1%) e 94 riguardano Frazioni, Interessenze, Amministrazioni separate di beni uso civico, Diocesi, per un 6% del totale. Complessivamente le aziende forestali beneficiarie sono risultate 1.355 (valore che è pari al 95% del totale), i Comuni sono complessivamente 16, mentre Frazioni, Interessenze, Amministrazioni separate di beni uso civico, Diocesi ammontano a 56.

Il 100% delle domande e delle aziende finanziate ricade in territorio svantaggiato di montagna.

Misura 123 Articolo 20 (b) (iii): Accrescimento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria

Obiettivi in sintesi:

Razionalizzare le esistenti strutture di lavorazione e di commercializzazione; ottimizzare i processi di conservazione, di trasformazione e di commercializzazione della produzione dei settori frutticolo, vitivinicolo e lattiero-caseario; aumentare l'efficienza e la produttività del lavoro boschivo con un'adeguata tecnologia, garantendo nel contempo difesa dell'ambiente e gestione sostenibile della risorsa bosco; sostenere gli investimenti finalizzati alla diversificazione dei prodotti.

Piano finanziario in sintesi:

	costo totale (inclusi i trascinamenti)	spesa pubblica totale	QUOTA FEASR	QUOTA NAZIONALE	spesa privata
TOTALE	87.761.516	35.104.606	15.463.207	19.641.399	52.656.910

Piano finanziario della parte LEADER:

	costo totale	spesa pubblica totale	QUOTA FEASR	QUOTA NAZIONALE	spesa privata
TOTALE	174.996	69.998	30.800	39.198	104.998

Aiuti di stato supplementari (Top Up):

Non saranno utilizzati fondi supplementari della Provincia Autonoma di Bolzano.


Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti):

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006: € 671.000,00

Spesa pubblica totale: € 1.525.000,00

Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro):

Misura 123 - Accrescimento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria	Spesa pubblica (FEASR) - Anno 2013	Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi dal 2007 all'anno 2013		Spesa pubblica programmata 2007 - 2013		Esecuzione finanziaria del PSR
		FEASR	TOTALE	Di cui FEASR	TOTALE	
Ordinario	1.674,28	12.784,59	28.995,07	15.463,21	35.104,61	82,6%
Ordinario - parte LEADER(quota inclusa nella tabella G5-411/412/413)	15,25	27,29	62,04	30,80	70,00	88,6%
Health Check	Misura non attivata ai sensi dell'HC					

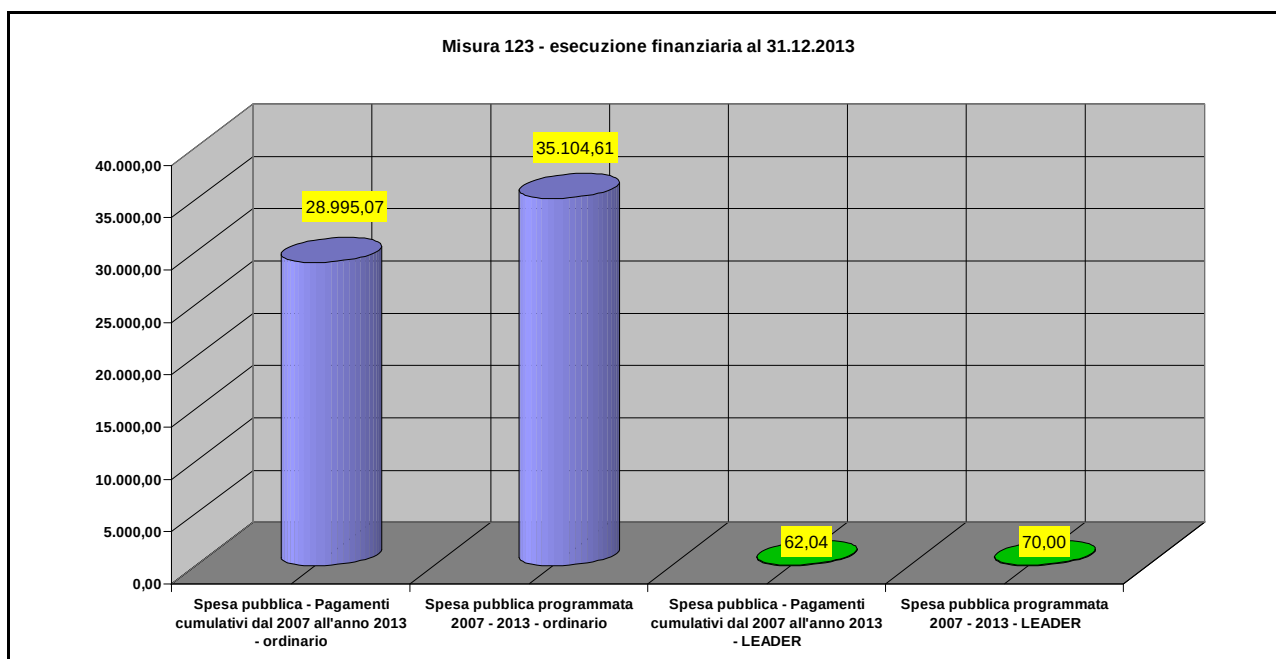

Quota ordinaria: la spesa pubblica liquidata per la misura 123 nel corso del 2013 ammonta a 3.800.849,20 € (la corrispondente quota FEASR è di 1.674.276,63 €). Accanto agli investimenti nel settore agroindustriale, sono stati rendicontati anche progetti nel settore forestale. I progetti approvati nell'ambito della misura sono numerosi e, soprattutto per il settore agricolo, con costi decisamente elevati.

Il tasso di realizzazione raggiunto finora è pari all'82,6% della disponibilità finanziaria totale. La fase di attuazione della misura proseguirà fino al 2015: benché tutte le risorse previste siano state impegnate e i progetti risultino completati/in corso di realizzazione, è molto probabile che le ultime domande (per un 5% della spesa prevista) potranno essere liquidate solamente nel 2015.

Si sottolinea come per questa misura la Provincia Autonoma di Bolzano intenda applicare le norme comunitarie previste dagli articoli 1 e 3 del Reg. (UE) n. 1310/2013 nella gestione della transizione del sostegno allo Sviluppo Rurale nell'anno 2014.

Quota ordinaria – quota parte LEADER: si ritiene utile aggiungere un'informazione che le tabelle ufficiali UE non contengono se non in forma cumulata alla voce 411/412/413 della tabella G5. Nel corso del 2013 la spesa pubblica liquidata per la parte Leader della misura 123 ammonta a 34.668,68 € (la corrispondente quota FEASR è di 15.254,22 €). La spesa pubblica complessiva ammonta a 62.039,26 € (quota FEASR: 27.297,28 €). Il tasso di esecuzione evidenzia un valore soddisfacente pari all'88,6%.

Stato di attuazione fisico:

Misura 123 - Accrescimento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria	Indicatori di prodotto	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2007 all'anno 2013	Obiettivi 2007-2013	Tasso di esecuzione del PSR - anno 2013	Tasso di esecuzione cumulato del PSR
Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1)	Numero di imprese beneficiarie	7	79	307	2,3%	25,7%
	Volume totale di investimenti (000 euro)	10.158,50	80.724,00	83.846,00	12,1%	96,3%
Risorse ordinarie (cfr. tabella O41(2) parte LEADER (quota non inclusa nella tabella G5-411/412/413))	Numero di imprese beneficiarie	1	2	2	50%	100%
	Volume totale di investimenti (000 euro)	86,67	155,10	175	49,5%	88,6%

Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2)	Numero di domande approvate	0	3	3	0%	100%
Health Check (cfr. tabelle G3.HC)	Numero di imprese beneficiarie	Misura non attivata ai sensi dell'HC				
	Volume totale di investimenti (000 euro)					

Quota ordinaria: nel 2013 per la misura 123 sono stati liquidati contributi a favore di 7 nuove imprese, per investimenti pari a circa 10,16 milioni di €; complessivamente le imprese beneficiarie risultano essere 79 con un tasso di realizzazione pari al 25,7%. Probabilmente risulta sovrastimato il numero di imprese del settore forestale (280 imprese) aderenti alla misura (si rimanda per i dettagli all'analisi del valutatore indipendente presentata al capitolo 4, paragrafo b). In termini di investimenti sostenuti il tasso di realizzazione complessivo della misura è al 96,3% e sarà destinato a superare il 100%, in quanto le previsioni di programmazione sono state effettuate con il tasso d'aiuto massimo del 40%, tasso che in realtà è stato modulato al ribasso in funzione della tipologia delle opere previste, del settore di produzione e delle dimensioni economiche dei richiedenti. Rispetto agli 80 milioni di € di costi previsti (solo Agricoltura, senza trascinamenti), l'attuale stima dei costi effettivamente realizzati si attesta sul valore di 98 milioni di €: a parità di dotazione finanziaria, quindi, i lavori realmente finanziati dovrebbero essere superiori del 20% rispetto alle previsioni iniziali. La misura 123, soprattutto per la parte agricola, è da considerarsi una componente essenziale, assieme alla 121, dell'asse 1 e del PSR di Bolzano.

Quota ordinaria – quota parte LEADER: nel 2013 sono stati liquidati contributi a favore di una nuova impresa, per investimenti pari a 86.671,70 €. Questa misura, che è stata oggetto di rimodulazione finanziaria in funzione del reale fabbisogno evidenziato dai Gruppi d'Azione Locale, evidenzia un tasso di esecuzione relativamente agli investimenti pari all'88,6%.

Risultato:

Misura 123 - Accrescimento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2007 all'anno 2013	Obiettivi 2007-2013	Tasso di esecuzione del PSR - anno 2013	Tasso di esecuzione cumulato del PSR
(R2) Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie (000 EUR)	755	5.319	5.900	12,8%	90%
(R3) Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche	1	15	20	5%	75%

Per quanto riguarda l'incremento del valore aggiunto nelle aziende sostenute, si stima un aumento pari a 5.319.000 €, corrispondente al 90% dell'obiettivo quantificato per questo indicatore di risultato. Tale valore è da attribuire in gran parte (96%) al settore agroindustriale, mentre un 4% del risultato va attribuito al settore forestale. Inoltre, 15 sono le aziende ammesse ai sensi della misura 123 che hanno introdotto nuove tecniche di produzione e/o trasformazione, tutte del settore agroindustriale. Non sono stati invece finanziati progetti finalizzati all'ottenimento di nuovi prodotti.

Tabella O123:

Delle 101 domande (complessivamente 79 imprese beneficiarie) liquidate nel periodo 2007-2013, 26 si riferiscono ad altrettante aziende del settore agricolo, mentre le restanti 75 sono relative a 53 aziende selvicolturali. Nell'ambito agroindustriale, 16 domande afferiscono al settore dell'ortofrutta fresca (mele), 8 al settore vitivinicolo e 2 al settore dei prodotti tra-

sformati. Molto diversi, ovviamente, sono i livelli di investimento dei due settori finanziati con il PSR: mentre per il settore agroindustriale le dimensioni medie degli investimenti ammontano a 2,955 MEURO, per il settore forestale il dato scende a circa 52.000 €. Si tratta, infatti, di microimprese attive nel settore forestale, mentre in agricoltura le aziende finanziate sono prevalentemente di dimensioni economiche medie.

Tutte le domande liquidate prevedono investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali, di cui una riguarda prodotti di tipo biologico.

Misura 124 (Articolo 20 (b) (iv)): Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo, forestale ed in quello alimentare.

Obiettivi in sintesi:

L'obiettivo è di incentivare nella fase pre-competitiva, la cooperazione tra agricoltori e/o tra soggetti della filiera agro-alimentare e forestale, per permettere di sfruttare adeguatamente il trasferimento di conoscenze finalizzate alla modernizzazione, all'innovazione e ad una più alta qualità nella catena alimentare. Nuovi soggetti, di dimensioni adeguate e più dinamici, permettono di introdurre nuove tecnologie e processi innovativi, garantendo un ritorno economico adeguato per i produttori. L'obiettivo della misura è quindi la diffusione dell'innovazione nella produzione, lo sviluppo di nuovi prodotti, il miglioramento delle qualità di prodotto e di processo ed un miglioramento dell'impatto ambientale del processo produttivo.

Piano finanziario in sintesi:

	costo totale (inclusi i trascinamenti)	spesa pubblica totale	QUOTA FEASR	QUOTA NAZIONALE	spesa privata
TOTALE	699.221	559.377	246.400	312.977	139.844

Piano finanziario della parte LEADER:

	costo totale	spesa pubblica totale	QUOTA FEASR	QUOTA NAZIONALE	spesa privata
TOTALE	312.492	249.994	110.000	139.994	62.498

Aiuti di stato supplementari (Top Up):

Non saranno utilizzati fondi supplementari della Provincia Autonoma di Bolzano.


Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti):

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006: € 0,00

Spesa pubblica totale: € 0,00

Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro):

Misura 124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo, forestale ed in quello alimentare	Spesa pubblica (FEASR) - Anno 2013	Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi dal 2007 all'anno 2013		Spesa pubblica programmata 2007 - 2013		Esecuzione finanziaria del PSR
		FEASR	TOTALE	Di cui FEASR	TOTALE	
Ordinario	239,71	239,71	544,18	246,40	559,38	97,3%
Ordinario - parte LEADER(quota inclusa nella tabella C5-411/412/413)	0	0	0	110,00	249,99	0%
Health Check	Misura non attivata ai sensi dell'HC					

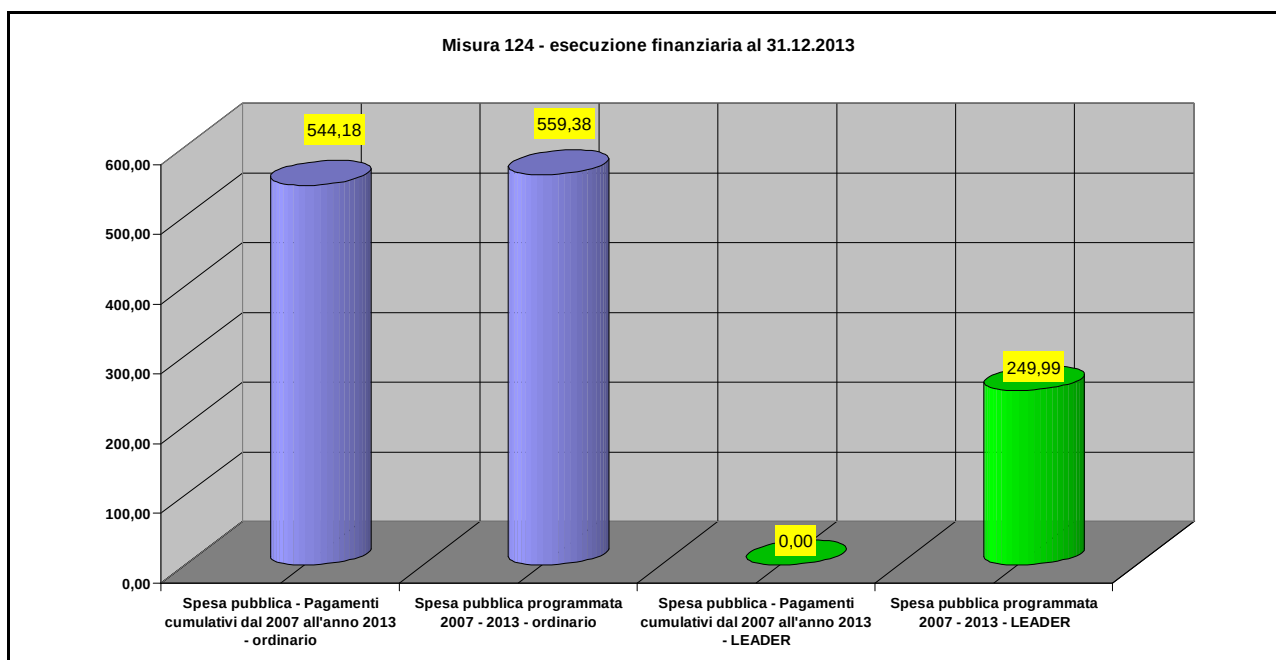

Quota ordinaria: la spesa pubblica liquidata per la misura 124 nel corso del 2013 ammonta a 544.177,64 € (la corrispondente quota FEASR è di 239.710,25 €). Si tratta delle prime liquidazioni avvenute per questa misura, che ha evidenziato in questi anni un certo ritardo nell'attuazione. Le risorse finanziarie sono state oggetto di rimodulazione in funzione delle reali richieste pervenute. Il tasso di realizzazione raggiunge un ottimo risultato e risulta pari al 97,3%.

Quota ordinaria – quota parte LEADER: si ritiene utile aggiungere un'informazione che le tabelle ufficiali UE non contengono se non in forma cumulata alla voce 411/412/413 della tabella G5. Non si registrano liquidazioni per la parte Leader della misura 124. Anche in questo caso le risorse finanziarie sono state ridotte sulla base delle esigenze evidenziate dai Gruppi d'Azione Locale. Per questa misura sono stati presentati e approvati progetti, che probabilmente si concluderanno solo nel 2015.

Stato di attuazione fisico:

Misura 124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo, forestale ed in quello alimentare	Indicatori di prodotto	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2007 all'anno 2013	Obiettivi 2007-2013	Tasso di esecuzione del PSR - anno 2013	Tasso di esecuzione cumulato del PSR
Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1)	Numero di iniziative di cooperazione sovvenzionate	4	4	2	200%	200%
Risorse ordinarie (cfr. tabella O41(2) parte LEADER (quota non inclusa nella tabella G5-411/412/413)	Numero di iniziative di cooperazione sovvenzionate	0	0	3	0%	0%
Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2)	Numero di domande approvate	0	0	0	0%	0%
Health Check (cfr. tabelle G3.HC)	Numero di iniziative di cooperazione sovvenzionate	Misura non attivata ai sensi dell'HC				

Quota ordinaria: nel 2013 per la misura 124 sono state finanziate 4 iniziative di cooperazione, delle quali una nel settore agricolo e tre nel settore forestale. Il tasso di esecuzione risulta

pari al 200%. In particolare, è stato finanziato in ambito forestale un numero maggiore di progetti rispetto alle previsioni, di dimensioni finanziarie più contenute.

Quota ordinaria – quota parte LEADER: il tasso di esecuzione risulta pari allo 0%.

Risultato:

Misura 124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo, forestale ed in quello alimentare	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2007 all'anno 2013	Obiettivi 2007-2013	Tasso di esecuzione del PSR - anno 2013	Tasso di esecuzione cumulato del PSR
(R2) Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie (000 EUR)	129	129	133	97%	97%
(R3) Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche	3	3	4	75%	75%

Per quanto riguarda l'incremento del valore aggiunto nelle aziende sostenute, si stima un aumento pari a 129.000 €, corrispondente al 97% dell'obiettivo quantificato per questo indicatore di risultato. Tale valore è da attribuire in gran parte (77%) al settore agricolo, mentre un 23% del risultato va attribuito al settore forestale. Un'iniziativa del settore forestale ha introdotto nuove tecniche di produzione e/o trasformazione. Inoltre, sono stati finanziati due progetti, uno in ambito agricolo ed uno in ambito forestale, finalizzati all'ottenimento di nuovi prodotti.

Tabella O124:

Le quattro domande finanziate nel periodo 2007 – 2013 riguardano tre iniziative di cooperazione (una relativa al settore agricolo e due relative al settore forestale) finalizzate allo sviluppo di nuovi prodotti ed un'iniziativa per lo sviluppo di nuove tecniche in ambito forestale.

Misura 125 (Articolo 20 (b) (v)): Miglioramento e sviluppo di infrastrutture in relazione all'evoluzione e all'adattamento dei settori agricolo e forestale

Obiettivi in sintesi:

Realizzare, potenziare ed ammodernare le infrastrutture collettive per la gestione delle risorse idriche, dando priorità alle soluzioni più rispettose nei confronti delle risorse ambientali; recepire la nuova sfida "Gestione dell'acqua" nell'ambito del Health Check, migliorando l'efficienza e la flessibilità nell'utilizzo delle risorse irrigue; ridurre l'impatto dell'irrigazione sui corpi idrici con conseguente miglioramento della situazione dei corsi d'acqua; assicurare una maggiore indipendenza dell'irrigazione dai fattori climatici; migliorare gli aspetti economici, ecologici e sociali del bosco e delle malghe attraverso un'accessibilità adeguata e rispettosa dell'ambiente; ridurre i danni alle piante ed al suolo dovuti alla raccolta del legname per strascico a lunga distanza.

Piano finanziario in sintesi:

	costo totale (inclusi i trascinalenti)	spesa pubblica totale	QUOTA FEASR	QUOTA NAZIONALE	spesa privata
TOTALE	15.815.758	12.124.487	5.340.708	6.783.779	3.691.271

Aiuti di stato supplementari (Top Up):

Non saranno utilizzati fondi supplementari della Provincia Autonoma di Bolzano.


Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti):

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006: € 1.137.722,00

Spesa pubblica totale: € 2.585.731,81

Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro):

Misura 125 - Miglioramento e sviluppo di infrastrutture in relazione all'evoluzione e all'adattamento dei settori agricolo e forestale	Spesa pubblica (FEASR) - Anno 2013	Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi dal 2007 all'anno 2013		Spesa pubblica programmata 2007 - 2013		Esecuzione finanziaria del PSR
		FEASR	TOTALE	Di cui FEASR	TOTALE	
Ordinario	225,55	3.168,04	7.195,03	5.340,71	12.124,49	59,3%
Health Check	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

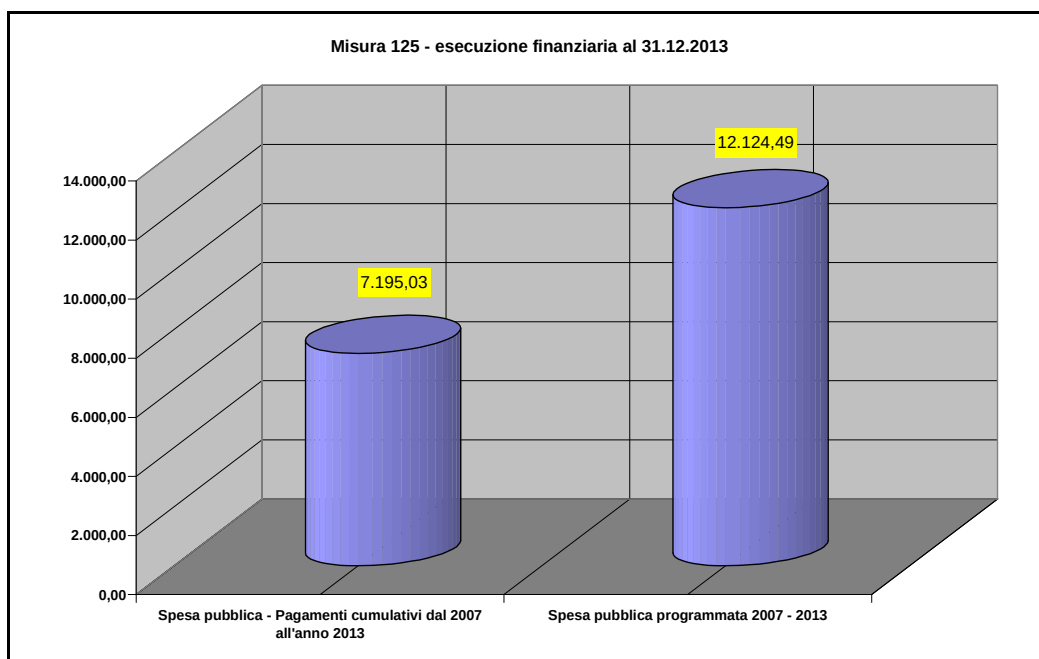

La spesa pubblica liquidata per la misura 125 nel corso del 2013 ammonta a 512.041,49 € (la corrispondente quota FEASR è di 225.554,28 €). Sono stati rendicontati stati d'avanzamento relativi a progetti del settore agricolo. Finora il tasso di realizzazione finanziaria della misura è giunto al 59,3% delle previsioni, con una spesa pubblica liquidata pari a 7,195 milioni di €.

Non sono previsti fondi Health Check per la misura.

Stato di attuazione fisico:

Misura 125 - Miglioramento e sviluppo di infrastrutture in relazione all'evoluzione e all'adattamento dei settori agricolo e forestale	Indicatori di prodotto	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2007 all'anno 2013	Obiettivi 2007-2013	Tasso di esecuzione del PSR - anno 2013	Tasso di esecuzione cumulato del PSR
Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1)	Numero di operazioni sovvenzionate	0	43	71	0%	61%
	Volume totale di investimenti (000 euro)	772,65	6.739,62	12.482	6,2%	54%
Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2)	Numero di domande approvate	0	37	37	0%	100%

Health Check (cfr. tabelle G3.HC)	Numero di operazioni sovvenzionate	0	0	0	0%	0%
	Volume totale di investimenti (000 euro)	0	0	0	0%	0%

Nel 2013 per la misura 125 sono stati liquidati successivi stati d'avanzamento per due domande del settore agricolo parzialmente già rendicontate negli anni precedenti. Il tasso di esecuzione della misura, rispetto alle domande sovvenzionate, è pari al 61% del totale, mentre con riferimento agli investimenti finanziati il valore si colloca al 54%.

Risultato:

Misura 125 - Miglioramento e sviluppo di infrastrutture in relazione all'evoluzione e all'adattamento dei settori agricolo e forestale	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2007 all'anno 2013	Obiettivi 2007-2013	Tasso di esecuzione del PSR - anno 2013	Tasso di esecuzione cumulato del PSR
(R2) Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie (000 EUR)	76	685	1.800	4,2%	38%

L'incremento del valore aggiunto lordo nelle aziende sostenute nel corso del periodo 2007-2013 viene stimato in 685.000 €, corrispondente al 38% dell'obiettivo quantificato per questo indicatore. Nell'ambito delle operazioni realizzate su terreni forestali il dato medio per azienda risulta essere pari a 5.167 €. Per quanto riguarda i due investimenti realizzati su terreni agricoli relativi ad infrastrutture collettive per la gestione delle risorse idriche si calcola un dato medio pari a circa 236.700 €.

Tabella O125:

41 domande liquidate per la misura 125 riguardano operazioni su terreni forestali, 2 domande invece operazioni su terreni agricoli. Complessivamente le operazioni sovvenzionate risultano essere 43 (valore che è pari al 61% del totale previsto).

Misura 133 (Articolo 20 (c) (iii)): Sostegno alle associazioni di produttori per le attività di promozione e informazione riguardanti i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare

Obiettivi in sintesi:

Sostenere azioni di promozione e di informazione riguardanti i prodotti di qualità certificati ed ottenuti con metodi di trasformazione rispettosi dell'ambiente; sostenere azioni volte ad espanderne il potenziale mercato; sostenere azioni volte ad aumentarne la conoscenza presso i consumatori.

Piano finanziario in sintesi:

	costo totale	spesa pubblica totale	QUOTA FEASR	QUOTA NAZIONALE	spesa privata
TOTALE	1.498.334	749.167	330.000	419.167	749.167

Aiuti di stato supplementari (Top Up):

Non saranno utilizzati fondi supplementari della Provincia Autonoma di Bolzano.


Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti):

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006: € 0,00
 Spesa pubblica totale: € 0,00

Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro):

Misura 133 - Sostegno alle associazioni di produttori per le attività di promozione e informazione riguardanti i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare	Spesa pubblica (FEASR) - Anno 2013	Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi dal 2007 all'anno 2013		Spesa pubblica programmata 2007 - 2013		Esecuzione finanziaria del PSR
		FEASR	TOTALE	Di cui FEASR	TOTALE	
Ordinario	0	119,06	270,20	330,00	749,17	36,1%
Health Check	Misura non attivata ai sensi dell'HC					

Nel corso del 2013 non ci sono state liquidazioni per la misura 133. Il tasso di esecuzione della misura rimane al 36,1% delle previsioni. Anche se il valore risulta contenuto, si sottolinea che le risorse finanziarie destinate al sostegno delle associazioni di produttori per le attività di promozione e informazione dei prodotti di qualità sono state oggetto di rimodulazione in funzione del fabbisogno reale, quantificato sulla base delle domande pervenute. Molto probabilmente l'obiettivo di spesa sarà raggiunto solo entro il 2015. Non sono previste risorse HC.

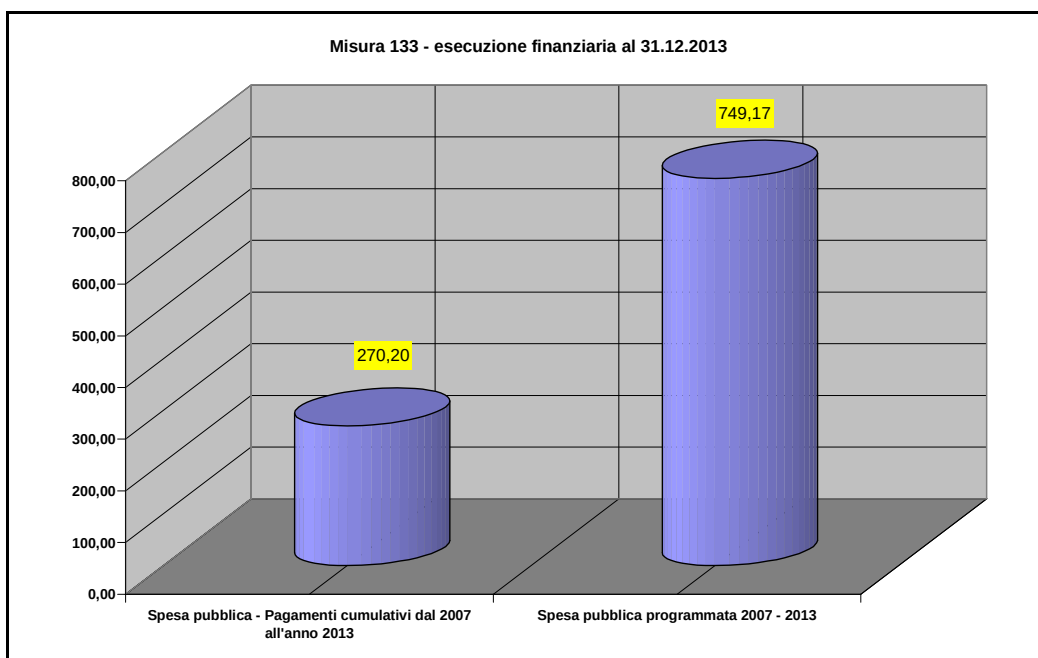

Stato di attuazione fisico:

Misura 133 - Sostegno alle associazioni di produttori per le attività di promozione e informazione riguardanti i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare	Indicatori di prodotto	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2007 all'anno 2013	Obiettivi 2007-2013	Tasso di esecuzione del PSR - anno 2013	Tasso di esecuzione cumulato del PSR
Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1)	Numero di operazioni sovvenzionate	0	1	2	0%	50%
	Volume totale di investimenti (000 euro)	0	540,39	1.498,33	0%	36,1%
Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2)	Numero di domande approvate	0	0	0	0%	0%
Health Check (cfr. tabelle G3.HC)	Numero di operazioni sovvenzionate	0	0	0	0%	0%
	Volume totale di investimenti (000 euro)	0	0	0	0%	0%

Nel 2013 non ci sono state liquidazioni per la misura 133. Il tasso di esecuzione della misura, rispetto alle domande sovvenzionate, si colloca al 50% del totale, mentre con riferimento

agli investimenti finanziati il valore è pari al 36,1%. Non sono state liquidate domande per le risorse HC.

Risultato:

Misura 133 - Sostegno alle associazioni di produttori per le attività di promozione e informazione riguardanti i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2007 all'anno 2013	Obiettivi 2007-2013	Tasso di esecuzione del PSR - anno 2013	Tasso di esecuzione cumulato del PSR
(R4) Valore della produzione agricola soggetta a marchi/norme di qualità riconosciuti (000 EUR)	0	10.260	28.000	0%	36,6%

Il valore (annuo) della produzione agricola soggetta a marchi di qualità riconosciuti relativo all'unica domanda liquidata nel periodo 2007-2013 nell'ambito della misura 133 viene stimato in 10.260.000 €, corrispondente al 36,6% dell'obiettivo quantificato.

Asse 2:

Misura 211 (Articolo 36 (a) (i)): Pagamenti per imprenditori agricoli per gli svantaggi naturali presenti nelle zone di montagna

Obiettivi in sintesi:

Compensare gli svantaggi naturali e il conseguente minore reddito degli imprenditori delle zone di montagna; assicurare la continuazione nel lungo periodo dell'attività agricola; tutelare il territorio e conservazione del paesaggio alpino; proteggere dalle calamità naturali; soddisfare le esigenze del settore turistico; mantenere un adeguato livello di presenza umana in zone minacciate di spopolamento.

Piano finanziario in sintesi:

	costo totale (inclusi i trasci- namenti)	spesa pubblica totale	QUOTA FEASR	QUOTA STATO	QUOTA BOLZANO	spesa pri- vata
TOTALE	62.381.211	62.381.211	27.447.717	34.933.494	-	-

Aiuti di stato supplementari (Top Up):

È previsto un finanziamento supplementare con fondi provinciali, finalizzato ad estendere il numero dei potenziali beneficiari finali che potranno aderire alla misura stessa. L'importo supplementare a carico della Provincia Autonoma di Bolzano è di 96.300.000,00 €.

Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trasciamenti):


Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006: € 4.800.000,00

Spesa pubblica totale: € 10.909.090,91

Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro):


Misura 211 - Pagamenti per imprenditori agricoli per gli svantaggi naturali presenti nelle zone di montagna	Spesa pubblica (FEASR) - Anno 2013	Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi dal 2007 all'anno 2013		Spesa pubblica programmata 2007 - 2013		Esecuzione finanziaria del PSR
		FEASR	TOTALE	Di cui FEASR	TOTALE	
Ordinario	-4,51	27.431,87	62.345,17	27.447,72	62.381,21	100,0%
Health Check	Misura non attivata ai sensi dell'HC					
Top Up	19.079,17	0,00	68.837,62	0,00	74.300,00	93%

Cofinanziamento - risorse ordinarie: per quanto riguarda l'indennità compensativa, nell'anno solare 2013 è stato recuperato il premio di una domanda pari a 4.514,94 € di spesa pubblica. A causa dell'esaurimento pressoché completo delle risorse disponibili il pagamento delle campagne 2011, 2012 e 2013 è avvenuto mediante i fondi aggiuntivi TOP UP della Provincia.

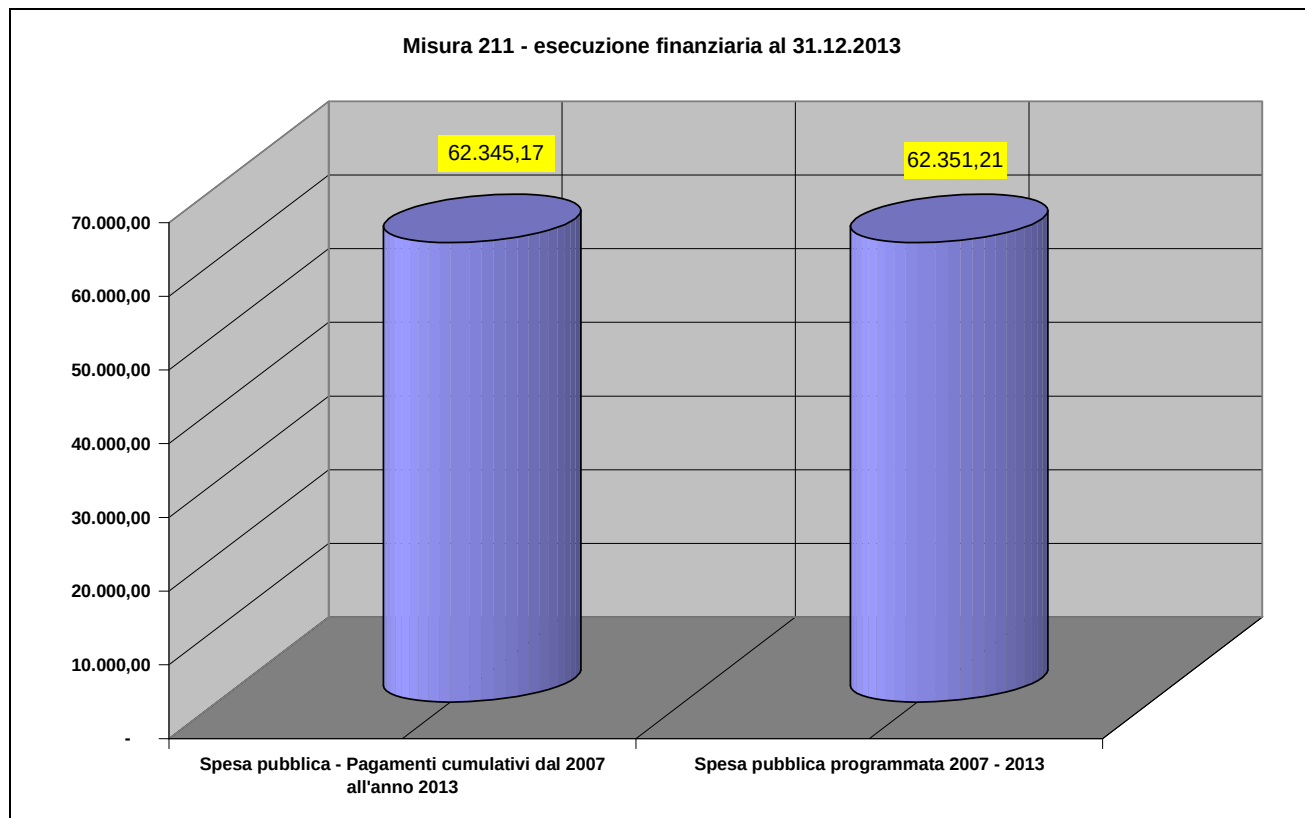

Risorse Top Up: per il saldo delle domande 2012 e per l'anticipo delle domande 2013 sono state utilizzate le risorse provinciali Top Up. La spesa provinciale del 2013 per la misura 211 ammonta a 19.079.176,33€. A partire dalla campagna 2009, è stato aumentato il budget complessivo per l'indennità compensativa per poter aumentare leggermente il premio medio per ettaro e per migliorare l'efficacia della misura ed il suo impatto sull'agricoltura di montagna. Secondo l'Amministrazione provinciale, la misura 211 rappresenta il fondamento per il sostegno delle zone svantaggiate di montagna anche per il futuro. La necessità di utilizzare fondi solamente provinciali è coerente con la strategia politica ed amministrativa a favore della montagna. Per il saldo delle domande della campagna 2013 e per la successiva annualità 2014, finanziata con le norme vigenti sulla transizione, la misura 211 dovrà essere finanziata nell'ambito della dotazione finanziaria top up prevista dall'ultima modifica del PSR. Infatti, dal momento che il tasso di utilizzo delle risorse top-up risulta pari al 92,65% del previsto e la nuova misura dell'indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici nell'ambito del PSR 2014-2020, avrà inizio soltanto a partire dalla campagna 2015, il 22 gennaio 2014 è stata inoltrata alla Commissione Europea una proposta di modifica del PSR che prevede di aumentare i fondi provinciali top up da destinare al finanziamento della misura 211, al fine di permettere la copertura della liquidazione della campagna 2014 con fondi provinciali.

Fondi Health Check non sono previsti per la 211.

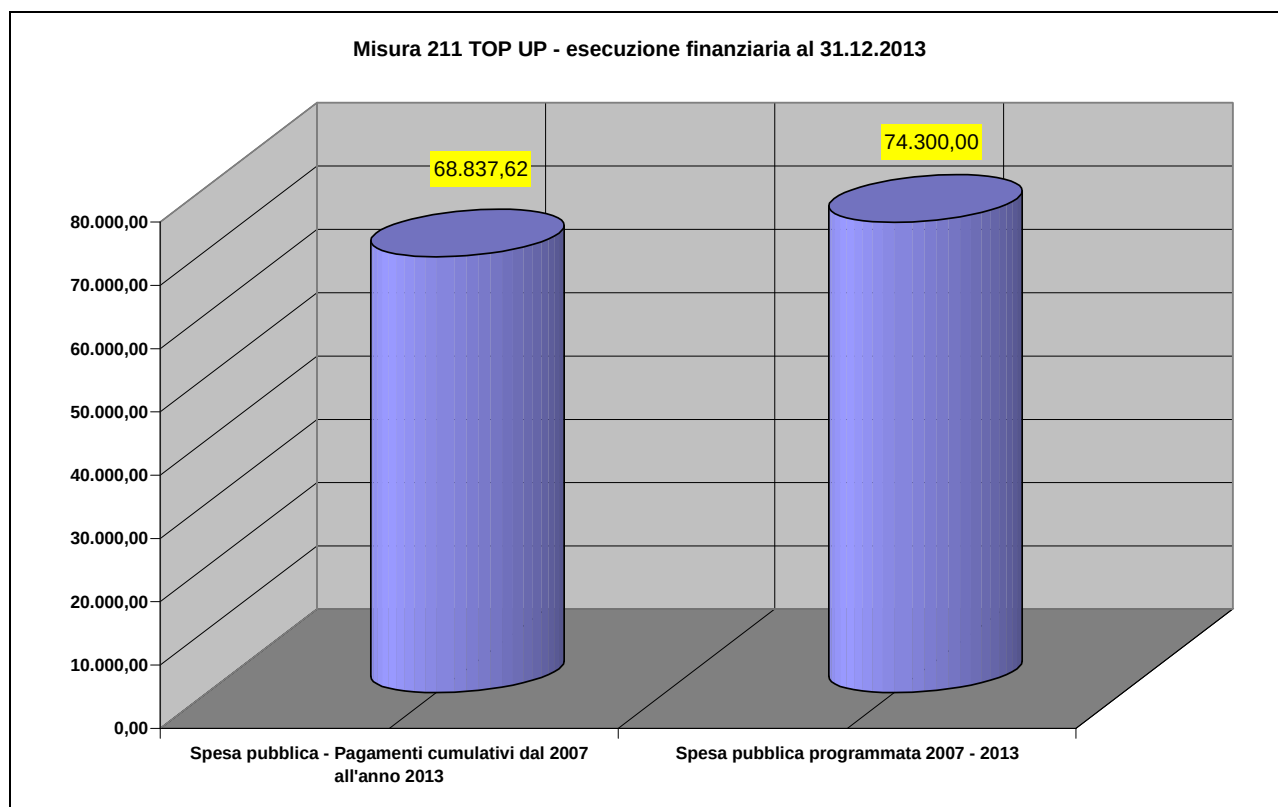

Stato di attuazione fisico⁹:

Misura 211 - Pagamenti per imprenditori agricoli per gli svantaggi naturali presenti nelle zone di montagna	Indicatori di prodotto	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2007 all'anno 2013	Obiettivi 2007-2013	Tasso di esecuzione del PSR - anno 2013	Tasso di esecuzione cumulato del PSR
Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1) + Top Up provinciale	Numero di aziende beneficiarie	8.267	8.470	7.600	108,77	111,45%
	SAU beneficiarie (ha)	91.528	92.634	90.000	101,69%	102,93%
Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2)	Numero di aziende beneficiarie	0	7.416	7.416	0%	100%
Health Check (cfr. tabelle G3.HC)	Numero di aziende beneficiarie	Misura non attivata ai sensi dell'HC				
	SAU beneficiarie (ha)					

⁹ Breve nota metodologica:

I dati riportati nelle tabelle relative alle misure 211 e 214 si riferiscono solamente a nuove domande ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005.

La sovrapposizione nello stesso anno solare di liquidazioni relative a campagne diverse (anticipo relativo alla campagna 2013, saldo relativo alla campagna 2012), se da un punto di vista politico-amministrativo è da ritenersi un risultato positivo, da quello meramente burocratico genera una maggiore difficoltà nella compilazione delle tabelle di monitoraggio.

Affinché i dati statistici possano avere piena aderenza con la realtà, per poter permettere di comprendere gli aspetti essenziali della programmazione, i criteri di compilazione delle tabelle, soprattutto dei dati fisici relativi alle misure a superficie, devono essere ben chiari. In caso di una logica di compilazione cumulativa, per le misure 211 e 214, in virtù di quanto liquidato, esiste il rischio di una sovra-quantificazione dei beneficiari e della superficie a premio, con cifre che possono superare anche il dato della SAU provinciale.

La problematica è stata affrontata anche dai servizi della CE, che ha chiarito i criteri di compilazione delle tabelle di output per le misure a superficie dell'asse 2 nel documento "APR2008: Main anomalies identified in the Output tables [EEN 15th March 2010]".

Per la misura 214 sono quindi stati adottati i criteri di compilazione chiariti dalla Commissione, dando alle tabelle G3, O214(1) e O214(2) una logica incrementale per quanto riguarda il numero delle domande, il numero dei contratti e la superficie a premio. Una logica additiva è stata adottata invece per gli importi liquidati, che considerano il totale liquidato per contratto a partire dalla prima campagna 2007.

Per la compilazione delle tabelle relative alla misura 211, misura per la quale le domande di adesione sono annuali, sono state comunque adottate le stesse logiche. Per l'anno solare 2013 è stata calcolata la somma incrementale delle domande 211 e della superficie a premio liquidate. Una logica additiva è stata adottata invece per gli importi liquidati, che considerano il totale liquidato per contratto a partire dalla prima campagna 2007. Per rendere comprensibili e coerenti i risultati dell'anno rispetto alle previsioni, sono stati presi in considerazione i dati di tutte le domande del 2013, indipendentemente dal capitolo di spesa utilizzato per la loro liquidazione: (cofinanziamento ordinario e finanziamento supplementare provinciale Top Up). Si segnala che dividendo la spesa totale di sei anni per la superficie incrementale raggiunta al settimo anno il premio per ettaro liquidato è sovrastimato rispetto al dato reale.

La misura contribuisce alla riduzione della marginalizzazione dell'attività agricola su tutta la superficie coinvolta, pari a 332.545 ettari (47.506 ettari in sette anni).

Infine, per quanto riguarda l'indicatore "cambiamenti climatici" il dato medio annuo per la misura 211 è stato calcolato per cinque anni (dal 2009 al 2013) e cioè per il periodo successivo all'introduzione dell'indennità compensativa tra le misure con un impatto su questo indicatore. La misura 211 ha permesso di raggiungere un'estensione territoriale complessiva di 115.488 ettari in cinque anni, pari a 23.097 ettari circa l'anno: il dato corrisponde al 125% delle previsioni. Gli effetti positivi della misura 211 in termini di lotta ai cambiamenti climatici si possono stimare nel 37% circa di tutta la superficie interessata.

Tabella O211:

La tabella O211, relativa all'indennità compensativa ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005, comprende le liquidazioni per la nuova misura dei sette anni effettuate con i fondi cofinanziati ordinari e la superficie complessiva a premio indipendentemente dal capitolo di spesa utilizzato per la liquidazione delle domande. Se agli importi cofinanziati di € 51.511.104,04 sommiamo la parte provinciale top up di € 68.837.620,15 otteniamo una spesa complessiva di € 120.348.724,19. Rispetto al pagato complessivo il premio medio per ettaro risulta pari a 209 €: rispetto ai dati medi degli anni precedenti l'importo medio per ettaro è aumentato, ma non raggiunge la soglia massima stabilita dal Reg. (CE) 1698/2005. Il dato medio per singola azienda si attesta a 2.317 €. Con l'incremento della dotazione finanziaria per la campagna 2009 il premio medio per ettaro è aumentato, ma non si avvicina ancora al valore massimo di 250 €/ha: il premio pagato è pari al 83% del limite comunitario.

Misura 214 (Articolo 36 (a) (iv)): Pagamenti agroambientali

Obiettivi in sintesi:

Tutelare e diffondere sistemi agroforestali ad alto valore naturale; conservare la biodiversità limitando l'erosione genetica; tutelare dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo le risorse idriche superficiali e profonde; tutelare il territorio e conservare la fertilità del suolo; recepire la nuova sfida "Lotta ai cambiamenti climatici" nell'ambito del Health Check riducendo i gas serra e sequestrando il carbonio attraverso l'assorbimento del carbonio da parte delle formazioni erbose permanenti favorito da pratiche agronomiche tradizionali e da un'estensivizzazione dell'allevamento.

Piano finanziario in sintesi:

	costo totale (inclusi i trasci- namenti)	spesa pubblica totale	QUOTA FEASR	QUOTA STATO	QUOTA BOLZANO	spesa pri- vata
TOTALE	142.344.897	142.344.897	64.848.789	77.496.108	-	-

Aiuti di stato supplementari (Top Up):

È previsto un finanziamento supplementare con fondi provinciali. L'importo supplementare a carico della Provincia Autonoma di Bolzano è di 10.000.000,00 €.


Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti):

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006): € 8.100.000,00

Spesa pubblica totale: € 18.409.090,91

Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro):


Misura 214 - Pagamenti agroambien- tali	Spesa pubblica (FEASR) - Anno 2013	Spesa pubblica - Pagamenti cu- mulativi dal 2007 all'anno 2013		Spesa pubblica program- mata 2007 - 2013		Esecuzione fi- nanziaria del PSR
		FEASR	TOTALE	Di cui FEASR	TOTALE	
Ordinario	6.605,72	53.299,38	121.135,06	56.534,79	128.488,23	94,27%
Health Check	2.110,10	7.661,21	12.768,67	8.314	13.856,67	92,15%

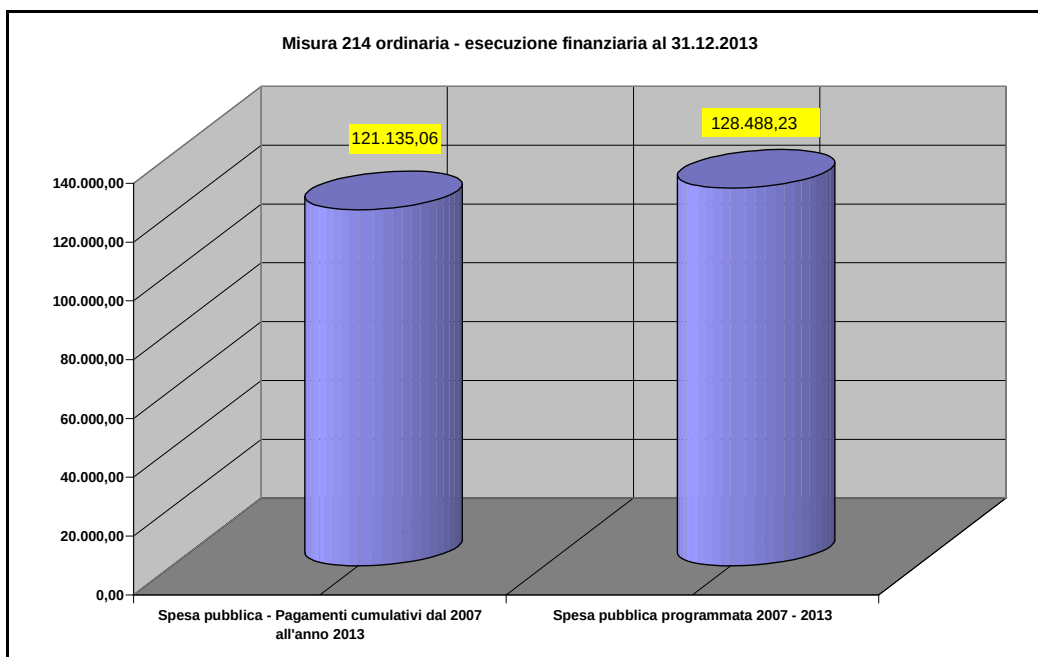

Risorse ordinarie: per i premi agroambientali la spesa 2013 è risultata pari a € 15.012.995,04 € (il 100% per nuove domande), corrispondente ad una quota comunitaria pari a 6.605.717,84€. Come per la misura 211, sono stati liquidati il saldo del premio relativo alla campagna 2012 e l'anticipo relativo alla campagna 2013.

Per la misura 214 la spesa relativa ai sei anni di programma è pari a € 121.135.064,65 €, pari all'94,27% delle previsioni. Di tale importo, € 102.888.109,45 € si riferiscono a nuove domande, mentre 18.246.955,20 € sono relativi alle domande del 2006 (trascinamenti del vecchio PSR).


Si sottolinea come per questa misura la Provincia Autonoma di Bolzano intenda applicare le norme comunitarie previste dagli articoli 1 e 3 del Reg. (UE) n. 1310/2013 nella gestione della transizione del sostegno allo Sviluppo Rurale nell'anno 2014.

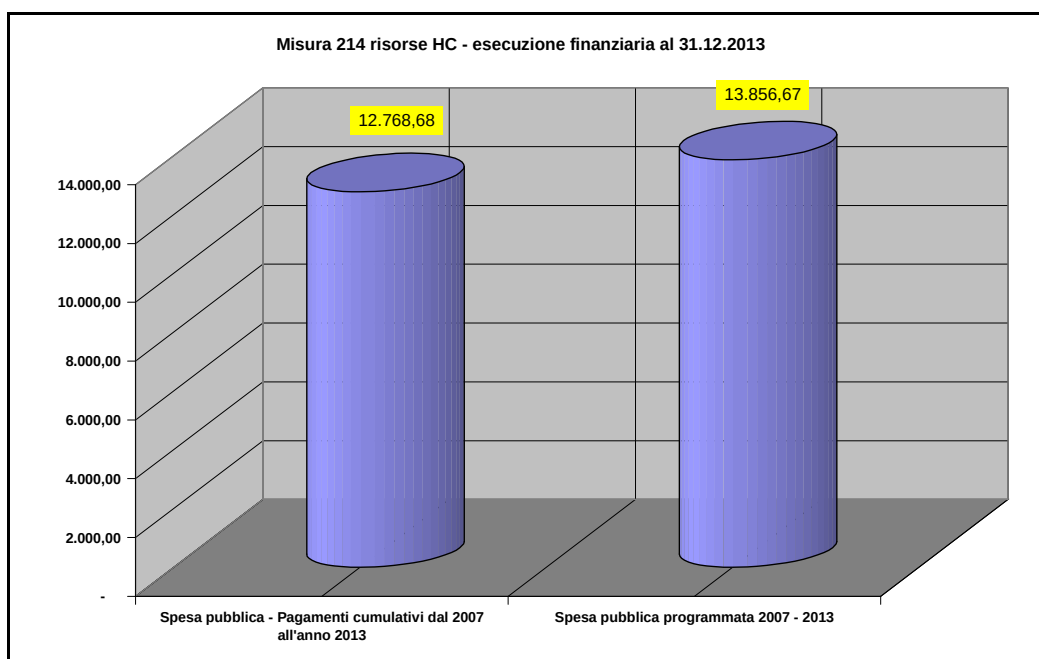

Risorse Health Check: 2.137 delle domande del 2013, in particolare parte di quelle relative all'intervento 214-1 (Colture foraggere), sono state liquidate con fondi addizionali Health Check. A causa del numero superiore alle previsioni di domande pervenute e liquidate ai sensi dei diversi interventi della 214, le risorse "ordinarie" da destinare all'intervento 214-1 (il più importante del PSR) non sarebbero state sufficienti da sole a garantire il completamento degli impegni per il periodo di programmazione fino a tutto il 2013. Per questo motivo è stata presa la decisione di utilizzare una parte rilevante dei fondi HC per potenziare la dotazione finanziaria dell'intervento 214-1.

Con la campagna 2013 sono pertanto continuate le liquidazioni delle domande della misura 214, intervento 1, con i fondi HC. Ciò permetterà di rispondere in maniera adeguata alle richieste pervenute, mantenendo forte e variegato l'impatto del PSR dal punto di vista agro-ambientale fino alla sua conclusione.

Nel corso del 2013 sono state effettuate liquidazioni di risorse Health Check per un importo pari a € 3.516.839,91 €, a cui corrisponde una quota comunitaria di 2.110.103,94 €. Il tasso di utilizzo è pari al 92,15% della disponibilità in programma.

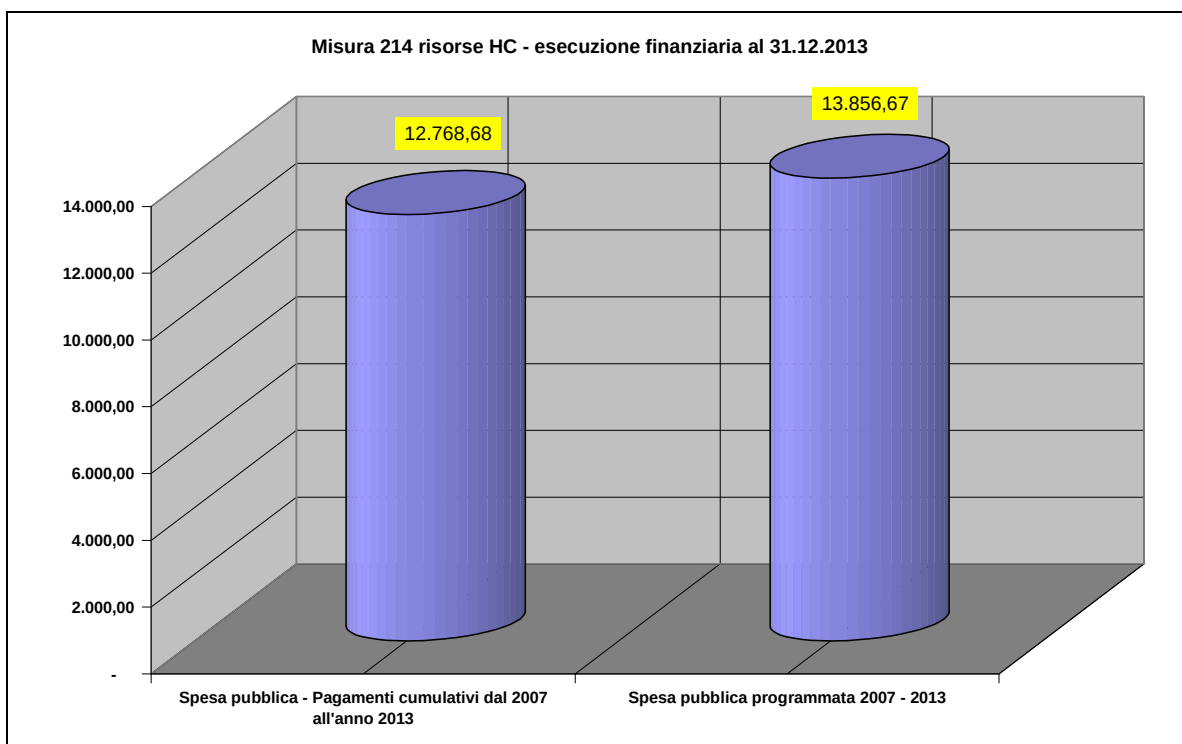

Anche per il 2013 è stato possibile erogare premi nello stesso anno della campagna di riferimento. La liquidazione regolare e tempestiva degli aiuti a superficie consente di onorare gli impegni assunti dall'Amministrazione provinciale con il mondo agricolo.

L'Amministrazione provinciale ha investito molto in termini economici, organizzativi ed informatici implementando un sistema in grado di gestire i premi a superficie in maniera efficiente quanto rigorosa e rispettosa delle norme comunitarie. È stata creata un'Anagrafe provinciale delle Imprese Agricole (APIA), una banca dati territoriale delle imprese agricole (Geolafis-SITI); attraverso un software prodotto specificatamente (PSR), la raccolta annuale delle domande presuppone la loro compilazione sulla base dei dati territoriali contenuti nelle banche dati ufficiali; un secondo software (EFIN) si occupa di gestire la fase dell'istruttoria verificando i dati delle domande in maniera automatizzata; viene eseguito un costante rilevamento delle superfici agricole da parte del Corpo Forestale provinciale, che aggiorna ogni anno le banche dati provinciali in funzione di tutte le variazioni che si verificano a livello aziendale; l'istituzione dell'Organismo Pagatore provinciale si inserisce in questa logica ed ha contribuito alla riduzione dei tempi di liquidazione dei premi a superficie.

L'obiettivo è proseguire con questa tempistica e di stabilizzare nel tempo il sistema complessivo dei premi a superficie. Deve essere offerta agli agricoltori la certezza nei tempi di liquidazione dei premi per evitare una riduzione delle adesioni che avrebbe un impatto non trascurabile sul territorio e sull'ambiente.

Stato di attuazione fisico¹¹:

Misura 214 - Pagamenti agroam- bientali	Indicatori di prodotto	Realizzata nell'anno 2013	Totale rea- lizzato - Va- lore cumula- tivo dal 2007 all'anno 2013	Obiettivi 2007-2013	Tasso di esecu- zione del PSR - anno 2013	Tasso di esecu- zione cumulato del PSR
Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1)	Numero di aziende beneficiarie	7.982	9.982	9.000	88,7%	110,9%
	Superficie complessivamente inte- ressata dall'aiuto (ha)	148.874	167.784	160.000	93%	104,8%
	Superficie fisica interessata dal so- stegno (ha)	148.874	167.784	160.000	93%	104,8%
	Numero di contratti	10.753	14.478	9.000	119,5%	160,8%
Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2)	Numero di aziende beneficiarie	0	7.416	7.416	0%	100%
Health Check (cfr. tabelle G3.HC)	Numero di aziende beneficiarie (*)	2.173	2.622	2.000	108,6%	131%
	Superficie complessivamente inte- ressata dall'aiuto (ha) (*)	12.226,75	16.212,44	20.000	61,1%	81%
	Superficie fisica interessata dal so- stegno (ha) (*)	12.226,75	16.212,44	20.000	61,1%	81%
	Numero di contratti (*)	2.173	2.622	2.000	108,6%	131%

(*) I dati in tabella relativi alle risorse ordinarie sono riferibili alla totalità delle aziende e della superficie interessate dagli aiuti liquidati nel 2013. Alla voce risorse Health Check sono riportati i dati relativi alla parte delle domande del 2013 (2.173) liquidate con le risorse previste per le nuove sfide.

Risorse ordinarie: le aziende che hanno aderito agli impegni agroambientali e che hanno beneficiato di una liquidazione nel corso del 2013 ammontano complessivamente a 7.982. Considerando invece il valore incrementale cumulativo realizzato nel periodo 2007-2013, le aziende presenti sul territorio provinciale che hanno percepito un premio agroambientale sono complessivamente 9.982, pari al 111% dell'obiettivo previsto (9.000 aziende beneficiarie sotto contratto).

La superficie complessivamente interessata dall'aiuto nel corso del 2013 ammonta a 148.874 ettari, mentre il dato incrementale del PSR dal 2007 raggiunge il valore di 167.784 ettari, pari al 104,8% delle previsioni.

Il dato della superficie complessivamente interessata coincide con la superficie fisica delle aziende, dal momento che ai sensi del PSR una medesima superficie può beneficiare di un unico premio.

¹¹ Breve nota metodologica:

I dati riportati in tabella relativi alle misure 211 e 214 si riferiscono solamente a nuove domande ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005.

La sovrapposizione nello stesso anno solare di liquidazioni relative a campagne diverse, se da un punto di vista politico-amministrativo è da ritenersi un risultato straordinario, genera dal punto di vista meramente burocratico una certa difficoltà nella compilazione delle tabelle di monitoraggio.

Affinché i dati statistici possano avere piena aderenza con la realtà, per poter permettere di comprendere gli aspetti essenziali della programmazione, i criteri di compilazione delle tabelle, soprattutto dei dati fisici relativi alle misure a superficie, devono essere ben chiari. In caso di una logica di compilazione cumulativa, in particolare per la misura 214 (in cui vigono impegni quinquennali da rispettare), in virtù di quanto liquidato, esiste il rischio di una sovra-quantificazione dei beneficiari e della superficie a premio, con cifre che possono superare anche il dato della SAU provinciale.

La problematica è stata affrontata anche dai servizi della CE, che ha chiarito i criteri di compilazione delle tabelle di output per le misure a superficie dell'asse 2 nel documento "APR2008: Main anomalies identified in the Output tables [EEN 15th March 2010]".

Sono quindi stati adottati i criteri di compilazione chiariti dalla Commissione, dando alle tabelle G3, O214(1) e O214(2) una logica incrementale per quanto riguarda il numero delle domande, il numero dei contratti e la superficie a premio. Una logica additiva è stata adottata invece per gli importi liquidati, che considerano il totale liquidato per contratto a partire dalla prima campagna 2007.

Diverse sono le considerazioni fatte per la compilazione delle tabelle relative alla misura 211, misura per la quale le domande di adesione sono annuali. Per l'anno solare 2013 è stata calcolata la somma delle domande 211 e della superficie a premio liquidate. Per rendere comprensibili e coerenti i risultati dell'anno rispetto alle previsioni, sono stati presi in considerazione i dati di tutte le domande del 2013, indipendentemente dal capitolo di spesa utilizzato per la loro liquidazione: (cofinanziamento ordinario e finanziamento supplementare provinciale Top Up).

I contratti liquidati nel 2013 ammontano a 10.753, mentre il valore incrementale 2007-2013 raggiunge il valore di 14.478. Un agricoltore può aderire con la stessa domanda a più interventi e quindi il numero dei contratti è sempre superiore al numero delle aziende. Inoltre, si puntualizza come un beneficiario possa sottoscrivere più domande qualora decida di aggiungere nuovi contratti per interventi aggiuntivi. Infatti il numero complessivo incrementale dei contratti sottoscritti raggiunge il risultato di 14.478. Vista la moltiplicazione dei contratti e degli interventi all'interno di una domanda o con più domande il dato previsionale di 9.000 contratti appare sottostimato e non tenere conto della reale procedura di adesione alla misura 214.

Premesso quanto chiarito a commento della tabella con i dati finanziari, i dati fisici afferenti alle risorse Health Check vedono nel corso del 2013 liquidazioni per 2.173 aziende, per le quali è stato liquidato il premio per l'intervento 214-1; la superficie interessata dalla liquidazione è pari a 12.226,75 ettari. In questo caso il numero di contratti coincide. In percentuale, le aziende numericamente superano leggermente le previsioni, mentre la superficie a premio si attesta sul 81%.

I dati evidenziano, così come per la misura 211, una costante aderenza agli interventi agroambientali da parte degli agricoltori: non sono ravvisabili fenomeni di abbandono o di rinuncia significativi e complessivamente confermano il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Nell'anno 2013 gran parte dei richiedenti hanno prolungato i contratti sottoscritti nel 2007 e scaduti alle fine dell'anno 2011; con i due anni di proroga l'Amministrazione provinciale prosegue con le misure agroambientali anche nel 2012 e 2013, completando i sette anni di programmazione con questi impegni.

Dalla superficie complessiva a premio emerge ancora una volta l'importanza della misura 214, che, in combinazione con la misura 211, rappresenta il cuore dello Sviluppo Rurale delle zone di montagna. Ciò è evidente, non solo considerando il numero di aziende aderenti e la superficie sotto contratto, ma anche considerando gli aspetti finanziari: le liquidazioni 2007-2013 per le due misure 211 e 214 rappresentano circa il 75% del totale liquidato per tutto il PSR.

Risultato:

Misura 214 - Pagamenti agroambientali	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2007 all'anno 2013	Totale realizzato - Valore medio annuo 2007 - 2013 (**)	Obiettivi 2007-2013 (per anno)	Tasso di esecuzione del PSR - anno 2013	Tasso di esecuzione cumulato del PSR
(R6) Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo:						
- Biodiversità	4.652	31.595	4.514	5.000	93%	90,3%
- Qualità dell'acqua	55.828	375.233	53.604	60.000	93%	89,3%
- Cambiamento climatico (**)	32.566	193.821	38.764	35.000	93%	110,7%
- Qualità del suolo	55.827	410.389	58.627	60.000	93%	97,7%

(**) il dato medio annuo viene calcolato su cinque anni

Per la misura 214 è possibile stimare un effetto positivo sulla biodiversità per un'estensione territoriale pari a 31.595 ettari in sei anni (4.514 ettari di media): il contributo del 2013 della misura 214 al raggiungimento dell'obiettivo biodiversità è pari al 93% delle previsioni,

mentre rispetto alla previsione per anno di 5.000 ettari, il dato medio annuo evidenzia il raggiungimento di un valore vicino all'90%.

Per l'obiettivo "qualità dell'acqua" il dato complessivo è pari a 375.233 ettari (53.604 ettari per anno): il dato medio annuo evidenzia il raggiungimento di un valore pari all'89,3% delle previsioni.

Obiettivo "cambiamento climatico": la superficie mediamente interessata dalla misura 214 è pari a circa 38.764 ettari in sei anni, per un valore percentuale pari al 111% delle previsioni. Gli effetti positivi della misura 214 in termini di miglioramento della qualità del suolo, infine, si possono stimare nel 98% delle previsioni, con circa 58.627 ettari medi annui sotto contratto.

Tabella O214:

La tabella seguente¹² sintetizza i principali dati di esecuzione relativamente ai contratti dei diversi interventi della misura 214 ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005. Da questi dati è possibile evidenziare il peso di ciascun intervento in termini di estensione territoriale, di aziende aderenti, di livello di premi per ettaro e per beneficiario.

Intervento	Superficie	%	UBA	Contratti	%	Spesa pubblica (milioni €) cumulata	%
214-1: Estensivizzazione produzione animale (3.c)	42.462,68	25,31%		6.964	48,10%	52.639,25	51,16%
214-2: Mantenimento razze locali a rischio (10.a)	12.642,78	7,54%	12.165,4	1.646	11,37%	8.670,12	8,43%
214-3: Protezione varietà vegetali rare minacciate di erosione genetica (10.b)	73,64	0,04%		64	0,44%	64,29	0,06%
214-4: Gestione di altri habitat agricoli di alto pregio naturale (vigneti) (8.c)	860,64	0,51%		840	5,80%	3.377,22	3,28%
214-5: Agricoltura biologica (1.)	3.386,09	2,05%		711	4,91%	12.082,72	11,74%
214-6: Gestione e creazione di pascoli (8.b)	101.110,02	60,26%		1.236	8,54%	13.648,92	13,27%
214-7a: Mantenimento di caratteristiche ecologiche (7.)	1.658,14	0,99%		713	4,92%	2.157,49	2,10%
214-7b: Mantenimento di habitat agricoli di alto pregio naturale (8.a)	5590	3,33%		2304	15,91%	10.248,06	9,96%
Totale	167.783,99	100,00%	12.165,4	14.478	100,00%	102.888,1	100,00%

Per tutta la misura 214, la superficie a premio è complessivamente pari a 167.783,99 ettari: circa l'86% della SAU provinciale destinata a prati permanenti e pascoli (143.000 ettari). Il dato è molto importante ed evidenzia, assieme al valore complessivo dei premi erogati (102,888 milioni di € soltanto per contratti nuovi al netto dei trascinamenti), l'importanza politica ed amministrativa delle misure agroambientali in Provincia Autonoma di Bolzano. Preponderanti sono, in termini di superficie interessata, l'intervento 214-1 (estensivizzazione produzione animale) e 214-6 (gestione e creazione di pascoli): essi riguardano l'85,56% di tutta la superficie a premio. L'intervento 214-6 da solo coinvolge il 60,26% di tutta la superficie a premio, visto che considera le grandi distese degli alpeggi di montagna della Provincia.

I due interventi citati interessano il 56,63% dei contratti ed il 64,42% di tutta la spesa pubblica liquidata. Circa la metà dei contratti riguarda solamente l'intervento 214-1. Importante

¹² Si veda anche la nota 1 circa la logica metodologica di compilazione delle tabelle relative alle misure pluriennali a superficie.

risulta essere anche l'intervento 214-2 (mantenimento razze locali a rischio), con il 7,54% della superficie, l'11,37% dei contratti e l'8,43% della spesa pubblica.

Anche l'intervento 214-7 (mantenimento di caratteristiche ecologiche + mantenimento di habitat agricoli di alto pregio naturale) emerge positivamente: sia pur con solo il 4,32% della superficie a premio, esso raccoglie il 20,83% dei contratti e ben il 12,06% della spesa. L'intervento interviene sulle superfici che possiedono elevate caratteristiche qualitative in termini di biodiversità e di specie vegetali/animali.

L'intervento 214-5 (agricoltura biologica) ha assunto un'importanza sempre crescente: con soltanto il 2,05% della superficie a premio, è in grado di erogare l'11,74% di tutta la spesa pubblica per i premi agroambientali attivando il 4,91% di tutti i contratti. Più limitati sono i restanti interventi 214-4 (vigneti) e soprattutto 214-3 (varietà vegetali minacciate).

Appare importante evidenziare i valori medi dei premi dei singoli interventi per contratto e per ettaro:

Intervento	Premio medio per ettaro (€)	Premio medio per contratto (€)
214-1: Estensivizzazione produzione animale (3.c)	274	1.798
214-2: Mantenimento razze locali a rischio (10.a)	96/ha (120 €/UBA)	998
214-3: Protezione varietà vegetali rare minacciate di erosione genetica (10.b)	243	291
214-4: Gestione di altri habitat agricoli di alto pregio naturale (vigneti) (8.c)	711	1002
214-5: Agricoltura biologica (1.)	603	3.270
214-6: Gestione e creazione di pascoli (8.b)	24	1.557
214-7a: Mantenimento di caratteristiche ecologiche (7.)	322	363
214-7b: Mantenimento di habitat agricoli di alto pregio naturale (8.a)	536	1.342

Il premio medio per contratto più elevato viene garantito dall'intervento dell'agricoltura biologica (214-5), con un dato medio di 3.270 €. Segue l'intervento 214-1 con 1.798 € seguito a sua volta dalla gestione dell'alpeggio, con 1.557 €.

I due interventi che coinvolgono la maggior superficie a premio (214-1 e 214-6) hanno valori ad ettaro rispettivamente di 274 €/ha e di 24 €/ha. Considerando che per l'estensivizzazione della produzione animale (214-1) il premio annuo per ettaro massimo approvato dalla CE è pari a 450 €/ha, il dato medio liquidato finora risulta inferiore al valore massimo possibile.

Bassissimo è soprattutto il premio medio per ettaro relativo alla gestione dei pascoli alpini: solamente le grandi estensioni degli alpeggi consentono di garantire un premio per azienda o interessenza sufficientemente adeguato. Per i vigneti il premio ad ettaro è quello più elevato, con 711 €; il dato per azienda si attesta peraltro intorno ai 1.000 €, in virtù della ridotta superficie media a premio che è pari a 1,4 ettari. Per l'agricoltura biologica il dato per ettaro è pari a 602 €.

Tabella H214:

Priorità	Intervento	Superficie	Contratti	Spesa pubblica (€) cumulata
Adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti	214-1: Estensivizzazione dell'allevamento (p. es., riduzione della densità di carico) e gestione delle formazioni erbose	16.212,44	2.622	12.76.676,71

Risorse Health Check: al 31.12.2013 sono stati liquidati con fondi addizionali Health Check 2.622 contratti per l'intervento 214-1 (Colture foraggere), per una superficie complessiva di 16.212,44 ettari ed una spesa pubblica cumulata pari a 12.76.676,71 €. Questo dato sottolinea la necessità di destinare una gran parte dei fondi Health Check alla misura 214 e garantisce nello stesso momento la copertura finanziaria della misura nel suo complesso visto che le richieste sono costantemente alte.

Misura 226 Articolo 36, (b), (vi): Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi

Obiettivi in sintesi:

Ricostituire ecosistemi silvo-pastorali caratterizzati da degrado e fenomeni erosivi e di frammentazione conseguenti a disastri naturali e attuare idonei interventi preventivi; mantenere e migliorare le prestazioni protettive dei boschi in aree a rischio calamità nell'intero ambiente rurale.

Piano finanziario in sintesi:

	costo totale (inclusi i trascinamenti)	spesa pubblica totale	QUOTA FEASR	QUOTA NAZIONALE	spesa privata
TOTALE	2.591.974	2.591.974	1.140.468	1.451.506	-

Aiuti di stato supplementari (Top Up):


Non saranno utilizzati fondi supplementari della Provincia Autonoma di Bolzano.

Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti):

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006: € 580.000,00
 Spesa pubblica totale: € 1.318.181,82

Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro):

Misura 226 - Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi	Spesa pubblica (FEASR) - Anno 2013	Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi dal 2007 all'anno 2013		Spesa pubblica programmata 2007 - 2013		Esecuzione finanziaria del PSR
		FEASR	TOTALE	Di cui FEASR	TOTALE	
Ordinario	0	1.137,56	2.585,35	1.140,47	2.591,97	99,7%
Health Check	Misura non attivata ai sensi dell'HC					

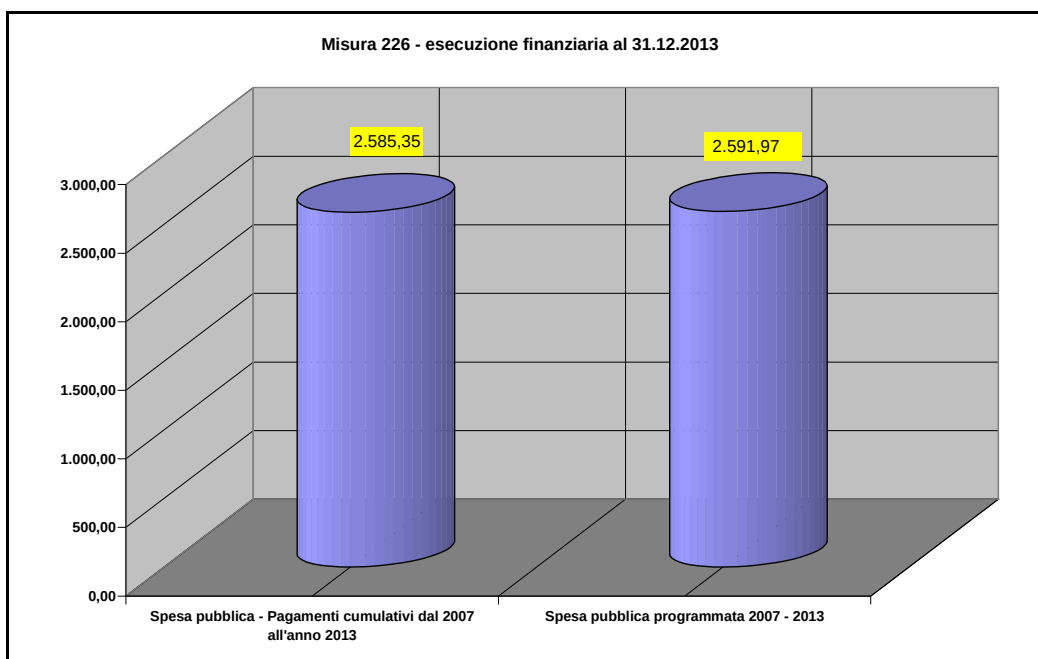

Non sono state effettuate liquidazioni per la misura 226 nel corso del 2013. Il tasso di realizzazione finanziaria della misura è pari al 99,7% delle previsioni, con una spesa pubblica liquidata pari a 2,585 milioni di €. Le risorse assegnate alla misura sono state utilizzate pressoché totalmente.

Stato di attuazione fisico:

Misura 226 - Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi	Indicatori di prodotto	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2007 all'anno 2013	Obiettivi 2007-2013	Tasso di esecuzione del PSR - anno 2013	Tasso di esecuzione cumulato del PSR
Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1)	Numero di azioni sovvenzionate	0	41	30	0%	137%
Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2)	Numero di azioni sovvenzionate	0	22	22	0%	100%
Health Check (cfr. tabelle G3.HC)	Numero di azioni sovvenzionate	Misura non attivata ai sensi dell'HC				

Nel 2013 per la misura 226 non sono state liquidate nuove domande. Il tasso di esecuzione della misura, rispetto alle azioni sovvenzionate, è pari all'137% del totale.

Per la misura 226 nel 2013 non sono state liquidate domande relative a trascinamenti.

Risultato:

Misura 226 - Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2007 all'anno 2013	Totale realizzato - Valore medio annuo 2007 - 2013	Obiettivi 2007-2013 (per anno)	Tasso di esecuzione del PSR - anno 2013	Tasso di esecuzione cumulato del PSR
(R6) Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo:						
- Cambiamento climatico	0	132,87	18,98	357	0%	5,32%
- Qualità del suolo	0	26,42	3,77	71	0%	5,30%

Per la misura 226 è possibile stimare un effetto positivo sui cambiamenti climatici per un'estensione territoriale media annua di 18,98 ettari: rispetto alla previsione per anno, il dato evidenzia il raggiungimento di un valore pari al 5,32%.

Per l'obiettivo "qualità del suolo" il dato complessivo medio annuo è pari a 3,77 ettari: evidenzia quindi il raggiungimento di un valore pari al 5,30% delle previsioni.

Tabella O226:

Per la misura 226 sono state finanziate complessivamente 25 domande relative a 41 azioni riguardanti la realizzazione di opere di protezione dalle valanghe combinate con rimboschimenti. Gli ettari interessati sono in tutto 120, di cui 85 (71%) su terreni forestali di proprietà pubblica.

Misura 227 Articolo 36, (b), (vii): Sostegno agli investimenti non produttivi

Obiettivi in sintesi:

Migliorare la situazione complessiva dei castagneti come habitat colturali di grande pregio ambientale/paesaggistico; fermare lo sviluppo negativo di degrado dei castagneti ed un tasso di mortalità dei castagni troppo alto negli ultimi anni; evitare nuovi attacchi del cancro del castagno, creando a medio termine castagneti vitali e stabili; considerare la tutela del paesaggio ed ambiente (quadro paesaggistico unico, habitat particolari), del turismo e della popolazione (specialità culinaria e ricreazione) tramite un concetto integrale per i castagneti.

Piano finanziario in sintesi:

	costo totale (inclusi i trascinamenti)	spesa pubblica totale	QUOTA FEASR	QUOTA NAZIONALE	spesa privata
TOTALE	463.731	370.985	163.233	207.752	- 92.746

Aiuti di stato supplementari (Top Up):

Non saranno utilizzati fondi supplementari della Provincia Autonoma di Bolzano.

Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti):


Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006): € 9.233,00

Spesa pubblica totale: € 20.984,09

Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro):

Misura 227 - Sostegno agli investimenti non produttivi	Spesa pubblica (FEASR) - Anno 2013	Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi dal 2007 all'anno 2013		Spesa pubblica programmata 2007 - 2013		Esecuzione finanziaria del PSR
		FEASR	TOTALE	Di cui FEASR	TOTALE	
Ordinario	15,04	91,57	208,124	163,23	370,99	56,1%
Health Check	Misura non attivata ai sensi dell'HC					

La spesa pubblica liquidata per la misura 227 nel corso del 2013 ammonta a 34.181,40 € (la corrispondente quota FEASR è di 15.039,82 €). Finora il tasso di realizzazione finanziaria della misura è giunto al 56,1% delle previsioni, con una spesa pubblica liquidata pari a 0,208 milioni di €.

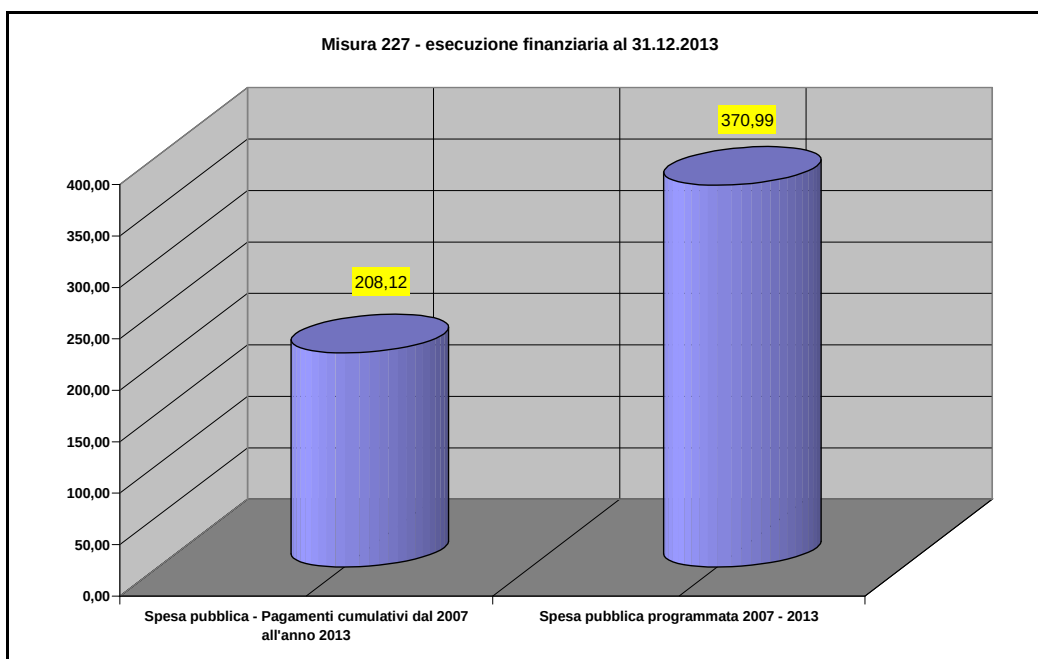

Stato di attuazione fisico:

Misura 227 - Sostegno agli investimenti non produttivi	Indicatori di prodotto	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2007 all'anno 2013	Obiettivi 2007-2013	Tasso di esecuzione del PSR - anno 2013	Tasso di esecuzione cumulato del PSR
Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1)	Numero di proprietari di foreste beneficiari	4	15	24	16,7%	63%
	Volume totale di investimenti (000 euro)	42,73	241,95	438,00	9,7%	55%
Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2)	Numero di azioni sovvenzionate	0	1	1	0%	100%
Health Check (cfr. tabelle G3.HC)	Numero di proprietari di foreste beneficiari	Misura non attivata ai sensi dell'HC				
	Volume totale di investimenti (000 euro)					

Nel 2013 per la misura 227 sono state liquidate 4 domande nuove. Il tasso di esecuzione della misura, rispetto alle domande sovvenzionate, è pari al 63% del totale. Il volume totale degli investimenti finanziati è di 0,242 milioni di €, pari al 55% delle previsioni. Per la misura 227 nel 2013 non sono state liquidate domande relative a trascinamenti.

Risultato:

Misura 227 - Sostegno agli investimenti non produttivi	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2007 all'anno 2013	Totale realizzato - Valore medio annuo 2007 - 2013	Obiettivi 2007-2013 (per anno)	Tasso di esecuzione del PSR - anno 2013	Tasso di esecuzione cumulato del PSR
(R6) Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo:						
- Biodiversità	15	100	14	300	5%	4,7%

Per la misura 227 è possibile stimare un effetto positivo sulla biodiversità per un'estensione territoriale di 15 ettari nel 2013: rispetto alla previsione per anno, il dato medio annuo evidenzia il raggiungimento di un valore pari al 4,7%.

Asse 3:

Misura 311 Articolo 52 (a) (i): Diversificazione verso attività non agricole

Obiettivi in sintesi:

Diversificare le attività nell'azienda, sostenendo investimenti per la costruzione, il risanamento e l'ampliamento di camere per l'alloggiamento di ospiti con annessi servizi igienico-sanitari, di appartamenti per ferie; di ristoranti di campagna e per la somministrazione di pasti e bevande.

Piano finanziario in sintesi:

	costo totale (inclusi i trascinamenti)	spesa pubblica totale	QUOTA FEASR	QUOTA NAZIONALE	spesa privata
TOTALE	15.078.222	6.785.200	2.985.488	3.799.712	8.293.022

Aiuti di stato supplementari (Top Up):

Non saranno utilizzati fondi supplementari della Provincia Autonoma di Bolzano.


Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti):

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006): € 15.488,00

Spesa pubblica totale: € 35.200,00

Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro):

Misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole	Spesa pubblica (FEASR) - Anno 2013	Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi dal 2007 all'anno 2013		Spesa pubblica programmata 2007 - 2013		Esecuzione finanziaria del PSR
		FEASR	TOTALE	Di cui FEASR	TOTALE	
Ordinario	301,75	2.570,86	5.842,86	2.985,49	6.785,20	86,1%
Health Check	Misura non attivata ai sensi dell'HC					

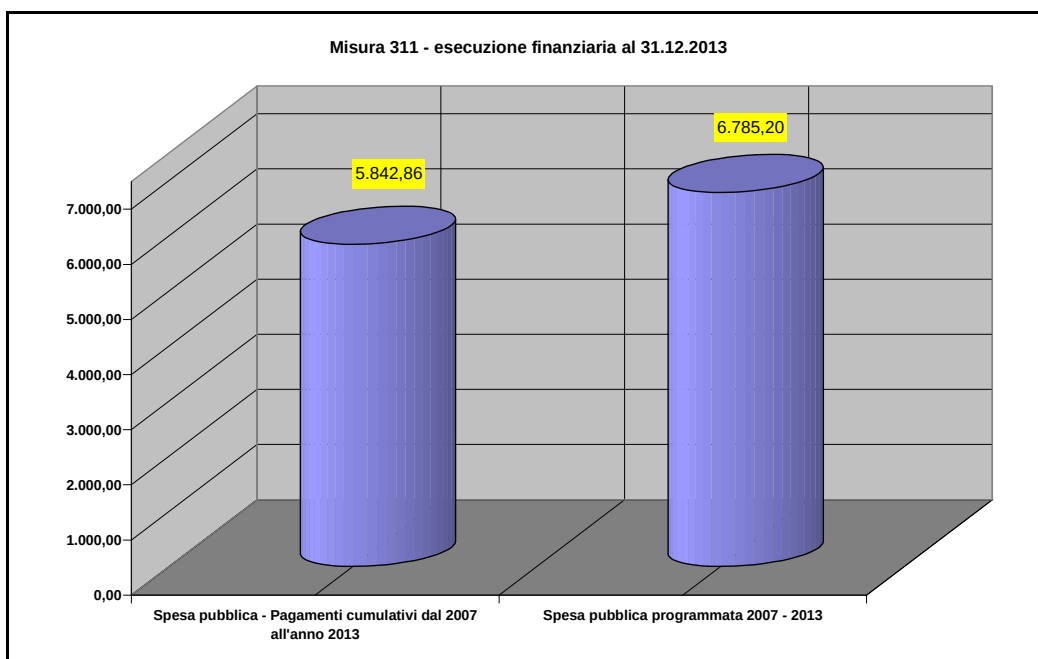

La spesa pubblica 2013 per la misura 311 (agriturismo) ammonta a 685.785,00 € (quota FEASR: 301.745,40 €). Complessivamente le spese finora sostenute ammontano a

5.842.856,60 €, il che porta il tasso d'esecuzione della misura all'86,1% delle previsioni. La misura denota un'ottima capacità di spesa e la spesa programmata verrà raggiunta senza particolari difficoltà.

Stato di attuazione fisico:

Misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole	Indicatori di prodotto	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2007 all'anno 2013	Obiettivi 2007-2013	Tasso di esecuzione del PSR - anno 2013	Tasso di esecuzione cumulato del PSR
Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1)	Numero di beneficiari	19	167	199	9,5%	84%
	Volume totale di investimenti (000 euro)	1.502,90	13.166,12	15.000,00	10,0%	88%
Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2)	Numero di azioni sovvenzionate	0	0	1	0%	0%
Health Check (cfr. tabelle G3.HC)	Numero di azioni sovvenzionate	Misura non attivata ai sensi dell'HC				

Per la misura 311 sono state liquidate complessivamente 167 domande relative ad investimenti nel settore dell'agriturismo, per un costo ammesso pari a 13,166 Meuro. In termini di domande liquidate la misura si trova all'84% delle previsioni, all'88% in termini di investimenti sostenuti.

Risultato:

Misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2007 all'anno 2013	Obiettivi 2007-2013 (per anno)	Tasso di esecuzione del PSR - anno 2012	Tasso di esecuzione cumulato del PSR
(R7) Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie ('000 EUR)	222	2.056	2.450	9,1%	84%
(R8) Numero lordo di posti di lavoro creati	2	13	15	13,3%	87%

Il valore aggiunto lordo legato agli investimenti di diversificazione verso attività non agricole stimato per le aziende a cui è stato liquidato l'aiuto previsto nel corso del 2013 è pari a 222.000 € circa. Il dato è riferito ad attività agrituristiche svolte in azienda. L'aumento complessivo 2007 – 2013 del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie corrisponde a 2.056.000 €, pari all'84% delle previsioni. Il dato medio per azienda nel periodo di programmazione è stimato in 12.300 €.

Per la misura 311 (diversificazione verso attività non agricole) è prevalente il mantenimento dei posti di lavoro della famiglia agricola attiva in azienda, che si possono quantificare in circa 330. È possibile inoltre stimare in 13 i posti di lavoro creati nelle 167 aziende finanziate nel corso del 2007-2013, dodici sono maschi ed una è femmina. Considerate le caratteristiche delle tipiche aziende agricole provinciali, a conduzione familiare, in cui i proprietari sono in gran parte piccoli coltivatori diretti che puntano a differenziare la propria attività con la realizzazione di appartamenti con i quali ospitare i turisti sul maso, è poco diffusa l'acquisizione di manodopera esterna alla famiglia.

Tabella O311:

La misura della diversificazione verso attività non agricole ha visto 167 domande liquidate, tutte nel settore dell'agriturismo; solamente due richiedenti hanno un'età inferiore ai 25 anni, 152 beneficiari (91,0%) sono di sesso maschile.

Misura 313 Articolo 52 (a) (iii): Incentivazione delle attività turistiche

Obiettivi in sintesi:

Potenziare il valore sociale e pubblico del bosco e della sua funzione ricreativa; diversificare l'economia alpica verso attività turistiche in zona LEADER; promuovere l'offerta turistica locale in zona LEADER.

Piano finanziario in sintesi:

	costo totale (inclusi i trascinamenti)	spesa pubblica totale	QUOTA FEASR	QUOTA NAZIONALE	spesa privata
TOTALE	3.187.500	2.550.000	1.122.000	1.428.000	637.500

Piano finanziario della parte LEADER:

	costo totale (inclusi i trascinamenti)	spesa pubblica totale	QUOTA FEASR	QUOTA NAZIONALE	spesa privata
TOTALE	7.579.355	6.063.484	2.667.998	3.395.486	1.515.871

Aiuti di stato supplementari (Top Up):

Non saranno utilizzati fondi supplementari della Provincia Autonoma di Bolzano.


Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti):

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006): € 0,00

Spesa pubblica totale: € 0,00

Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro):

Misura 313 - Incentivazione delle attività turistiche	Spesa pubblica (FEASR) - Anno 2013	Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi dal 2007 all'anno 2013		Spesa pubblica programmata 2007 - 2013		Esecuzione finanziaria del PSR
		FEASR	TOTALE	Di cui FEASR	TOTALE	
Ordinario	250,28	585,16	1.329,91	1.122,00	2.550,00	52,2%
Ordinario – quota parte LEADER (quota inclusa nella tabella G5-411/412/413)	574,24	1.247,10	2.834,31	2.668,00	6.063,48	46,7%
Health Check	Misura non attivata ai sensi dell'HC					

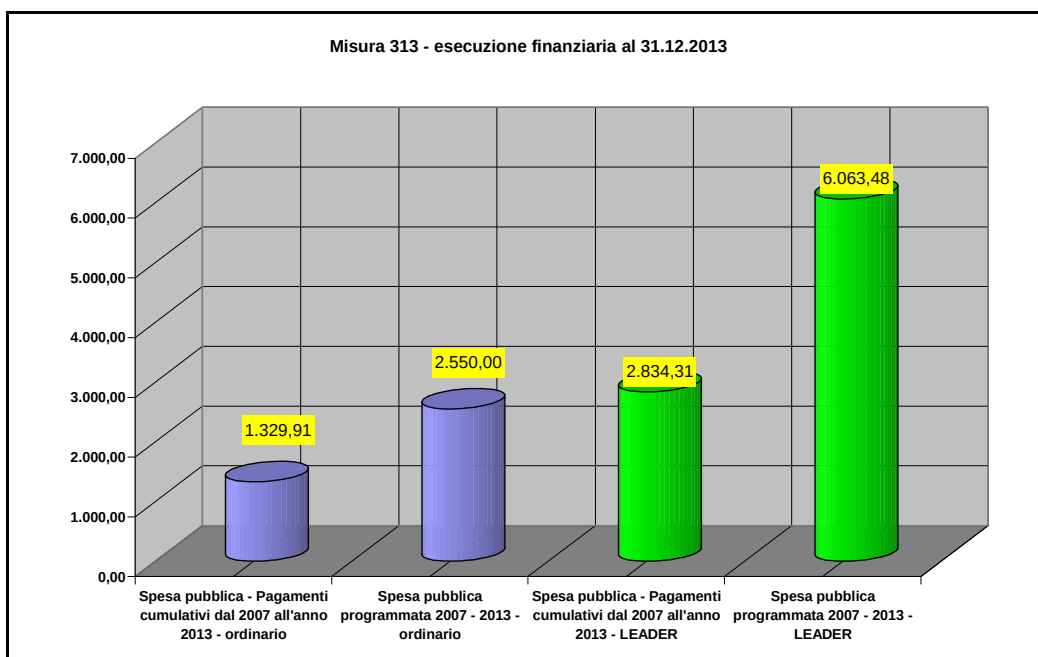

Quota ordinaria: la spesa pubblica 2013 per la misura 313 ammonta a 568.809,48 € (quota FEASR: 250.276,17 €): per questa misura proseguono le liquidazioni iniziate solo a partire dal 2010, tuttavia dal tasso d'esecuzione finanziaria registrato (52,2%) si evince che sarà necessaria un'ulteriore accelerazione della spesa per poter raggiungere gli obiettivi prefissati. Quota ordinaria – quota parte LEADER: si ritiene utile aggiungere un'informazione che le tabelle ufficiali UE non contengono se non in forma cumulata alla voce 411/412/413 della tabella G5. La spesa pubblica 2013 per la parte Leader della 313 ammonta a 1.305.092,69 € (quota FEASR: 574.240,77 €). Il tasso di esecuzione risulta pari al 46,7%, un dato basso sia pur tenendo conto del ritardato inizio delle attività dei GAL. Per poter completare la misura entro il 2015 sarà indispensabile imprimere un aumento alla velocità di rendicontazione.

Stato di attuazione fisico:

Misura 313 - Incentivazione delle attività turistiche	Indicatori di prodotto	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2007 all'anno 2013	Obiettivi 2007-2013	Tasso di esecuzione del PSR - anno 2013	Tasso di esecuzione cumulato del PSR
Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1 e O313)	Numero di nuove attività turistiche sovvenzionate	16	42	8	212,5%	537,5%
	Volume totale di investimenti (000 euro)	687,69	1.800,52	3.188	21,6%	56,5%
Risorse ordinarie (cfr. tabella O41(2) parte LEADER (quota non inclusa nella tabella G5-411/412/413)	Numero di nuove attività turistiche sovvenzionate	12	33	20	60,0%	165%
	Volume totale di investimenti (000 euro)	1.631,36	3.542,88	7.760	21,0%	45,6%
Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2)	Numero di azioni sovvenzionate	0	0	0	0%	0%
Health Check (cfr. tabelle G3.HC)	Numero di azioni sovvenzionate	Misura non attivata ai sensi dell'HC				

Quota ordinaria: per la misura 313 sono state liquidate nel 2013 16 domande, per un costo ammesso pari a 687.694,67 € (21,6% del previsto).

Si evince dalla tabella che le domande presentate, riguardanti tutte la realizzazione di infrastrutture ricreative su piccola scala, si sono rivelate estremamente più numerose rispetto alle aspettative, come evidenzia il rispettivo tasso di esecuzione cumulato (537,5%). Per un'analisi di dettaglio in merito alla quantificazione degli indicatori, si rimanda alle valutazioni espresse dal valutatore al capitolo 4, paragrafo b. La misura denota una capacità di spesa inferiore alle aspettative; le risorse da rendicontare entro il 2015 ammontano circa al 48% del budget assegnato.

Quota ordinaria – quota parte LEADER: per la parte della 413 relativa alla misura 313 i costi ammessi nel 2013 sono pari a 1.631.365,86 €, corrispondenti a 12 nuove attività turistiche sovvenzionate. Il tasso di esecuzione complessivo raggiunge il 45,6% delle previsioni. Anche per le risorse LEADER in fase di programmazione per la quantificazione degli indicatori si era stimata la realizzazione di un numero limitato di progetti su scala media. Come sopra illustrato, le domande presentate si sono rivelate superiori alle aspettative e si riferiscono tutte alla realizzazione di infrastrutture ricreative su piccola scala (si rimanda per i dettagli all'analisi del valutatore indipendente presentata al capitolo 4, paragrafo b).

Risultato:

Misura 313 - Incentivazione delle attività turistiche	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2007 all'anno 2013	Obiettivi 2007-2013 (per anno)	Tasso di esecuzione del PSR - anno 2013	Tasso di esecuzione cumulato del PSR
(R7) Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie ('000 EUR)	200	469	900	22,2%	52,1%
(R8) Numero lordo di posti di lavoro creati	4	20	25	16,0%	80,0%
(R9) Numero supplementare di presenze turistiche	180	1.980	2.100	8,6%	94,3%

Il valore aggiunto lordo legato agli investimenti di incentivazione delle attività turistiche, stimato per le aziende a cui è stato liquidato l'aiuto previsto nel corso del 2007-2013, è pari a 469.000 € circa. Il numero di posti di lavoro creati con la misura 313 è stimato in 20, mentre si stima in 1.980 unità l'incremento del numero di turisti dovuto agli investimenti realizzati.

Tabella O313:

La misura ha visto 42 domande liquidate, tutte finalizzate alla realizzazione di infrastrutture ricreative su piccola scala.

Misura 321 (Articolo 52 (b) (i)): Creazione e miglioramento dei servizi essenziali per la popolazione rurale

Obiettivi in sintesi:

Migliorare le condizioni di vita delle popolazioni rurali con la creazione dei servizi indispensabili, sostenendo gli investimenti sia per la costruzione, il potenziamento, il risanamento, l'ammodernamento di acquedotti con funzioni potabile e/o per protezione civile, sia per la costruzione, ampliamento e risanamento di strade di collegamento ai masi – strade rurali.

Piano finanziario in sintesi:

	costo totale (inclusi i trascinamenti)	spesa pubblica totale	QUOTA FEASR	QUOTA NAZIONALE	spesa privata
TOTALE	21.421.525	17.137.220	7.540.377	9.596.843	4.284.305

Piano finanziario della parte LEADER:

	costo totale (inclusi i trascinamenti)	spesa pubblica totale	QUOTA FEASR	QUOTA NAZIONALE	spesa privata
TOTALE	625.000	500.000	220.005	279.995	125.000

Aiuti di stato supplementari (Top Up):


È previsto un finanziamento supplementare della Provincia Autonoma di Bolzano. Gli aiuti provinciali supplementari ammontano complessivamente a 15.000.000,00 €.

Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti):

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006): € 51.744,00
 Spesa pubblica totale: € 117.600,00

Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro):

Misura 321 - Servizi essenziali per la popolazione rurale	Spesa pubblica (FEASR) - Anno 2013	Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi dal 2007 all'anno 2013		Spesa pubblica programmata 2007 - 2013		Esecuzione finanziaria del PSR
		FEASR	TOTALE	Di cui FEASR	TOTALE	
Ordinario	760,19	6.007,40	13.653,17	7.540,38	17.137,22	79,7%
Ordinario - parte LEADER(quota inclusa nella tabella G5-411/412/413)	0	0	0	220,00	500,00	0%
Health Check	Misura non attivata ai sensi dell'HC					

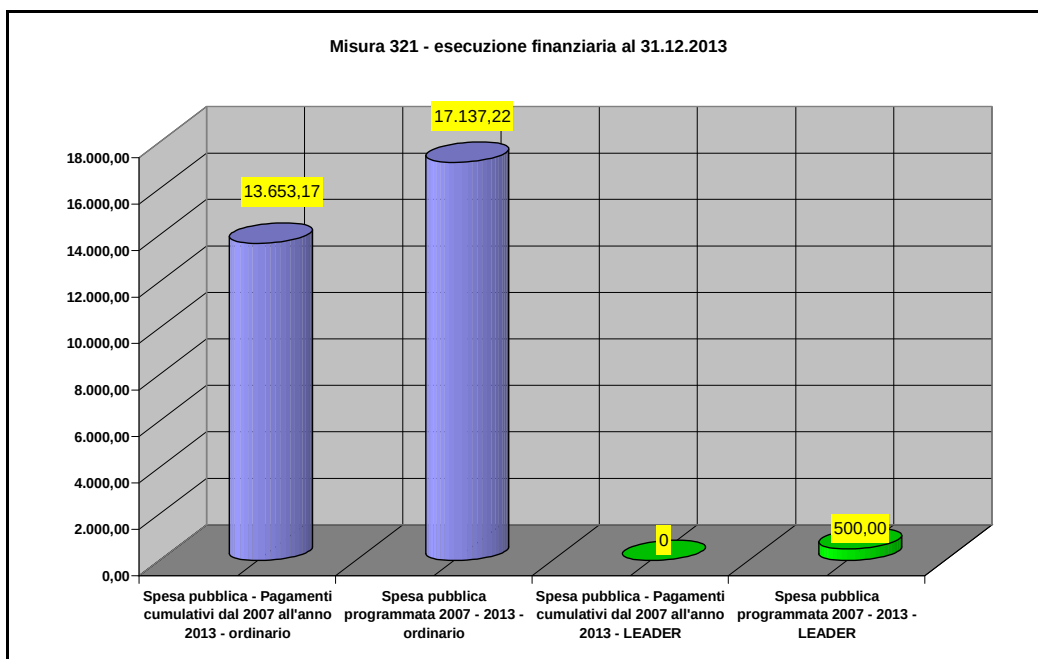

La spesa pubblica per la misura 321 ammonta nel 2013 a 1.727.712,93 €, corrispondente ad una quota comunitaria pari a 760.193,69 €. Il tasso di esecuzione risulta pari al 79,7%, per una spesa pubblica complessiva di 13.653.173,18 €.

Stato di attuazione fisico:

Misura 321 - Servizi essenziali per la popolazione rurale	Indicatori di prodotto	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2007 all'anno 2013	Obiettivi 2007-2013	Tasso di esecuzione del PSR - anno 2013	Tasso di esecuzione cumulato del PSR
Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1)	Numero di azioni sovvenzionate	7	82	88	7,9%	93%
	Volume totale di investimenti (000 euro)	2.233,25	16.993,07	21.275,00	10,5%	80%
Risorse ordinarie (cfr. tabella O41(2) parte LEADER (quota non inclusa nella tabella G5-411/412/413)	Numero di azioni sovvenzionate	0	0	1	0%	0%
	Volume totale di investimenti (000 euro)	0	0	625,00	0%	0%
Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2)	Numero di domande approvate	0	1	1	0%	100%
Health Check (cfr. tabelle G3.HC)	Numero di aziende sovvenzionate	Misura non attivata ai sensi dell'HC				
	Volume totale di investimenti (000 euro)					

Per la misura 321 sono state liquidate 82 domande per investimenti pari a circa 16,993 milioni di € (80% del totale); la sottomisura forestale non evidenzia particolari problemi e anche la misura agricola relativa agli acquedotti rurali sembra aver superato quelle difficoltà, legate soprattutto alle complesse procedure amministrative, che ne hanno rallentato

l'attuazione. Non si evidenziano particolari criticità, tuttavia è necessario un ulteriore sforzo soprattutto da parte dei Comuni rurali nella fase di esecuzione e rendicontazione per recuperare il ritardo. Le liquidazioni si protrarranno anche nel 2014 e 2015.

Risultato:

Misura 321 - Servizi essenziali per la popolazione rurale	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2007 all'anno 2013	Obiettivi 2007-2013 (per anno)	Tasso di esecuzione del PSR - anno 2013	Tasso di esecuzione cumulato del PSR
(R10) Popolazione rurale utente di servizi migliorati	236	2.764	3000	17,2%	84%

Considerato che gli 82 progetti della misura 321 finanziati nel corso del 2007-2013 sono finalizzati al potenziamento dei servizi di base per frazioni di montagna, isolate e con carenze in alcuni dei servizi essenziali di base, la stima che è stata fatta di 2.764 abitanti complessivamente serviti è congruente con nuclei abitati di circa 34 persone, pari a 11 famiglie rurali circa per progetto, ciascuna composta da tre persone.

Tabella O321:

Per la misura relativa ai servizi essenziali per la popolazione rurale sono state liquidate 82 domande finalizzate al potenziamento dei servizi essenziali dell'acqua potabile e della viabilità rurale.

Misura 322 (Articolo 52 (b) (ii)): Riqualificazione e sviluppo dei villaggi

Obiettivi in sintesi:

Migliorare le condizioni di vita delle popolazioni rurali con la valorizzazione dei villaggi posti in zona marginale (esclusivamente in zone LEADER).

Piano finanziario in sintesi:

	costo totale (inclusi i trascinalenti) solo parte LEADER	spesa pubblica totale	QUOTA FEASR	QUOTA NAZIONALE	spesa privata
TOTALE	7.669.353	6.135.482	2.699.677	3.435.805	1.533.871

Aiuti di stato supplementari (Top Up):

Non saranno utilizzati fondi supplementari della Provincia Autonoma di Bolzano.


Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinalenti):

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006): € 0,00

Spesa pubblica totale: € 0,00

Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro):

Misura 322 - Riqualificazione e sviluppo dei villaggi	Spesa pubblica (FEASR) - Anno 2013	Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi dal 2007 all'anno 2013		Spesa pubblica programmata 2007 - 2013		Esecuzione finanziaria del PSR
		FEASR	TOTALE	Di cui FEASR	TOTALE	
Ordinario – solo parte LEADER(quota inclusa nella tabella G5-411/412/413)	454,05	1.309,39	2.975,8	2.699,68	6.135,48	48,5%
Health Check	Misura non attivata ai sensi dell'HC					

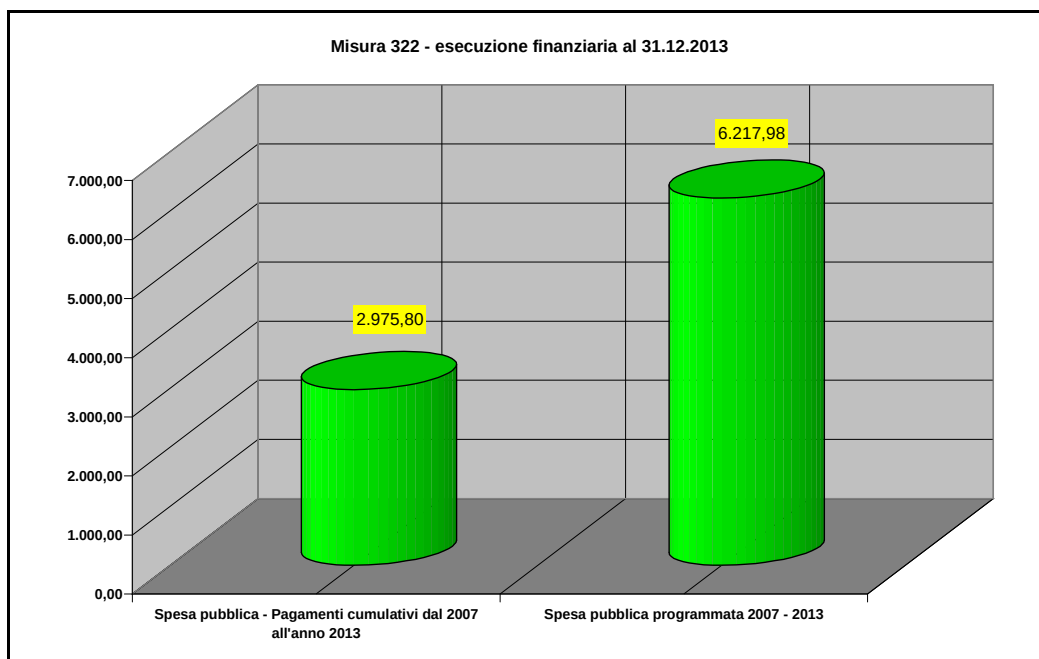

La spesa pubblica 2013 per la misura 322 ammonta a 1.031.940 €, corrispondente ad una quota comunitaria pari a 454.053,60 €. Il tasso di esecuzione sale al 48,5%; tale valore desta qualche preoccupazione. Pur riconoscendo che la misura ha risentito in una fase iniziale dei problemi di autofinanziamento dei Comuni e delle sempre più complesse procedure per l'affidamento dei lavori pubblici, criticità superate mediante l'adozione di provvedimenti volti a concedere anticipi pari alla metà del contributo approvato ed a coprire i costi relativi all'IVA non rendicontabile da parte dell'Amministrazione provinciale, sarà necessario nel corso del 2014 e del 2015 imprimere un'ulteriore accelerazione alle fasi di esecuzione e rendicontazione dei progetti per poter raggiungere l'obiettivo di spesa prefissato.

Stato di attuazione fisico:

Misura 322 - Riqualificazione e sviluppo dei villaggi	Indicatori di prodotto	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2007 all'anno 2013	Obiettivi 2007-2013	Tasso di esecuzione del PSR - anno 2013	Tasso di esecuzione cumulato del PSR
Risorse ordinarie (cfr. tabella O41(2) parte LEADER (quota non inclusa nella tabella G5-411/412/413)	Numero di azioni sovvenzionate	7	20	30	23,3%	66,7%
	Volume totale di investimenti (000 euro)	1.289,92	3.719,73	7.669,35	16,8%	48,5%
Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2)	Numero di domande approvate	0	0	0	0%	0%
Health Check (cfr. tabelle G3.HC)	Numero di aziende sovvenzionate	Misura non attivata ai sensi dell'HC				
	Volume totale di investimenti (000 euro)					

Nel 2013 per la misura 322 sono stati erogati contributi per investimenti complessivi pari a 1.289.925,00 € (16,8% del totale). Il tasso di esecuzione cumulato evidenzia un 48,5%.

Risultato:

Misura 322 - Riqualificazione e sviluppo dei villaggi	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2007 all'anno 2013	Obiettivi 2007-2013 (per anno)	Tasso di esecuzione del PSR - anno 2013	Tasso di esecuzione cumulato del PSR
(R10) Popolazione rurale utente di servizi migliorati	629	1.914	4.000	15,7%	47,8%

Si stima in 1.914 il numero di abitanti che hanno beneficiato del sostegno alla riqualificazione dei villaggi, per un valore percentuale del 47,8% delle previsioni.

Tabella O322:

Sono state liquidate 20 domande finalizzate al risanamento dei paesi rurali delle zone interessate dall'asse 4.

Misura 323 (Articolo 52 (b) (iii)): Tutela e riqualificazione del patrimonio naturale

Obiettivi in sintesi:

Sviluppare e riqualificare habitat pregiati tutelati ai sensi delle Direttive 79/406/CEE e 92/43/CEE.

Piano finanziario in sintesi:

	costo totale (inclusi i trascinamenti)	spesa pubblica totale	QUOTA FEASR	QUOTA NAZIONALE	spesa privata
TOTALE	1.275.909	1.275.909	561.400	714.509	0

Aiuti di stato supplementari (Top Up):

Non saranno utilizzati fondi supplementari della Provincia Autonoma di Bolzano.


Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti):

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006): € 0,00

Spesa pubblica totale: € 0,00

Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro):

Misura 323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio naturale	Spesa pubblica (FEASR) - Anno 2013	Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi dal 2007 all'anno 2013		Spesa pubblica programmata 2007 - 2013		Esecuzione finanziaria del PSR
		FEASR	TOTALE	Di cui FEASR	TOTALE	
Ordinario	110,18	414,55	942,17	561,40	1.275,91	73,8%
Health Check	Misura non attivata ai sensi dell'HC					

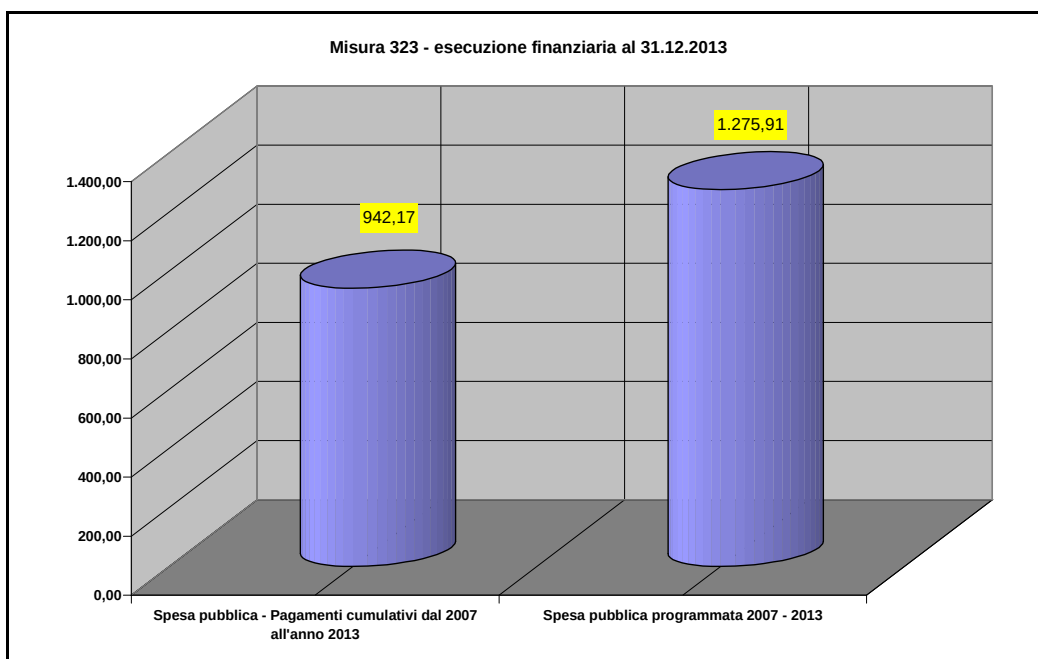

La spesa pubblica 2013 per la misura 323 ammonta a 250.403,07 €, corrispondente ad una quota comunitaria pari a 110.177,35 €. Il tasso di esecuzione della misura risulta pari al 73,8%.

Stato di attuazione fisico:

Misura 323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio naturale	Indicatori di prodotto	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2007 all'anno 2013	Obiettivi 2007-2013	Tasso di esecuzione del PSR - anno 2013	Tasso di esecuzione cumulato del PSR
Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1)	Numero di azioni sovvenzionate	14	45	33	42,4%	136,4%
	Volume totale di investimenti (000 euro)	250,40	942,17	1.276,00	19,6%	74%
Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2)	Numero di domande approvate	0	0	0	0%	0%
Health Check (cfr. tabelle G3.HC)	Numero di aziende sovvenzionate	Misura non attivata ai sensi dell'HC				
	Volume totale di investimenti (000 euro)					

Per la misura 323 sono stati liquidati complessivamente investimenti per 942.167,94 € (74% del totale), mentre le azioni sovvenzionate, aggiungendo le 14 relative al 2013, giungono a quota 45 (136% delle previsioni).

Risultato:

Misura 323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio naturale	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2007 all'anno 2013	Obiettivi 2007-2013 (per anno)	Tasso di esecuzione del PSR - anno 2013	Tasso di esecuzione cumulato del PSR
(R10) Popolazione rurale utente di servizi migliorati	21	68	50	42%	136%

Si stima in 68 gli abitanti che hanno beneficiato del sostegno alla tutela e riqualificazione del patrimonio naturale.

Tabella O323:

Sono state liquidate 45 domande, tutte finalizzate alla riqualificazione di biotopi.

Asse 4 – LEADER:

Procedura di selezione dei Gruppi d'Azione Locale:

Pur riconoscendo l'applicabilità dell'asse LEADER in tutti i territori rurali, si è ritenuto necessario concentrare le risorse disponibili su un numero limitato di territori, al fine di ottenere il massimo effetto moltiplicatore delle iniziative attivate e consentire ai Gruppi d'Azione Locale di disporre di quelle risorse umane e finanziarie sufficienti a sostenere una strategia di sviluppo. L'asse LEADER è implementato in quelle zone rurali della Provincia Autonoma di Bolzano che presentano un maggior carattere di marginalità e un ritardo nello sviluppo socio-economico superiore alla media.

Dopo l'approvazione del PSR sia da parte della Commissione Europea il 12 settembre 2007 con decisione n. C(2007) 4153 sia da parte Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano il 1 ottobre 2007 con Deliberazione n. 3241, si è provveduto il 22 novembre 2007 alla pubblicazione su quotidiani locali di avvisi per la raccolta di manifestazioni d'interesse e per la presentazione di proposte di programmi locali.

Un'apposita Commissione comprendente rappresentanti delle Ripartizioni Agricoltura, Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica, Natura e Paesaggio, Foreste è stata designata dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n. 62 del 21.01.2008 con la finalità di selezionare in una prima fase le candidature dei Gruppi d'Azione Locale e di valutare successivamente la strategia proposta nei Piani di Sviluppo Locale sulla base dei criteri e delle procedure specificate nel programma. Con Deliberazione n. 3684 del 13.10.2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige n. 45 del 04.11.2008, la Giunta Provinciale ha ammesso al finanziamento previsto ai sensi dell'asse 4 LEADER del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 le zone rurali rappresentate dai Gruppi di Azione Locale Val Sarentino, Alta Val d'Isarco, Val d'Ultimo/Alta Val di Non/Val Martello e Valli di Tures-Aurina. La Giunta Provinciale ha approvato le misure di attuazione dei Piani di Sviluppo Locale ed il relativo piano di finanziamento.

A sostegno degli interventi promossi attraverso i GAL, la Provincia ha previsto l'attribuzione di una quota del budget del PSR pari al 5%, per un totale di circa 15.700.000 € di fondi pubblici.

Caratteristiche territoriali dei Gruppi d'Azione Locale:

Nella tabella che segue sono illustrate alcune caratteristiche territoriali dei quattro partneri selezionati.


	Alta Val d'Isarco	Val Sarentino	Valli di Tures ed Aurina	Val d'Ultimo/ Alta Val di Non/ Martello	Alto Adige
Superficie territoriale (km2)	650,01	302,50	603,10	475,60	7.400,43
Altitudine media (m)	942	961	1.092	1.181m	-----
Popolazione residente	18.558	6.760	15.352	6.924	462.999
Abitanti/km²	47	22	27	19	66
Andamento demografico (%)	3,8	1,8	2,4	0,5	5,32
Occupati in agricoltura (%)	8,9	15,2	20,58	27,4	9,9
Pendolari %	56,3	42	51,01	123,13	37,3
Pieno utilizzo dei posti letto %	31,95	20,6	37,62	17,17	33,42
Numero di esercizi/1.000 abitanti	17,64	13,9	3,76	5,39	14,46
Quota di laureati e diplomati %	12,45	6,77	7,56	7,3	14,65
Distanza dai più vicini centri economici km	5,3	20	10,4	14,5	-----

Di seguito sono riportate le rappresentazioni cartografiche delle aree selezionate, nelle quali vengono evidenziati i comuni che compongono il GAL:


Gruppo d'Azione Locale Alta Val d'Isarco – Wipptal:




Gruppo d'Azione Locale Valli di Tures ed Aurina – Tauferer Ahrntal:

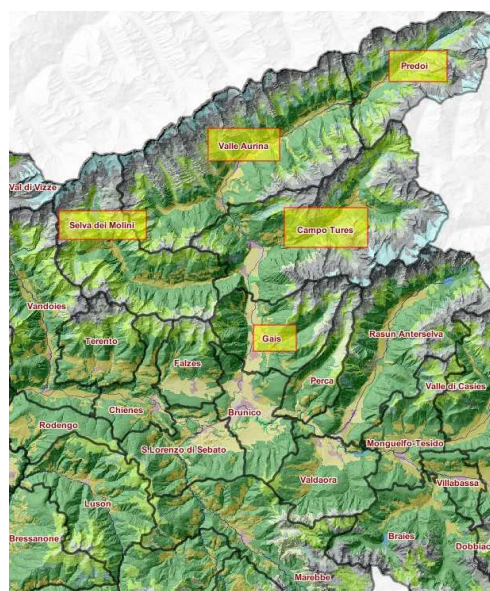

Gruppo d'Azione Locale Val Sarentino – Sarntal:

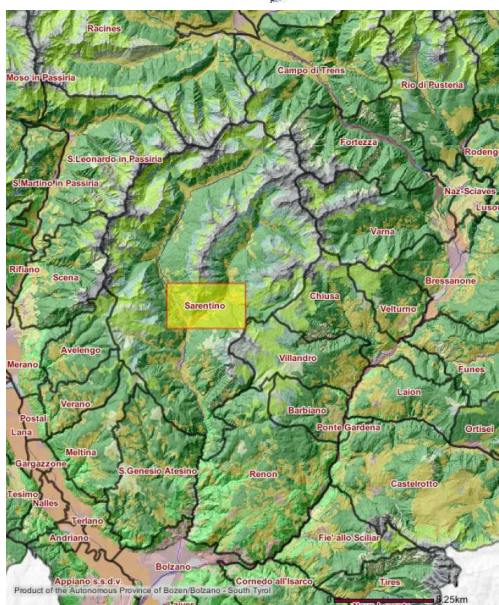

Gruppo d'Azione Locale Val d'Ultimo/Alta Val di Non/Martello – Ulten / Deutschnonsberg / Martelltal:

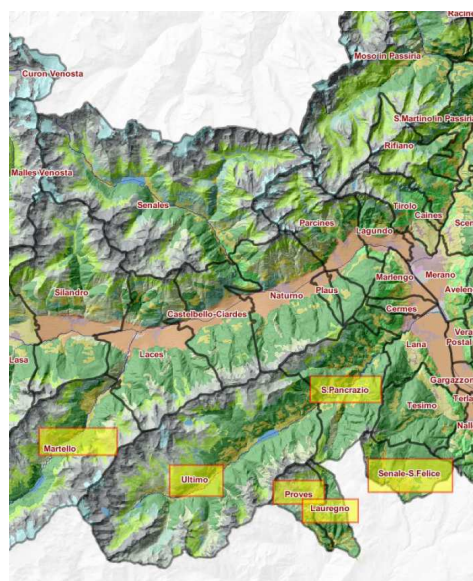

Organizzazione dei Gruppi d'Azione Locale:

I Gruppi d'Azione Locale selezionati sono un'un'espressione equilibrata e rappresentativa dei vari partner locali e degli ambienti socio-economici del territorio. Come previsto nel PSR, a livello decisionale i partner privati, le associazioni, ecc. rappresentano almeno il 50% del partenariato locale, la parte pubblica, di fatto, non supera quindi il 50%.

Strategia di Sviluppo Locale:

Il passaggio dal FEOGA-Orientamento al FEASR ha imposto di fatto una modifica della strategia del metodo LEADER. Il fatto stesso di essere una parte integrante del PSR e di diventare uno strumento, privilegiato, ma pur sempre finalizzato al raggiungimento degli obiettivi generali dello Sviluppo Rurale ne ha modificato in parte obiettivi e contenuti. La finalità dei fondi assegnati all'attuazione del LEADER è quella di contribuire ad attivare al meglio le risorse endogene in quelle aree più deboli, nelle quali senza uno specifico e mirato aiuto gli obiettivi del PSR non troverebbero un'adeguata attuazione.

Con questa premessa i Piani di Sviluppo Locale elaborati dai GAL evidenziano un'impostazione globale, integrata tra settori e progetti, coinvolgendo i diversi operatori e le diverse realtà territoriali, basata su una strategia coerente con gli obiettivi centrali dello sviluppo rurale: miglioramento della qualità di vita nelle zone rurali, valorizzazione dei prodotti locali, delle risorse naturali e culturali. Le singole misure selezionate nell'ambito dell'intera gamma prevista nel PSR sono strutturate e organizzate in modo chiaro e trasparente e rispondono alla scala di obiettivi individuati come linee guida per lo sviluppo locale integrato, in accordo con le caratteristiche di forza e debolezza del territorio. Il carattere innovativo si determina non solo in relazione alle tipologie di intervento previste dall'approccio LEADER, ma prevalentemente come integrazione delle diverse azioni, come cooperazione tra i diversi attori e come valorizzazione del territorio nel rispetto dell'ambiente.

Nella tabella che segue viene riportato un dettaglio della destinazione delle risorse pubbliche per Piano di Sviluppo Locale e per misura:

	Destinazione risorse pubbliche per Piano di Sviluppo Locale e per misura				
	GAL Alta Val d'Isarco	GAL Val Sarentino	GAL Valli di Tures ed Aurina	GAL Val d'Ultimo / Al- ta Val di Non/ Martello	Totale
Misura 111 Formazione professionale, azioni di informazione	113.487,00 €	140.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	353.487,00 €
Misura 123 Accrescimento del valore aggiun- to della produzione agricola e forestale primaria	70.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €	130.000,00 €
Misura 124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecno- logie nel settore agricolo, foresta- le ed in quello alimentare	80.000,00 €	- €	200.000,00 €	250.000,00 €	530.000,00 €
Asse 1	263.487,00 €	200.000,00 €	250.000,00 €	300.000,00 €	1.013.487,00 €
Misura 313 - Incentivazione delle attività turistiche	1.155.000,00 €	1.619.117,00 €	2.310.101,00 €	1.035.295,00 €	6.119.513,00 €
Misura 321 Servizi essenziali per la popola- zione rurale (biogas)	- €	- €	500.000,00 €	- €	500.000,00 €
Misura 322	1.800.000,00 €	600.000,00 €	1.500.000,00 €	1.800.000,00 €	5.700.000,00 €

Il quadro delle attività - fasi e soggetti coinvolti- responsabilità dei GAL:

L'Amministrazione provinciale, come si può evincere dalla tabella che segue e come descritto nel PSR, ha scelto di valorizzare i GAL non tanto nella fase esecutiva dei progetti, ma soprattutto in quella di animazione e di selezione delle iniziative.

		GAL	AdG	OPP
Bandi	Elaborazione del bando		X	
	Elaborazione criteri di selezione		X	
	Pubblicazione	X	X	
	Ricezione domande	X	X	
Istruttoria	Controlli amministrativi e tecnici		X	
	Controlli in situ		X	
	Formazione Graduatorie		X	
	Approvazione graduatorie		X	
	Formazione elenco beneficiari		X	
Controlli e pagamenti	Ricezione domande di pagamento		X	
	Controlli amministrativi e tecnici		X	
	Controlli in loco		X	
	Liquidazione contributo			X

Tale scelta, che ad una prima superficiale analisi potrebbe sembrare riconducibile ad un approccio top-down, in realtà è dettata unicamente dalla considerazione che il peso finanziario della diretta attuazione delle operazioni potrebbe generare gravi difficoltà economiche capaci di mettere in pericolo l'intera struttura locale, compromettendo in definitiva gli obiettivi di programma. Non viene in nessun modo limitata la capacità progettuale ed operativa dei gruppi e indebolito l'approccio bottom-up che rappresenta l'essenza vitale del programma LEADER, in quanto i GAL mantengono la piena e totale responsabilità della selezione dei progetti in funzione della strategia adottata a livello locale. In definitiva, si può affermare che risulta potenziato lo spirito d'iniziativa e di animazione caratteristico dell'approccio bottom up.

Alla luce della reale spesa sostenuta nei primi quattro anni di programmazione vengono confermate le preoccupanti difficoltà dell'asse 4 nella concreta fase d'implementazione: gli aspetti procedurali sono così complessi da rendere critica l'attuazione dell'approccio Leader. Ciò in particolar modo se i Piani di Sviluppo Locale vengono concepiti ed attuati nelle zone rurali maggiormente svantaggiate e con evidenti problemi strutturali e sociali. La scelta effettuata dall'Amministrazione provinciale di non delegare ai gruppi d'azione le fasi relative all'istruttoria, al controllo e al pagamento, si è rivelata quanto mai opportuna: molto probabilmente l'affidamento di tali attività ai GAL avrebbe contribuito a far crescere i costi di gestione a discapito quindi dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale, complicando ulteriormente il già critico processo di transizione del LEADER da Iniziativa Comunitaria a vero e proprio asse metodologico dei Programmi di Sviluppo Rurale e rallentando rischiosamente il difficile avvio dei Piani di Sviluppo Locale.

Nonostante la descritta suddivisione delle attività, i GAL rimangono i veri responsabili della progettazione ed attuazione delle iniziative della strategia di sviluppo, motivando ed informando i potenziali beneficiari attraverso una capillare azione di contatto con Enti Pubblici, gruppi d'interesse, associazioni e aziende, utilizzando per lo scopo anche pubblicazio-

ni informative specifiche. I GAL sono responsabili della fase di selezione delle singole iniziative: le proposte di progetto vengono sottoposte ad un procedimento di valutazione e di selezione in base alla corrispondenza al metodo LEADER ed alla strategia di sviluppo locale, al carattere innovativo-pilota ed alla redditività intesa non solo in senso economico. Per ogni progetto approvato viene redatto dal GAL un documento di coerenza del progetto con la strategia LEADER che viene allegato insieme all'estratto del verbale della seduta agli incartamenti che verranno inoltrati all'ufficio provinciale competente. I GAL pubblicano sui rispetti siti web l'elenco dei progetti approvati durante le sedute e periodicamente report o aggiornamenti sull'attuazione dei piani. La trasparenza del processo decisionale viene inoltre garantita da ciascun membro del GAL tramite l'astensione da qualsiasi attività per la quale possa configurarsi una posizione di conflittualità nell'esercizio delle proprie funzioni. I singoli progetti approvati dai GAL vengono in seguito esaminati da parte dei funzionari dell'Amministrazione provinciale delle Ripartizioni competenti, per verificarne unicamente la congruenza e la conformità con la politica comunitaria e provinciale, l'aderenza allo spirito dello sviluppo rurale, garantendo ai partner nazionale e comunitario la coerenza e l'ammissibilità di tutte le iniziative emerse a livello locale.

Il finanziamento, dopo una valutazione tecnico-finanziaria e di conformità rispetto agli obiettivi del Programma di Sviluppo Rurale da parte dell'ufficio coinvolto nell'esecuzione, viene garantito attraverso decreti d'approvazione da parte dell'Assessore competente.

I singoli uffici provinciali sono responsabili anche del procedimento amministrativo relativo alle domande di pagamento. La procedura seguita è quella definita nel manuale delle procedure e dei controlli predisposto dall'Organismo Pagatore della Provincia Autonoma di Bolzano, garantendo in questo modo la conformità alla normativa comunitaria, nazionale e provinciale. I contributi vengono erogati dall'organismo pagatore direttamente ai beneficiari finali della domanda sulla base delle richieste di liquidazione redatte dai competenti uffici provinciali, dopo i necessari accertamenti ed una verifica dell'ammissibilità delle spese.

Nell'ambito dell'asse LEADER le modalità operative di monitoraggio e controllo si articolano su due livelli:

1. a cura dei GAL:

- raccolta dati, gestione e controllo dell'avanzamento del singolo progetto,
- trasferimento dei dati alla Provincia Autonoma e,
- tramite questa, al Comitato di sorveglianza ed alla Commissione

2. a cura delle amministrazioni competenti (UE, Stato, Provincia Autonoma): coordinamento, sorveglianza e valutazione della conformità delle azioni agli obiettivi strategici.

Le procedure adottate mirano a rispondere puntualmente alle disposizioni comunitarie in tema di controllo e valutazione dei programmi cofinanziati. Tali procedure costituiscono anche un valido strumento di lavoro allo scopo di aiutare i GAL, lo Stato membro e la Provincia Autonoma, a prevedere ed eliminare eventuali ostacoli, a risolvere problemi, a migliorare i risultati e a rivedere le proprie azioni nel corso dell'attuazione dei Programmi.

Attuazione dei Piani di Sviluppo Locale

Nella tabella che segue è riportato un riepilogo relativo all'attuazione dei quattro Piani di Sviluppo Locale al 31.12.2013. Per tutte le misure attivabili mediante approccio LEADER sono stati selezionati ed approvati dai GAL progetti, per i quali è prevista complessivamente una spesa pubblica pari a circa € 15.700.000, ovvero il 100% delle risorse assegnate all'asse

4. Per un'informazione più di dettaglio si rimanda alle relazioni elaborate dai GAL e allegate al presente rapporto.

Elenco delle misure attivate	Numero complessivo delle domande di aiuto approvate dai GAL	Numero complessivo dei progetti in corso di effettiva esecuzione/terminati	Spesa pubblica complessiva approvata	Percentuale di avanzamento	Spesa pubblica complessiva liquidata	Percentuale di avanzamento della spesa
Misura 111 Misura 123 Misura 124 Misura 313 (A, B, C) Misura 321 Misura 322 Misura 421 Misura 431	201	201	€ 15.715.584	100,00%	€ 7.361.339,51	46,84%

Da un esame della tabella sopra riportata si può evincere un ottimo andamento dei Piani di Sviluppo Locale in relazione all'approvazione e delega dei progetti da parte dei Gruppi d'Azione Locale, all'ammissione a finanziamento con decreto dell'Assessore competente e alla loro successiva esecuzione. Questo risultato positivo è riconducibile sia alla competente capacità gestionale ed intensa attività di animazione sul territorio da parte dei quattro GAL, sia al costante e puntuale flusso di informazioni tra gli uffici provinciali coinvolti nell'attuazione dell'asse 4 ed i coordinatori dei gruppi d'azione locale. La scelta dell'amministrazione provinciale di valorizzare i GAL non tanto nella fase esecutiva dei progetti, ma soprattutto in quella di progettazione della strategia, di animazione e di selezione delle iniziative, delegando agli uffici provinciali l'oneroso carico amministrativo dell'istruttoria, controllo e pagamento delle domande, si è rivelata quindi efficace. Se si analizza la percentuale di avanzamento della spesa effettivamente rendicontata, desta preoccupazione il valore raggiunto dopo sei anni dall'inizio della programmazione. Se da un lato l'attività dei GAL è partita concretamente solo all'inizio del 2009 (nel corso del 2008 si è svolta la procedura di selezione dei gruppi ed approvazione dei Piani), riducendo quindi a cinque gli anni di effettiva attuazione dei piani, dall'altro sorprende un tasso di esecuzione finanziaria nel 2013 così basso (46,84%) a fronte di un cospicuo numero di progetti approvati. Le approvazioni dei progetti hanno sicuramente seguito un andamento costante e positivo, consentendo di impegnare entro il 2013 il 100% delle risorse destinate ai quattro Piani di Sviluppo Locale. La fase di realizzazione e rendicontazione evidenzia continui progressi; le erogazioni, che riguardano non solo le spese per la gestione dei Gruppi d'Azione Locale, ma anche investimenti relativi alle misure 411 e 413, sono cresciute del 60% rispetto al 2012. Sono state superate diverse criticità che hanno influito negativamente all'inizio della programmazione, quali ad esempio il non finanziamento dell'IVA per i soggetti pubblici, le complesse procedure per l'affidamento dei lavori da parte dei Comuni, le difficoltà di prefianziamento dei progetti da parte dei beneficiari. Tuttavia, per poter completare l'attuazione dei piani nei tempi previsti dai regolamenti dell'Unione europea, rimangono a disposizione solo due anni, durante i quali dovranno essere erogati contributi corrispondenti ad un importo pari a circa € 8.600.000, ovvero il 53% delle risorse assegnate all'asse LEADER.

Misura 431 (Articolo 63 (c)): Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e animazione

Obiettivi in sintesi:

Migliorare la capacità progettuale e gestionale dei GAL, valorizzare le risorse endogene dei territori in una fase di reciproco scambio di esperienze.

Piano finanziario in sintesi:

	costo totale (inclusi i trascinamenti)	spesa pubblica totale	QUOTA FEASR	QUOTA NAZIONALE	spesa privata
TOTALE	1.999.952	1.999.952	880.000	1.119.952	-

Aiuti di stato supplementari (Top Up):

Non saranno utilizzati fondi supplementari della Provincia Autonoma di Bolzano.

Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti):

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006): € 0

Spesa pubblica totale: € 0

Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro):

Misura 431 - Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e animazione	Spesa pubblica (FEASR) - Anno 2013	Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi dal 2007 all'anno 2013		Spesa pubblica programmata 2007 - 2013		Esecuzione finanziaria del PSR
		FEASR	TOTALE	Di cui FEASR	TOTALE	
Ordinario	148,98	559,26	1.270,75	880,00	1.999,95	63,5%
Health Check	Misura non attivata ai sensi dell'HC					

Per la misura 431 sono state effettuate nel corso del 2013 liquidazioni per un importo complessivo di 338.597,68 €, corrispondente a una quota comunitaria di 148.982,98 €. Il dato complessivo può considerarsi soddisfacente, in quanto è proseguita senza particolari criticità l'attività di progettazione degli interventi, animazione del territorio ed informazione, facendo evidenziare per la misura un tasso di esecuzione finanziaria prossimo al 64%.

Stato di attuazione fisico:

Misura 431 - Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e animazione	Indicatori di prodotto	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2007 all'anno 2013	Obiettivi 2007-2013	Tasso di esecuzione del PSR - anno 2013	Tasso di esecuzione cumulato del PSR
Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1)	Numero di azioni sovvenzionate	20	80	150	13,3%	53%
Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2)	Numero di domande approvate	0	0	0		0%
Health Check (cfr. tabelle G3.HC)	Numero di azioni sovvenzionate	Misura non attivata ai sensi dell'HC				

Per la misura 431 sono state liquidate nel 2013 quattro domande relative a 20 azioni, pari al 13,3% delle previsioni.

Risultato:

Misura 431 - Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e animazione	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2007 all'anno 2013	Obiettivi 2007-2013 (per anno)	Tasso di esecuzione del PSR - anno 2013	Tasso di esecuzione cumulato del PSR
(R12) Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione (acquisizione di competenze e animazione)	1	11	10	10%	110%

Tabella O431:

Nel 2013 per la misura 431 sono state liquidate quattro domande, con le quali sono state sovvenzionate 20 azioni, 6 delle quali relative a studi sul territorio, 6 inerenti attività d'informazione, 6 riguardanti la formazione del personale addetto all'elaborazione e all'esecuzione della strategia di sviluppo locale ed 2 finalizzate all'organizzazione di eventi promozionali.

3. Esecuzione finanziaria del programma (articolo 82, paragrafo 2, lettera c) – situazione al 31 dicembre 2013:

3.1. Spesa effettivamente sostenuta a livello nazionale (Amministrazione provinciale):

3.1.1. Spesa per misura effettivamente sostenuta a livello nazionale (Amministrazione provinciale) – risorse ordinarie:

Tabella sintetica secondo l'allegato VII del reg. (CE) n. 1974/2006 – parte ordinaria:

Misura/Asse	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2013	Versamenti cumulativi (Spesa pubblica) – 2007/2013
Misura 111	222.630,98	668.052,78
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	300,00
Misura 112	- 14.448,04	9.882.473,59
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	20.000,00
Misura 115	-	200.000,00
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	-
Misura 121	313.467,86	9.772.487,16
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	-
Misura 122	36.540,46	4.125.812,45 (*)
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	186.622,10 (*)
Misura 123	3.800.849,20	28.995.066,98
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	1.523.893,68
Misura 124	544.177,64-	544.177,64-
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	-
Misura 125	512.041,49	7.195.034,04
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	2.579.185,72
Misura 132	-	-
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	-
Misura 133	-	270.195,00
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	-
Totale asse 1	5.415.259,59	61.653.299,64 (*)
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	4.310.001,50 (*)
Misura 211	- 10.261,23	62.345.169,36
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	10.834.065,32
Misura 214	15.012.995,04	121.135.064,65
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	18.246.955,20
Misura 226	-	3.898.794,74 (*)
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	2.626.884,30 (*)
Misura 227	34.181,40	208.123,82
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	14.567,00
Totale asse 2	15.036.915,21	187.587.152,57 (*)
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	31.722.471,82 (*)
Misura 311	685.785,00	5.842.856,60
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	-
Misura 313	568.809,48	1.329.906,66
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	-
Misura 321	1.727.712,93	13.653.173,18
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	117.600,00
Misura 323	250.403,07	942.167,94
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	-
Totale asse 3	3.232.710,48	21.768.104,38
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	117.600,00
411 Competitività	167.128,84	280.482,86

di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	-
413 Qualità della vita/diversificazione	2.337.032,69	5.810.108,97
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	-
421 Cooperazione interterritoriale e transnazionale	-	-
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	-
431 Gestione gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione	338.597,68	1.270.747,68
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	-
Totale asse 4	2.842.759,21	7.361.339,51
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO (fondi ordinari)	26.527.644,49	278.369.896,10 (*)
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	36.150.073,32 (*)

Al 31.12.2013 risultano essere state effettuate liquidazioni da parte dell'Organismo Pagatore Provinciale per 20 delle 22 misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Le liquidazioni vengono sintetizzate nella tabella sopra riportata. Per una migliore comprensione di chi legge, è bene chiarire come i riferimenti temporali delle liquidazioni del PSR siano rappresentati dall'anno solare 2013 (1 gennaio – 31 dicembre 2013) e dal bilancio comunitario 2013 (16 ottobre 2012 – 15 ottobre 2013). I dati della tabella si riferiscono all'anno solare 2013, mentre nel successivo paragrafo 3.2 verranno precisati anche gli importi per anno di bilancio comunitario.

(*) Nota bene: la tabella riporta i valori della spesa pubblica dichiarata complessivamente a partire dal primo anno di programmazione: la spesa pubblica ammonta in totale a 278.369.896,10 €, mentre quella relativa alle spese transitorie è pari a 36.150.073,32 €.

Il dato relativo alla spesa pubblica dichiarata (si veda anche la tabella ufficiale dell'UE V.I) include una doppia dichiarazione di spesa per le misure 122 e 226, rispettivamente per un importo di 83.540,42 € per la misura 122 e di 1.313.442,15 €). Questa spesa è stata dichiarata per entrambe le misure una prima volta nel corso del quarto trimestre 2007: a causa del superamento della stima dei trascinamenti previsti nel PSR per queste misure, però, la rendicontazione ed il rimborso comunitario furono temporaneamente sospesi fino all'avvenuta modifica della tabella 5.2 del PSR. Successivamente, gli importi relativi ai trascinamenti per le misure 122 e 226 sono stati nuovamente dichiarati alla CE nel secondo trimestre del 2008, dopo l'approvazione della modifica del PSR e dell'aggiornamento degli importi della tabella dei trascinamenti.

La doppia contabilizzazione da parte della CE ha determinata una spesa pubblica complessiva dichiarata superiore (278.369.896,10 €,) rispetto a quella reale (276.972.913,53 €): sottraendo gli importi rendicontati due volte per le misure 122 e 226 (83.540,42 € e 1.313.442,15 €), il dato netto coincide con quello della tabella del paragrafo 3.1.3.

Ovviamente, anche la spesa pubblica relativa ai trascinamenti dichiarata è superiore a quella reale per lo stesso identico motivo (36.150.073,32 € rispetto ai reali 34.753.090,75 €): sottraendo gli importi rendicontati due volte per le misure 122 e 226 (83.540,42 € e 1.313.442,15 €), il dato netto coincide con quello della tabella del paragrafo 3.1.3.

3.1.2. Spesa per misura effettivamente sostenuta a livello nazionale (Amministrazione provinciale) – risorse Health Check:

Tabella sintetica secondo l'allegato VII del reg. (CE) n. 1974/2006 – parte Health Check:

Misura/Asse	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2013	Versamenti cumulativi (Spesa pubblica) – 2007/2013
Misura 111	-	-
Misura 112	-	-
Misura 115	-	-
Misura 121	284.400,00	3.568.092,41
Misura 122	-	-
Misura 123	-	-
Misura 124	-	-
Misura 125	-	-
Misura 132	-	-
Misura 133	-	-
Totale asse 1	284.400,00	3.568.092,41
Misura 211	-	-
Misura 214	3.516.839,91	12.768.676,71
Misura 226	-	-
Misura 227	-	-
Totale asse 2	3.516.839,91	12.768.676,71
Misura 311	-	-
Misura 313	-	-
Misura 321	-	-
Misura 323	-	-
Totale asse 3	-	-
411 Competitività	-	-
413 Qualità della vita/diversificazione	-	-
421 Cooperazione interterritoriale e transnazionale	-	-
431 Gestione gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione	-	-
Totale asse 4	-	-
TOTALE COMPLESSIVO (fondi Health Check)	3.801.239,91	16.336.769,12

Nel corso del 2013 sono state effettuate ulteriori liquidazioni relative alle operazioni Health Check, relative alla misura 121 ed alla misura 214, intervento 214-1. Dopo la modifica del PSR proposta nel corso del 2011, queste sono le uniche misure per le quali siano previsti fondi HC. I dettagli sono già stati illustrati nel capitolo relativo alle schede relative all'attuazione delle singole misure, misure 121 e 214.

3.1.3. Spesa per misura effettivamente sostenuta a livello nazionale (Amministrazione provinciale) – risorse totali (ordinarie + Health Check):

Tabella sintetica secondo l'allegato VII del reg. (CE) n. 1974/2006 – parte ordinaria e parte HC:

Misura/Asse	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2013	Versamenti cumulativi (Spesa pubblica) – 2007/2013
Misura 111	222.630,98	668.052,78
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	300,00
Misura 112	- 14.448,04	9.882.473,59
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	20.000,00

Misura 115	-	200.000,00
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	-
Misura 121	597.867,86	13.340.579,57
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	-
Misura 122	36.540,46	4.125.812,45 (*)
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	186.622,10 (*)
Misura 123	3.800.849,20	28.995.066,98
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	1.523.893,68
Misura 124	544.177,64-	544.177,64-
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	-
Misura 125	512.041,49	7.195.034,04
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	2.579.185,72
Misura 132	-	-
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	-
Misura 133	-	270.195,00
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	-
Totale asse 1	5.699.659,59	65.221.392,05 (*)
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	4.310.001,50 (*)
Misura 211	- 10.261,23	62.345.169,36
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	10.834.065,32
Misura 214	18.529.834,95	133.903.741,36
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	18.246.955,20
Misura 226	-	3.898.794,74 (*)
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	2.626.884,30 (*)
Misura 227	34.181,40	208.123,82
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	14.567,00
Totale asse 2	18.553.755,12	200.355.829,28 (*)
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	31.722.471,82 (*)
Misura 311	685.785,00	5.842.856,60
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	-
Misura 313	568.809,48	1.329.906,66
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	-
Misura 321	1.727.712,93	13.653.173,18
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	117.600,00
Misura 323	250.403,07	942.167,94
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	-
Totale asse 3	3.232.710,48	21.768.104,38
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	117.600,00
411 Competitività	167.128,84	280.482,86
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	-
413 Qualità della vita/diversificazione	2.337.032,69	5.810.108,97
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	-
421 Cooperazione interterritoriale e transnazionale	-	-
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	-
431 Gestione gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione	338.597,68	1.270.747,68
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	-
Totale asse 4	2.842.759,21	7.361.339,51
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO (fondi ordinari+Health Check)	30.328.884,40	294.706.665,22 (*)
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	36.150.073,32 (*)

La tabella riporta la somma delle spese sostenute nel corso del 2013 complessivamente, considerando le risorse ordinarie e quelle Health Check. Per le misure 122 e 226 si veda la nota del capitolo 3.1.1.

3.1.4. Spesa per asse effettivamente sostenuta a livello nazionale (Amministrazione provinciale) – risorse ordinarie + risorse Health Check:

La seguente tabella riassume la spesa pubblica dell'anno solare 2013 per ciascuno dei quattro assi del Programma:

Tabella di sintesi per asse delle spese complessive *effettivamente sostenute* negli anni 2007 - 2013 *per anno solare* – risorse ordinarie e risorse Health Check:


Asse	Spesa pubblica prevista	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2007	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2008	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2009	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2010
Totale asse 1	79.068.987,00	4.219.848,85	3.470.712,23	10.443.319,21	20.515.616,77
di cui spese per nuove domande		-	3.464.100,00	10.443.319,21	20.515.616,77
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		4.219.848,85	6.612,23	-	-
Totale asse 2	207.659.067,00	30.177.970,77	27.152.811,25	55.668.576,31	28.185.645,70
di cui spese per nuove domande		-	26.921.752,35	55.668.576,31	28.185.645,70
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		30.177.970,77	231.058,90	-	-
Totale asse 3	27.748.329,00	117.600,00	-	2.874.928,38	4.769.560,04
di cui spese per nuove domande		-	-	2.874.928,38	4.769.560,04
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		117.600,00	-	-	-
Totale asse 4	15.715.643,00	-	-	147.000,00	461.250,00
di cui spese per nuove domande		-	-	147.000,00	461.250,00
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-
TOTALE COMPLESSIVO (fondi ordinari e fondi Health Check)	330.192.026,00	34.515.419,62	30.623.523,48	69.133.823,90	53.932.072,51
di cui spese per nuove domande		-	30.385.852,35	69.133.823,90	53.932.072,51
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		34.515.419,62	237.671,13	-	-

Asse	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2011	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2012	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2013	Tasso di realizzazione finanziaria del PSR (spesa pubblica 2007/2013 sul previsto)	Versamenti cumulativi (Spesa pubblica) – 2007/2013
Totale asse 1	11.996.776,92	8.791.918,06	5.699.659,59	82,38%	65.137.851,63
di cui spese per nuove domande	11.996.776,92	8.791.918,06	5.699.659,59		60.911.390,55
di cui spese transi-	-	-	-		4.226.461,08


torie Reg. (CE) n. 1320/2006					
Totale asse 2	21.643.137,08	17.660.490,90	18.553.755,12	95,85%	199.042.387,13
di cui spese per nuove domande	21.643.137,08	17.660.490,90	18.553.755,12		168.633.357,46
di cui spese transi- torie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	-	-		30.409.029,67
Totale asse 3	5.283.838,52	5.489.466,96	3.232.710,48	78,45%	21.768.104,38
di cui spese per nuove domande	5.283.838,52	5.489.466,96	3.232.710,48		21.650.504,38
di cui spese transi- torie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	-	-		117.600,00
Totale asse 4	1.793.253,71	2.117.076,59	2.842.759,21	46,84%	7.361.339,51
di cui spese per nuove domande	1.793.253,71	2.117.076,59	2.842.759,21		7.361.339,51
di cui spese transi- torie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	-	-		-
TOTALE COMPLESSIVO (fondi ordinari e fondi Health Check)	40.717.006,23	34.058.952,51	30.328.884,40	88,83%	293.309.682,65
di cui spese per nuove domande	40.717.006,23	34.058.952,51	30.328.884,40		258.556.591,90
di cui spese transi- torie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	--	-		34.753.090,75

La spesa pubblica complessiva liquidata nel corso del 2013 ammonta a 30,329 milioni di €. Se si analizza il trend, si può notare come, dopo il picco raggiunto nel corso degli anni 2009 e 2010, la spesa sia progressivamente (e inevitabilmente) diminuita, mantenendo comunque caratteristiche positive di qualità e risultando essere equilibrata rispetto ai diversi assi di programmazione e rispetto al rapporto investimenti/premi. Essendo completamente esaurita la componente finanziaria cofinanziata relativa alla misura 211, la spesa dell'asse 2 deve necessariamente diminuire. Considerando inoltre che i premi agroambientali della misura 214 proseguono regolarmente senza ritardi relativi agli anni precedenti, si comprende il valore ottenuto per l'asse 2. Si evidenzia come l'asse quattro abbia visto continuare a crescere la propria spesa.

Dei 30,329 milioni di € liquidati, 18,554 milioni sono relativi all'asse 2 (18,530 milioni di € si riferiscono alle liquidazioni della sola misura 214): ciò significa che i premi hanno avuto una quota del 61% della spesa annuale totale, mentre la quota delle misure di investimento ha raggiunto la percentuale del 39%.

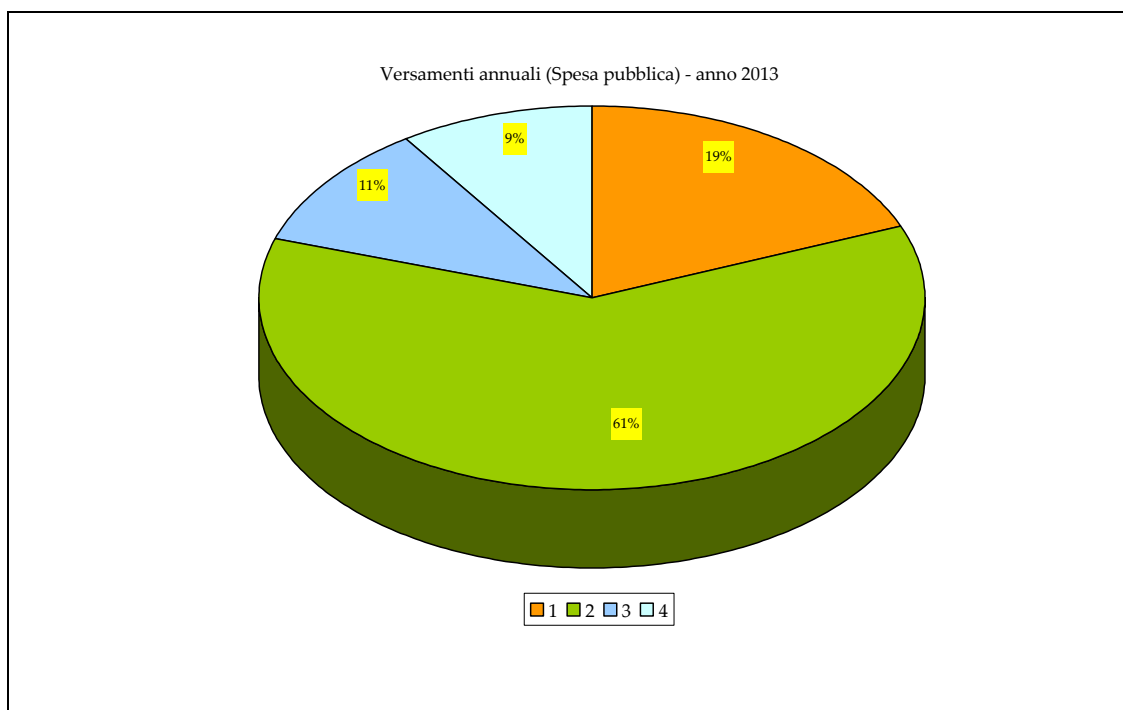


Il rapporto premi/totale liquidato nei sette anni di programmazione ha avuto l'evoluzione rappresentata nel grafico che segue.

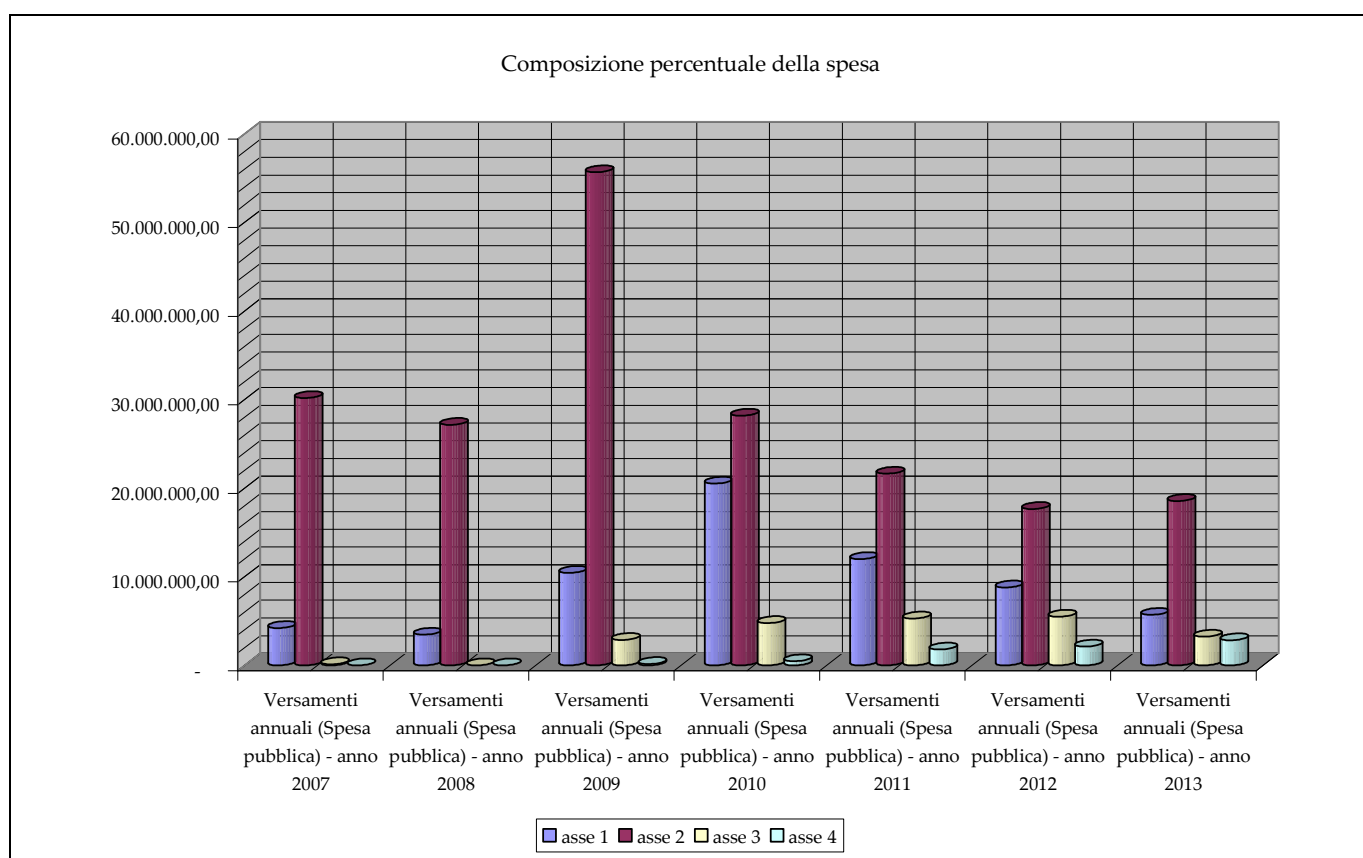

Il dato è molto positivo ed è un indice confortante del fatto che tutte le misure sono in grado di contribuire all'avanzamento finanziario del PSR ed al raggiungimento degli obiettivi strategici della programmazione 2007-2013. Nel corso del 2012 e del 2013 sono state attivate anche quelle misure più difficili, per le quali si era rilevato un ritardo durante i primi anni.

La spesa dei sette anni di programmazione ammonta a 293,310 milioni di €, pari all'88,83% della spesa prevista complessivamente. Si fa notare inoltre che la percentuale di avanzamento non include l'anticipo comunitario assegnato durante la fase iniziale della programmazione. La spesa sopra riportata si riferisce a domande reali effettivamente liquidate. Calcolando anche l'anticipo, si otterrebbe un tasso di realizzazione superiore.

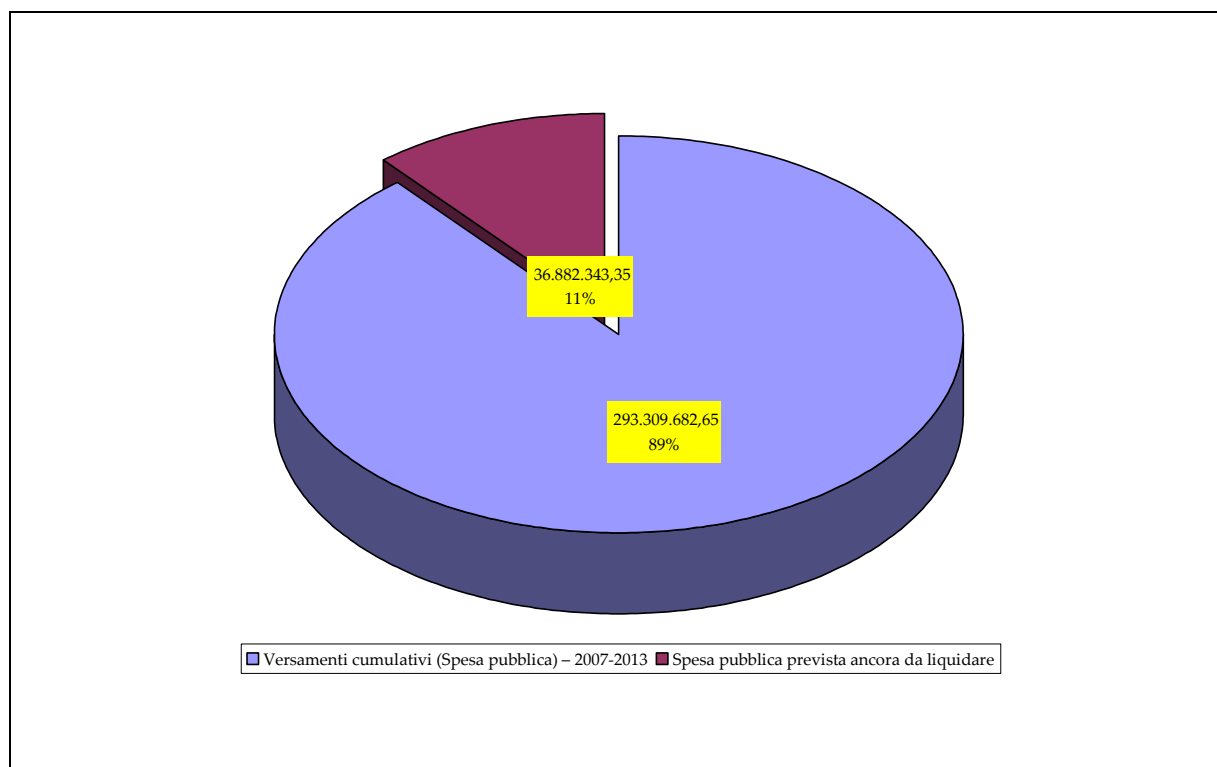

Anche se si evidenzia una riduzione del trend di spesa, il dato complessivo può essere giudicato in maniera positiva, dal momento che per raggiungere l'obiettivo di spesa entro il 2015 rimane da utilizzare solo l'11% delle risorse assegnate. Considerato che si è registrato in questi sette anni un tasso d'esecuzione medio annuo pari circa al 13% e che quasi la totalità delle risorse rimanenti risulta impegnata, si ritiene che nei prossimi due anni verrà rendicontata la spesa residua senza particolari criticità.

Per alcune misure del PSR (misure 112, 122, 124, 211, 226) già oggi è stato raggiunto quasi il 100% della disponibilità iniziale assegnata; per altre misure (misure 121, 214, 311) la spesa raggiungerà l'assegnazione probabilmente al termine del 2014; per le altre misure, soprattutto degli assi 3 e 4, sarà necessario anche il 2015 per completarne l'esecuzione finanziaria.

Sono proseguite inoltre le spese Top Up per le misure 211, 112 e 214-7. Si rimanda per un commento al precedente punto 2.2.2.4.


I trascinamenti si sono conclusi nel 2008 e gli importi previsti ma non utilizzati sono stati destinati a nuove domande nell'ambito delle misure di competenza.

In prospettiva, prima di entrare nel dettaglio delle spese 2013 per asse, da questi dati emerge in maniera chiara la capacità dell'Amministrazione provinciale di utilizzare i fondi comunitari assegnati. L'impossibilità di ricevere nel corso dell'attuale programmazione ulte-

riori fondi aggiuntivi, ha comportato un utilizzo importante delle risorse provinciali Top Up. In futuro un onere finanziario di tale proporzioni sarà insostenibile per la Provincia Autonoma di Bolzano. Si sottolinea come la componente “efficienza amministrativa” dovrebbe essere sempre considerata quale fattore premiante per le Amministrazioni regionali dimensionalmente più piccole.


Asse 1:

Per quanto riguarda l’asse 1, la spesa pubblica 2013 è stata di 5,700 milioni di €, interamente dedicata al sostegno di domande relative alle nuove misure del PSR. Non ci sono liquidazioni per trascinalenti dal vecchio periodo di programmazione. Le principali misure di investimento sono giunte quasi a conclusione oppure risultano in piena fase di realizzazione. Rispetto alle previsioni complessive, il dato cumulato di spesa dei sette anni di programma ha raggiunto per l’asse 1 il valore percentuale dell’82,38%.

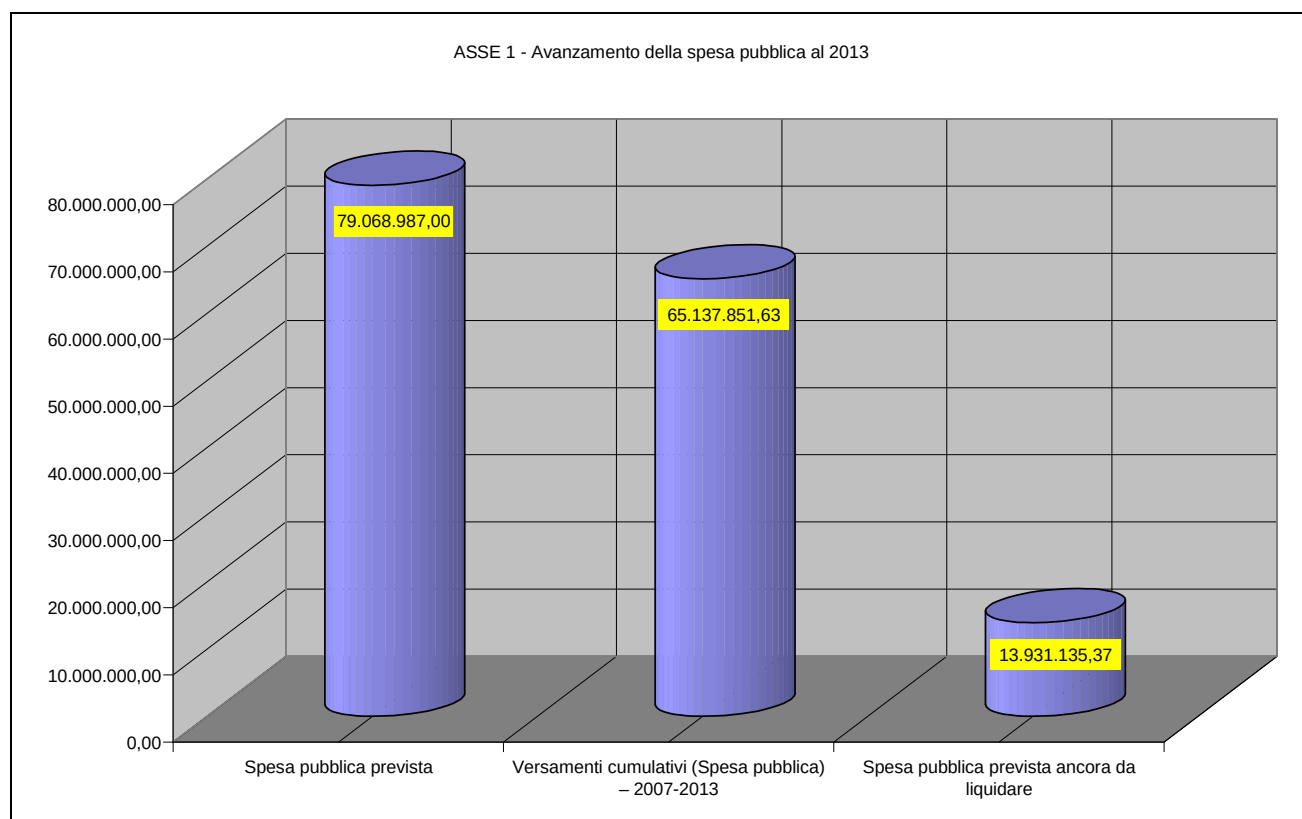


Asse 2:

La spesa 2013 per le misure dell’asse 2 ammonta a 18,554 milioni di €, mentre il dato complessivo per i sette anni è pari a 199,042 milioni di €: le spese relative alle misure volte all’ambiente ed al paesaggio rurali hanno quindi un avanzamento pari al 95,85% del totale della disponibilità complessiva. Da segnalare che anche per l’asse 2 non sono stati più liquidati aiuti per trascinalenti a partire dal 2009. Il fatto che si sia potuto liquidare il saldo del 2012 e l’anticipo del 2013 per le misure a superficie (211, esclusivamente con risorse provinciali top up, e 214) è un risultato molto positivo, che ha il significato per i responsabili della loro attuazione del raggiungimento dell’obiettivo e degli sforzi, amministrativi, finanziari, tecnici ed umani fatti a partire dal 2005-2006.

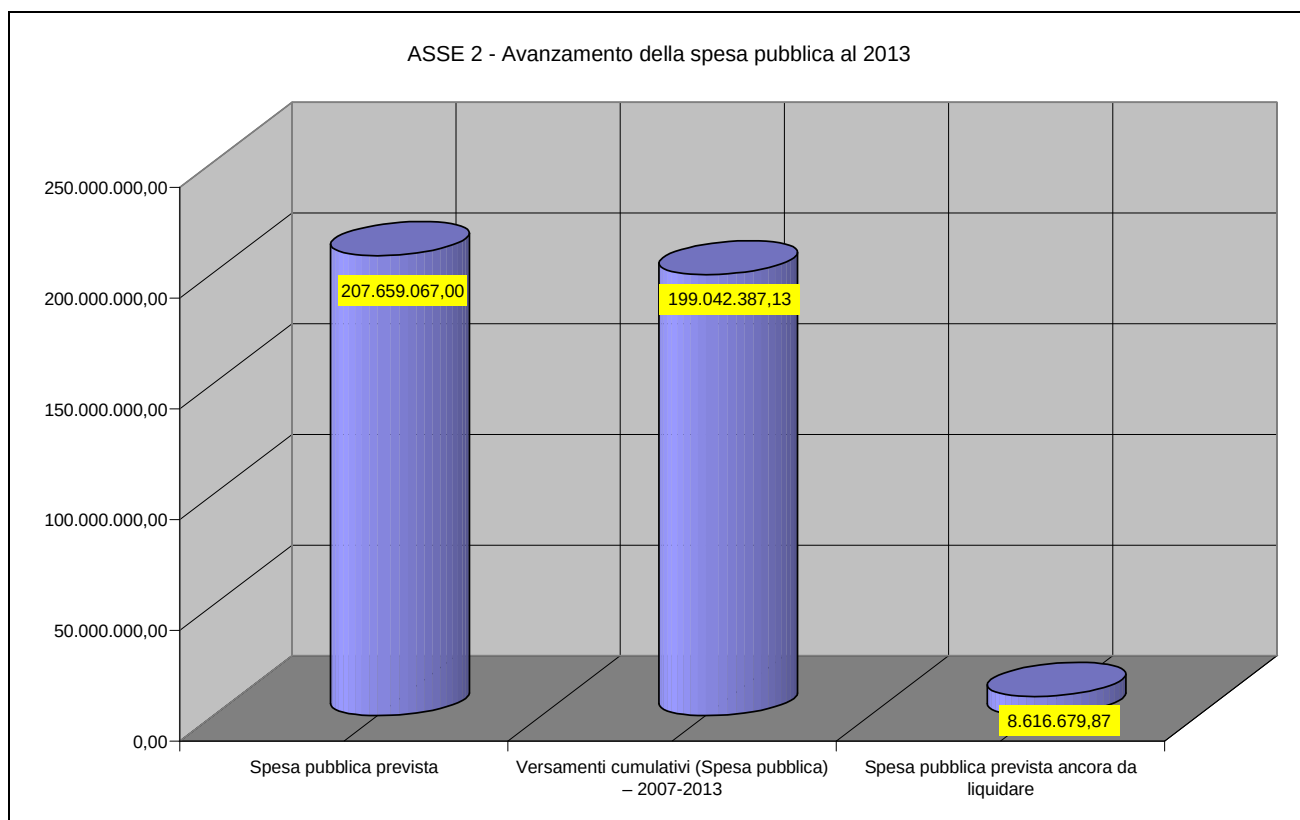

Asse 3:


Per l'asse 3, la spesa 2013 è risultata pari a 3,233 milioni di €. Il tasso di realizzazione dell'asse 3 risulta pari al 78,45%, inferiore quindi a quello degli assi 1 e 2, ma ancora sufficientemente positivo in considerazione del fatto che gli investimenti previsti per l'asse 3 sono localizzati in zona di montagna e possono beneficiare di una stagione estiva in cui ne è possibile la realizzazione molto breve. Si deve tener conto anche del fatto che parte delle misure in questione hanno come beneficiari i Comuni, che sono assoggettati a procedure amministrative particolarmente lunghe che presuppongono per l'approvazione dei singoli progetti da parte degli Enti pubblici locali l'avvenuta approvazione da parte dei servizi tecnici della Provincia Autonoma di Bolzano. Il timore che la crisi finanziaria in atto potesse ridurre la capacità di autofinanziamento dei Comuni, rallentandone la spinta agli investimenti, anche nell'ambito del PSR e determinando una diminuzione delle domande ed un aumento significativo dei tempi del procedimento amministrativo di ciascuna domanda dell'asse 3 è stato ridimensionato a partire dal 2011. In ogni modo, le spese residue dell'asse 3 ammontano ancora a circa 5,980 milioni di €: con il trend di spesa registrato negli ultimi anni è chiaro che le spese per le misure dell'asse 3 si protrarranno fino al 2015.

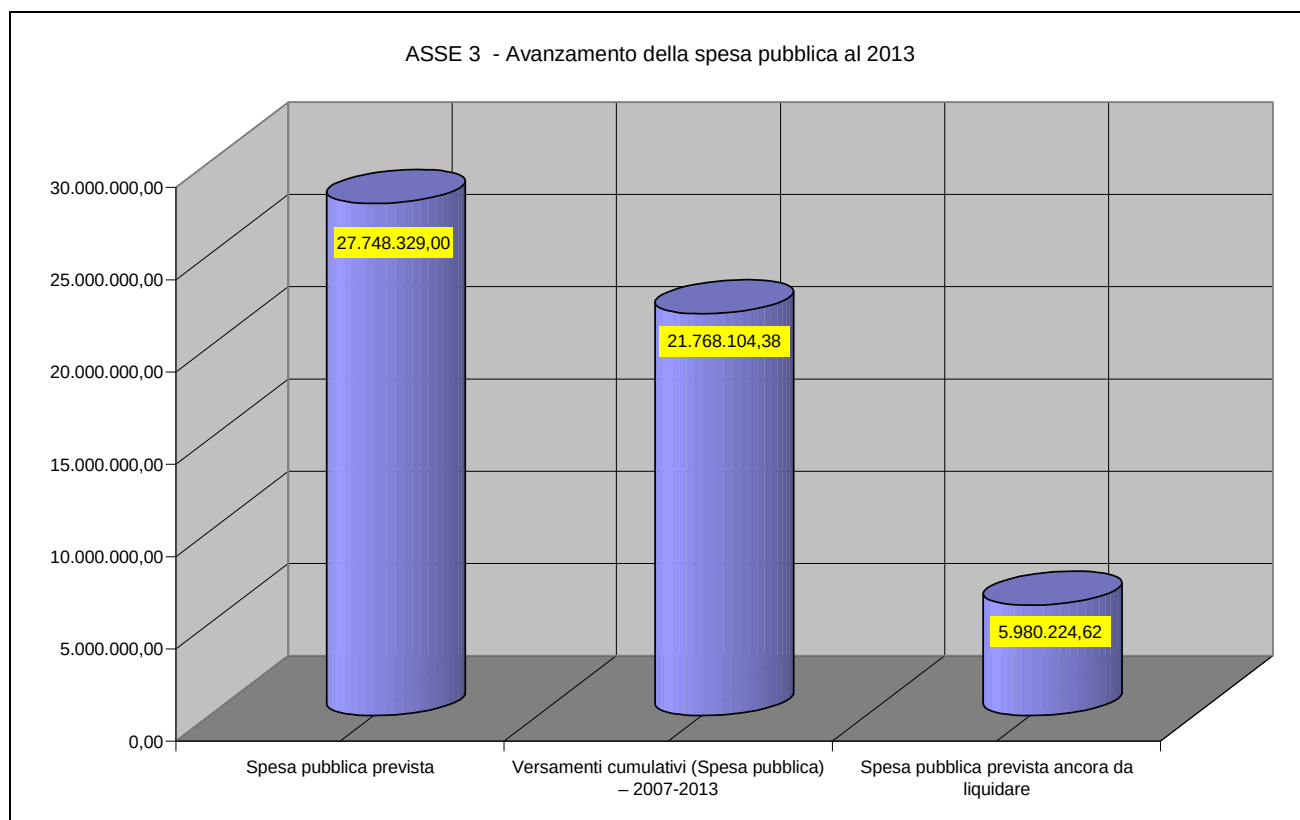

Asse 4:

Per l'asse 4 LEADER, è stato speso solamente il 46,84% della dotazione finanziaria totale, per una somma 2013 di 2.842.759,21 €. Quanto sottolineato per l'asse 3 vale ancor più per l'asse LEADER, in virtù dell'elevato numero di progetti pubblici previsti e della marginalità dei territori dei GAL. Ovviamente questo è l'asse più debole dal punto di vista finanziario e la persistente situazione di crisi socio-economica non ha aiutato i GAL nel proprio lavoro. Mentre le approvazioni dei progetti si sono svolte in maniera costante e positiva, consentendo di impegnare tutte le risorse assegnate, la fase di realizzazione continua ad evidenziare ritmi lenti. Va comunque sottolineato che la spesa LEADER è progressivamente cresciuta di anno in anno, grazie anche alla risoluzione della questione IVA non rendicontabile ed alla possibilità di erogare anticipi pari al 50%. Tuttavia, il livello di spesa dovrà necessariamente aumentare ancora nei prossimi due anni per garantire il completo utilizzo delle risorse dell'asse 4. Considerati i fondi ancora da liquidare entro il 2015, è necessario che la spesa media annuale si spinga verso il valore di 4,177 milioni di € per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo.

Dovrà essere fatto uno sforzo molto importante da parte dei GAL, dei beneficiari finali degli aiuti e dell'Amministrazione provinciale per permettere di raggiungere questo obiettivo ambizioso ma molto difficile.

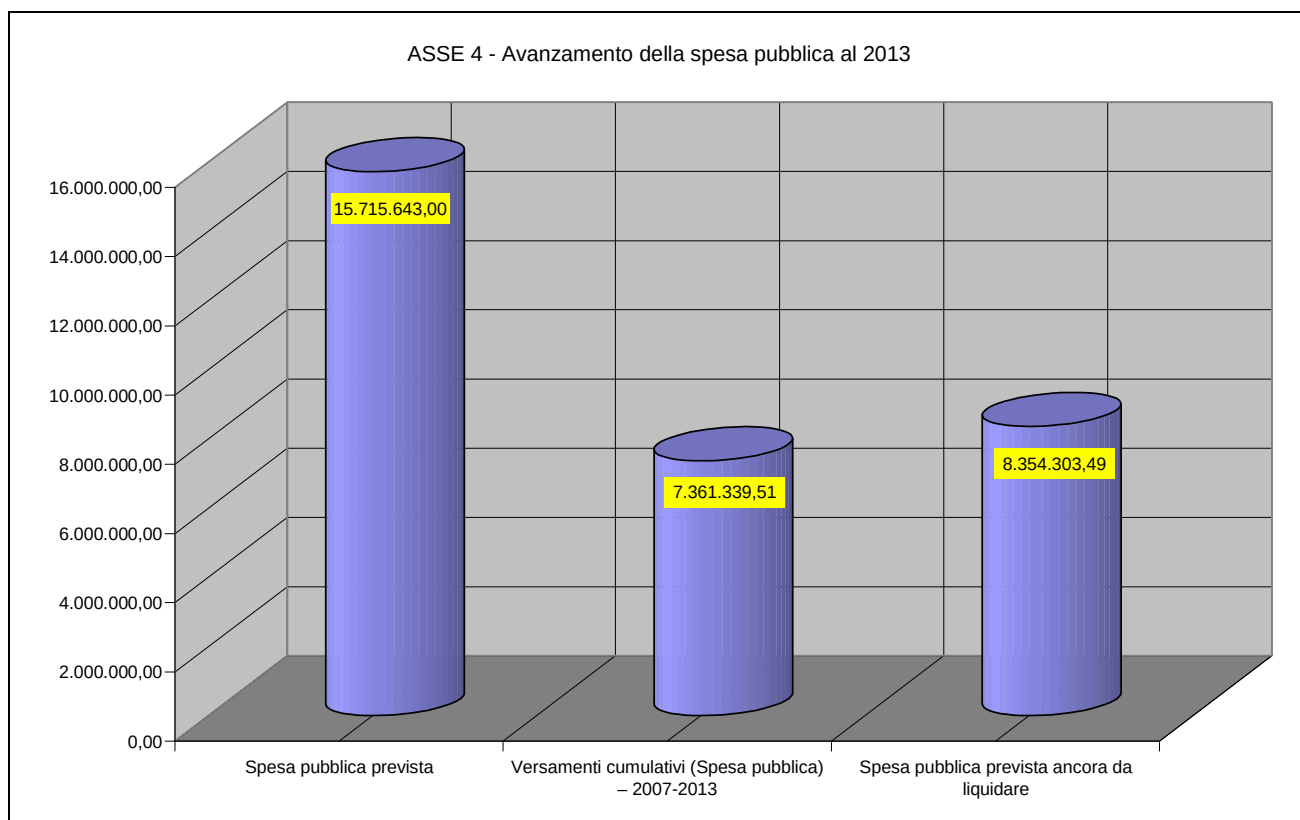

3.1.4. Spesa per asse effettivamente sostenuta a livello nazionale (Amministrazione provinciale) – risorse ordinarie:

La seguente tabella riassume la spesa pubblica (quota ordinaria) dell'anno solare 2013 per ciascuno dei quattro assi del Programma:

Tabella di sintesi per asse delle spese *effettivamente sostenute* (risorse ordinarie) negli anni 2007 - 2013 *per anno solare*:

Misura/Asse	Spesa pubblica prevista	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2007	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2008	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2009	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2010
Totale asse 1	74.722.519,00	4.219.848,85	3.470.712,23	10.443.319,21	20.515.616,77
di cui spese per nuove domande		-	3.464.100,00	10.443.319,21	20.515.616,77
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		4.219.848,85	6.612,23	-	-
Totale asse 2	193.982.399,00	30.177.970,77	27.152.811,25	55.668.576,31	25.741.569,80
di cui spese per nuove domande		-	26.921.752,35	55.668.576,31	25.741.569,80
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		30.177.970,77	231.058,90	-	-
Totale asse 3	27.748.329,00	117.600,00	-	2.874.928,38	4.769.560,04
di cui spese per nuove domande		-	-	2.874.928,38	4.769.560,04
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		117.600,00	-	-	-
Totale asse 4	15.715.643,00	-	-	147.000,00	461.250,00
di cui spese per nuove domande		-	-	147.000,00	461.250,00
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		-	-	-	-
TOTALE	312.168.890,00	34.515.419,62	30.623.523,48	69.133.823,90	51.487.996,61

COMPLESSIVO (fondi)

ordinari)					
di cui spese per nuove domande		-	30.385.852,35	69.133.823,90	51.487.996,61
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006		34.515.419,62	237.671,13	-	-

Misura/Asse	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2011	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2012	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2013	Tasso di realizzazione finanziaria del PSR (spesa pubblica 2007/2013 sul previsto)	Versamenti cumulativi (Spesa pubblica) – 2007/2013
Totale asse 1	9.593.191,27	7.911.811,30	5.415.259,59	82,20%	61.569.759,22
di cui spese per nuove domande	9.593.191,27	7.911.811,30	5.415.259,59		57.343.298,14
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	-	-		4.226.461,08
Totale asse 2	18.204.686,87	14.291.180,21	15.036.915,21	96,12%	186.273.710,42
di cui spese per nuove domande	18.204.686,87	14.291.180,21	15.036.915,21		155.864.680,75
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	-	-		30.409.029,67
Totale asse 3	5.283.838,52	5.489.466,96	3.232.710,48	78,45%	21.768.104,38
di cui spese per nuove domande	5.283.838,52	5.489.466,96	3.232.710,48		21.650.504,38
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	-	-		117.600,00
Totale asse 4	1.793.253,71	2.117.076,59	2.842.759,21	46,84%	7.361.339,51
di cui spese per nuove domande	1.793.253,71	2.117.076,59	2.842.759,21		7.361.339,51
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	-	-		-
TOTALE COMPLESSIVO (fondi ordinari)	34.874.970,37	29.809.535,06	26.527.644,49	88,73%	276.972.913,53
di cui spese per nuove domande	34.874.970,37	29.809.535,06	26.527.644,49		242.219.822,78
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006	-	-	-		34.753.090,75

La spesa pubblica ordinaria liquidata nel corso del 2013 ammonta a 26,528 milioni di €. Possono considerarsi valide le considerazioni generali fatte per il totale delle spese sostenute, a cui si rimanda.

La spesa dei sette anni di programmazione ammonta a 276,973 milioni di €, pari all'88,73% della spesa ordinaria prevista complessivamente. Anche in questo caso la percentuale di avanzamento esclude l'anticipo comunitario assegnato durante la fase iniziale della programmazione: la spesa sopra riportata si riferisce a domande reali effettivamente liquidate.

Asse 1:

Per quanto riguarda l'asse 1, la spesa pubblica ordinaria 2013 è stata di 5,415 milioni di €, interamente dedicata al sostegno di domande relative alle nuove misure del PSR. Non ci sono liquidazioni per trascinalenti dal vecchio periodo di programmazione. Rispetto alle

previsioni complessive, il dato cumulato di spesa dei sette anni di programma ha raggiunto per l'asse 1 il valore percentuale dell'82,20%.

Asse 2:

La spesa ordinaria 2013 per le misure dell'asse 2 ammonta a 15,037 milioni di €, mentre il dato complessivo dei sette anni è pari a 186,274 milioni di €: le spese ordinarie relative alle misure volte all'ambiente ed al paesaggio rurali hanno quindi un avanzamento pari al 96,12% del totale della disponibilità complessiva. Da segnalare che anche per l'asse 2 non sono stati più liquidati aiuti per trascinamenti a partire dal 2009.

Asse 3:

Per l'asse 3, la spesa ordinaria 2013 è risultata pari a 3,233 milioni di €: il tasso di realizzazione dell'asse 3 risulta pari al 78,45%. Per l'asse 3 sono previste esclusivamente risorse ordinarie.

Asse 4:

Per l'asse 4 LEADER, è stato speso il 46,84% della dotazione finanziaria totale, per una somma 2013 di 2,843 milioni di €. Anche per l'asse 4 sono previste esclusivamente risorse ordinarie.

3.1.5. Spesa per asse effettivamente sostenuta a livello nazionale (Amministrazione provinciale) – risorse Health Check:


La seguente tabella riassume la spesa pubblica (quota Health Check) dell'anno solare 2013 per ciascuno dei quattro assi del Programma:

Tabella di sintesi per asse delle spese *effettivamente sostenute* (risorse Health Check) negli anni 2007 - 2013 *per anno solare*:


Misura/Asse	Spesa pubblica prevista	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2007	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2008	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2009	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2010
Totale asse 1	4.166.667,00	-	-	-	-
Totale asse 2	13.856.667,00	-	-	-	2.444.075,90
Totale asse 3	-	-	-	-	-
Totale asse 4	-	-	-	-	-
TOTALE COMPLESSIVO (fondi Health Check)	18.023.334,00	-	-	-	2.444.075,90

Misura/Asse	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2011	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2012	Versamenti annuali (Spesa pubblica) - anno 2013	Tasso di realizzazione finanziaria del PSR (spesa pubblica 2007/2013 sul previsto)	Versamenti cumulativi (Spesa pubblica) – 2007/2013
Totale asse 1	2.403.585,65	880.106,76	284.400,00	85,63%	3.568.092,41
Totale asse 2	3.438.450,21	3.369.310,69	3.516.839,91	92,15%	12.768.676,71
Totale asse 3	-	-	-	-	-
Totale asse 4	-	-	-	-	-
TOTALE COMPLESSIVO (fondi Health Check)	5.842.035,86	4.249.417,45	3.801.239,91	90,64%	16.336.769,12


Nel corso del 2013 sono state effettuate spese relative alle operazioni Health Check, sia per la misura 214 (intervento 1), appartenente all'asse 2, che per la misura 121 dell'asse 1: le risorse HC liquidate nel 2013 sono pari a 3,801 milioni di €. Complessivamente, il tasso di utilizzo delle risorse Health Check è finora pari al 90,64% delle previsioni con 16,337 milioni di spesa pubblica sostenuta.

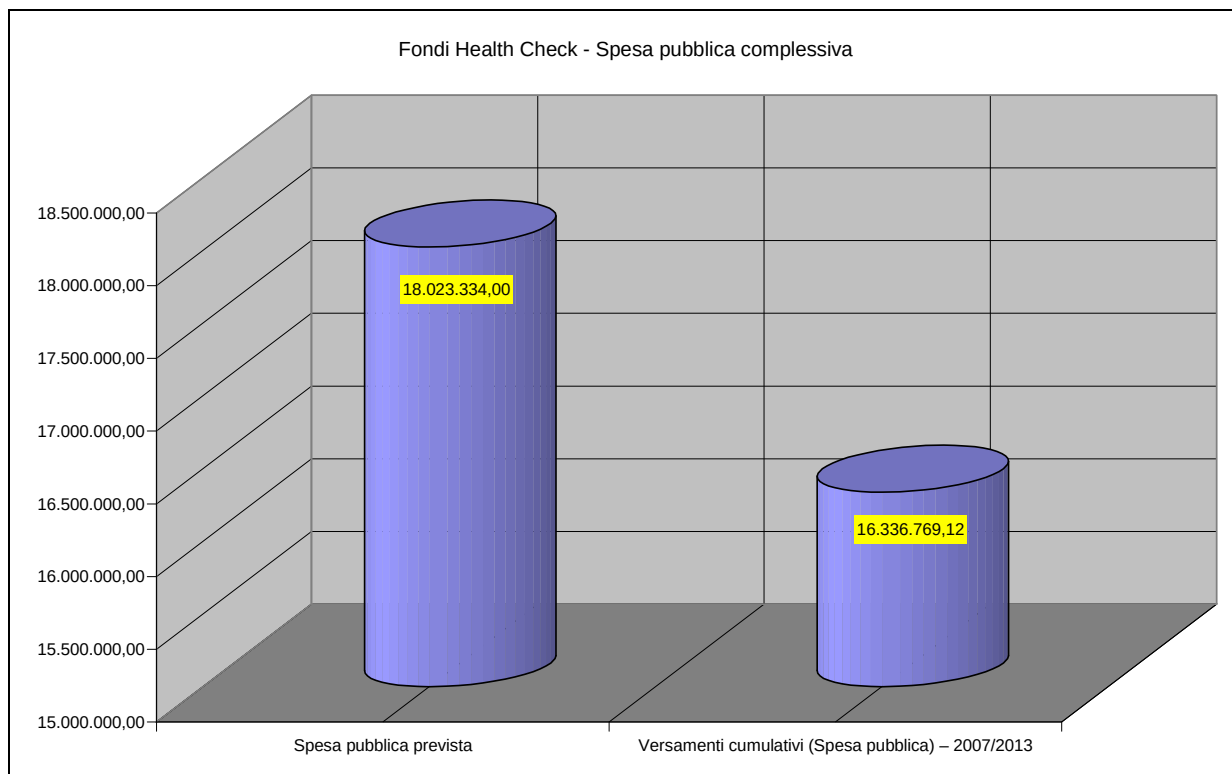

Per quanto riguarda l'asse 1, la spesa effettuata è pari a 0,284 milioni di € nel 2013 e a 3,568 milioni di € in totale, per un valore percentuale pari all'85,63% dell'importo HC assegnato all'asse 1.

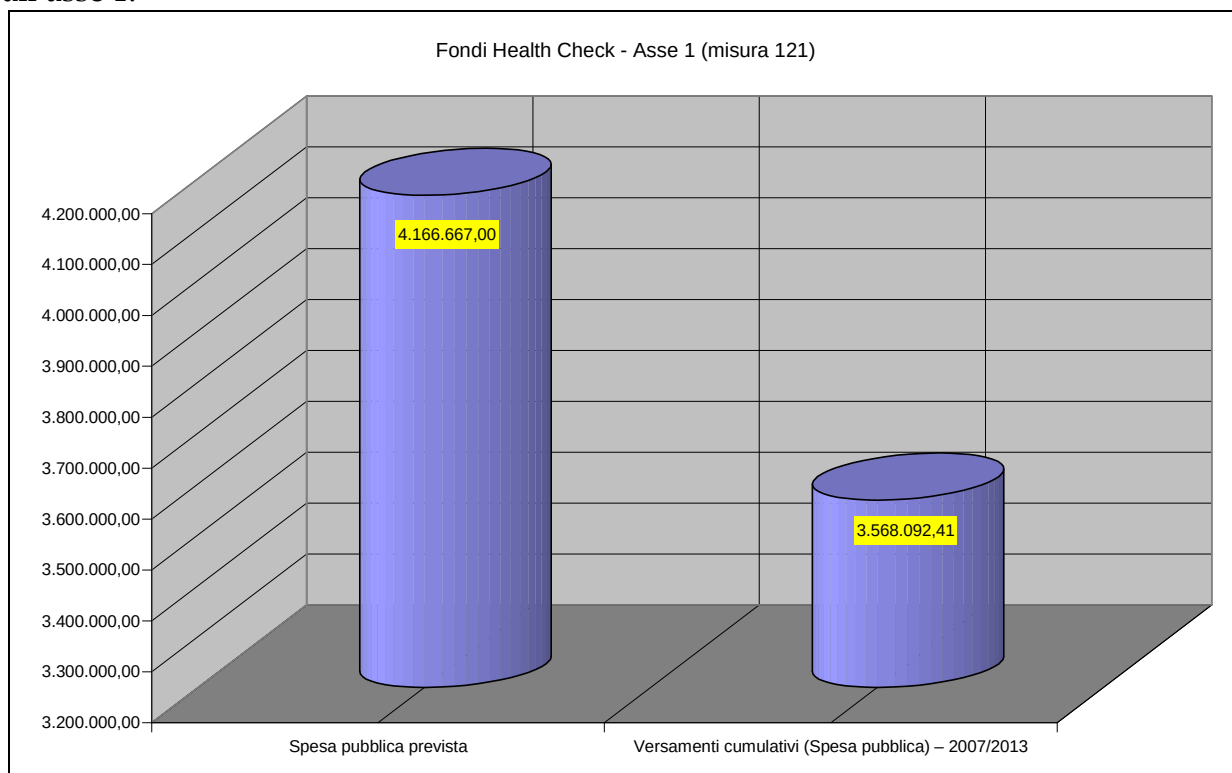

Per quanto riguarda l'asse 2, la spesa effettuata è pari a 3,517milioni di € nel 2013 ed a 12,769 milioni di € in totale, per un valore percentuale pari al 92,15% dell'importo HC assegnato all'asse 2.

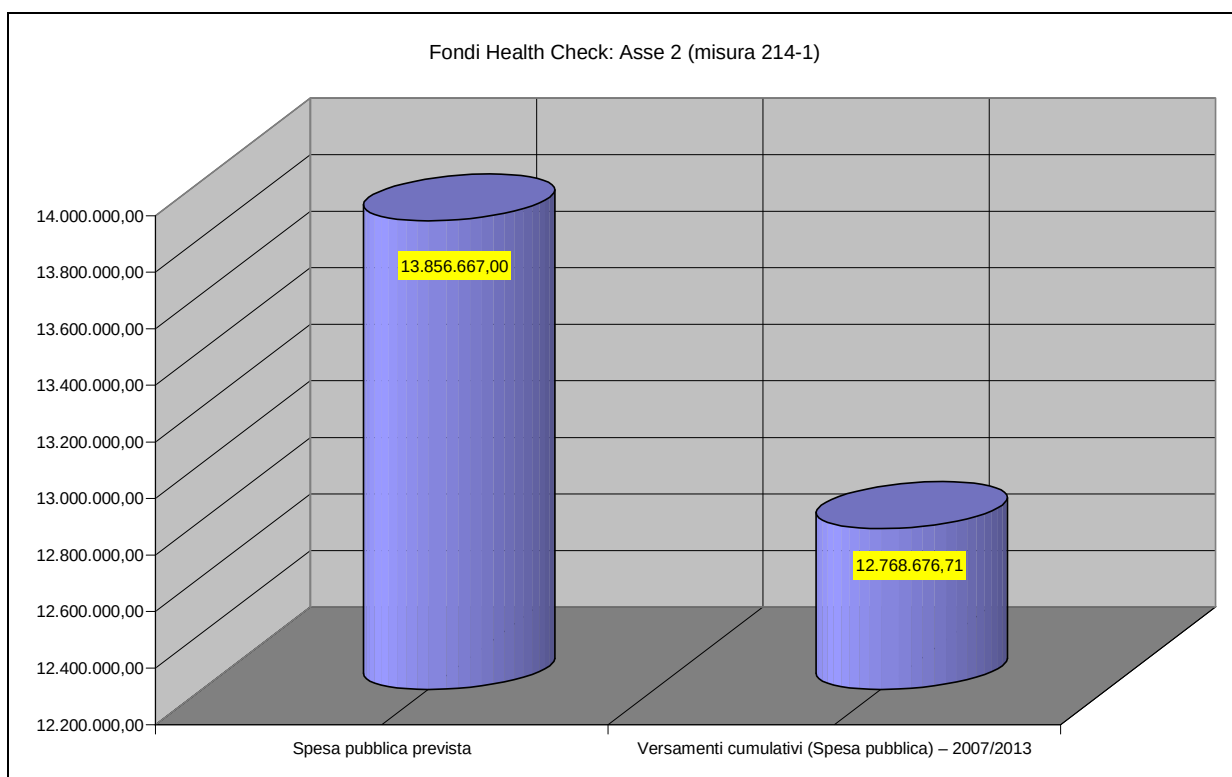

3.2. Liquidazioni effettuate sul bilancio comunitario 2013:

Nel seguente capitolo si presenta un commento dei dati ufficiali della Commissione Europea relativi all'esecuzione finanziaria del PSR per l'anno solare 2013. Le tabelle ufficiali a cui si riferiscono le considerazioni sono riportate in allegato alla presente relazione.

3.2.1. Impegni comunitari, piano finanziario in vigore e regola $n + 2$:

3.2.1.1. Tab. I.: Financial Overview 2007-2013:

Impegni comunitari anno 2013:

Gli impegni assunti nel 2013 dalla Commissione Europea per l'anno 2013 sono pari a 21.722.000,00 €. Complessivamente la CE ha impegnato nei sette anni di programmazione l'importo di 148.205.000,00 €: si tratta del 100,00% del totale delle risorse comunitarie previste per il PSR.

Anticipo comunitario:

LA CE ha completato già nel corso del 2008 l'erogazione dell'anticipo della propria quota di cofinanziamento, che complessivamente ammonta a 9.630.250,00 €. L'ulteriore anticipo di 807.520,00 €, erogato dopo l'approvazione del rifinanziamento Health Check del 2009, è stato revocato successivamente nel corso del 2011.

La somma corrispondente all'anticipo, benché da considerare come effettivamente liquidata da parte della Commissione Europea, rimarrà a disposizione dell'Organismo Pagatore riconosciuto per la Provincia Autonoma di Bolzano per la liquidazione di domande di pagamento effettive che dovranno pervenire entro il termine stabilito per le liquidazioni del PSR. In altre parole, come nel precedente periodo di programmazione 2000-2006, la Provincia Autonoma di Bolzano dovrà comunque provvedere a coprire con domande reali l'importo dell'anticipo comunitario versato, pena la sua restituzione. Di tale importo non si è tenuto conto in tutte le tabelle della presente RAE (escluso quelle del presente capitolo 3.2): le spese presentate sono al netto di qualsiasi anticipo comunitario e si riferiscono esclusivamente a liquidazioni di aiuti di domande effettivamente pervenute all'Amministrazione provinciale.

Liquidazioni anno solare 2013:

Per pagamenti effettivi nel corso dell'anno solare 2013 sono stati liquidati dal FEASR aiuti per 13.981.291,41 € (la somma deriva dal seguente calcolo: importo UE pagato anno finanziario 2013 [Q4 2012 fino a Q3 2013], pari a 13.934.963,68 € + importo in corso di pagamento al 31.12.2012, pari a 46.327,74€).

Il dettaglio dei pagamenti UE verrà analizzato commentando le successive tabelle. Complessivamente la spesa comunitaria effettivamente liquidata nei sette anni di programmazione è pari a 134.858.887,24 €.


La spesa totale della CE è pari al 90,99% della quota comunitaria complessivamente assegnata al PSR per tutto il periodo di programmazione, comprensiva dei fondi aggiuntivi Health Check (148.205.000,00 €).

Ovviamente, essendosi concluso il settimo anno di programma, la spesa comunitaria sostenuta nel periodo 2007-2013 risulta anche essere pari al 90,99% dell'importo UE impegnato nello stesso periodo di tempo (148.205.000,00 €).

Regola del disimpegno automatico n + 2 - anno finanziario 2013 e periodo di programmazione 2007-2013:

Dalla seconda parte della tabella I. della Commissione Europea è possibile ricavare indicazioni preziose circa il rischio dell'utilizzo del disimpegno automatico previsto dalle norme comunitarie.

La percentuale di raggiungimento della spesa comunitaria prevista per l'anno finanziario 2013 è pari al 38,56%: per raggiungere l'obiettivo del 100% della spesa dell'anno 2013 restano ancora da pagare 13.346.112,76 € di quota comunitaria. Essendo la dichiarazione di spesa già inoltrata alla CE relativa al quarto trimestre 2013 pari a 6.481.748,46 €, rimangono complessivamente da rendicontare entro l'anno 2015 6.864.364,30 €. Il grafico seguente illustra la situazione.

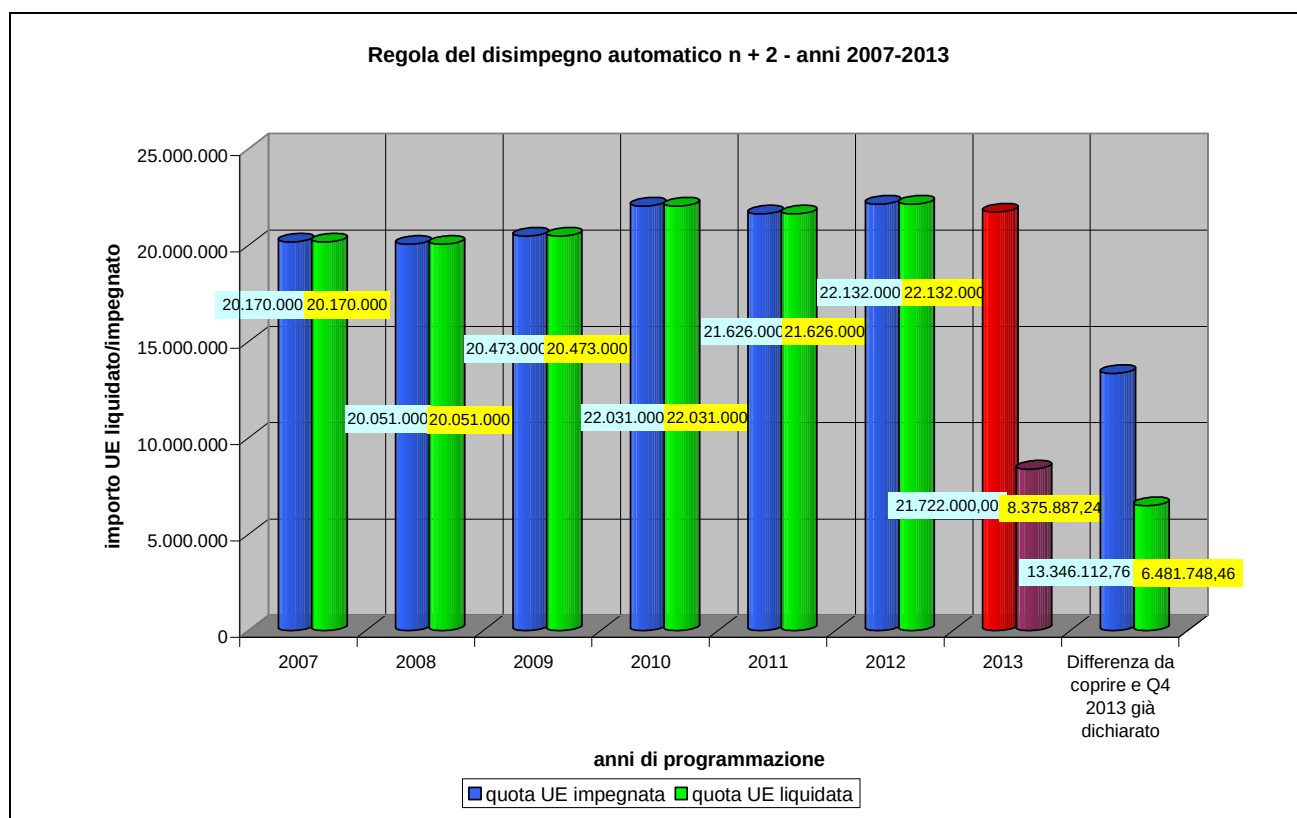

Commento sull'andamento degli anni finanziari 2007 - 2013:

L'Autorità di Gestione giudica positivamente la situazione complessiva del Programma, in virtù del fatto che nessun anno intermedio dell'attuale programmazione è stato interessato dal rischio di disimpegno.

Sembra più importante, a questo punto della programmazione, evidenziare gli aspetti fondamentali legati alla chiusura della programmazione 2007 - 2013. La chiusura del PSR sarà

un processo che si dovrà completare negli anni 2014 e 2015. Con riferimento al 31.12.2013, la quota comunitaria ancora da liquidare per l'intero PSR è pari complessivamente alla quota residuale dell'annualità 2013 (6.864.364,30 €) ed all'importo degli anticipi comunitari inizialmente erogati (9.630.250,00 €), per un totale di 16.494.614,30 €. La corrispondente spesa pubblica complessiva da spendere in questi due anni è pari a 36.882.343,35 € (cioè l'11,2% delle risorse assegnate), per un importo medio di circa 18,4 milioni di € l'anno (un 5-6% all'anno). Una prima considerazione è quella che gli anticipi comunitari aiutano l'avanzamento della spesa negli anni intermedi ed il rispetto della regola $n + 2$, ma possiedono, proprio per questa rendicontazione fittizia, un carattere illusorio che rende più difficile la conclusione della programmazione.

Rapportando la spesa annua ancora da effettuare con quella annua già realizzata, l'obiettivo del pieno utilizzo delle risorse comunitarie per la programmazione pare ambizioso ma complessivamente raggiungibile. Una parte dei fondi disponibili (circa il 23% del totale) sono destinati alla liquidazione di domande relative alla misura 214. Nel dettaglio, 5,8 milioni di € verranno liquidati entro giugno per pagare relativamente alla campagna 2013 sia l'anticipo per alcune domande residuali (0,7 milioni di €) che il saldo per circa 9.000 domande (5,1 milioni di €). I fondi rimanenti saranno completamente utilizzati entro il 2015 per pagare in parte il saldo relativo a campagne precedenti (2010, 2011 e 2012) ed il saldo delle domande della campagna 2013 sottoposte a controllo in loco.

Per le misure di investimento sono circa 28 milioni di € in due anni i fondi ancora da spendere, per 14 milioni circa di spesa pubblica all'anno: si tratta di circa il 77% del totale delle risorse non ancora rendicontate. Alcune misure di fatto si sono già concluse con il pieno utilizzo delle risorse assegnate, altre misure di investimento sono ancora in piena fase di realizzazione.

Se i progetti delle misure 115, 123, 125, 311, 321 e 413 verranno portati a termine secondo la cronologia stimata, salvo imprevisti al momento non quantificabili, dovrebbero essere utilizzate tutte le risorse pubbliche ancora non spese.

Per altre misure di investimento (111, 133, 227, 313, 323, 411 e 421), che rappresentano circa il 10% delle risorse pubbliche ancora da rendicontare, segnaliamo una maggiore difficoltà legata alle particolarità delle iniziative ammesse e alla ridotta massa finanziaria di ciascuna domanda prevista. Confortante è in ogni caso il fatto che per queste misure sono in fase di attuazione domande già approvate. L'Autorità di Gestione dovrà monitorare con accortezza l'avanzamento delle iniziative, adoperandosi affinché le domande di pagamento giungano con la tempistica prevista.

In conclusione, esistono le premesse per una conclusione positiva del PSR; il successo della programmazione 2007 - 2013 non sarà in ogni caso legato al raggiungimento del 100% della spesa in modo contabile ed aritmetico, ma al livello di aderenza delle misure in programma con le esigenze del territorio e del sistema agricolo – forestale provinciali.

3.2.1.2. Tab. II.1.: *Financial Plan by year in force at 31/12/2013:*

La tabella riporta il piano finanziario FEASR per anno approvato il 28 ottobre 2013. Sono distinte nella tabella le risorse ordinarie da quelle Health Check.

3.2.1.3. *Tab. II.2.: Financial plan by axis and type of region in force at 31/12/2013:*

Si tratta del piano finanziario per asse, suddiviso tra risorse ordinarie e risorse da destinare alle nuove sfide comunitarie Health Check. In seguito alla modifica del PSR approvata il 28 ottobre 2013 con Decisione della Commissione Europea è stato ripristinato al 44,00% il tasso di cofinanziamento dell'asse 1 (risorse ordinarie), che risultava in precedenza pari al 44,05% a causa del Provvedimento attuativo della Delibera CIPE 2012 di assegnazione dei fondi statali relativi alle risorse comunitarie Health Check.

Il tasso di cofinanziamento delle risorse Health Check rimane invariato al 60%.

3.2.1.4. *Tab. II.3.: Financial plan by rural development measures:*

È il piano finanziario complessivo (risorse ordinarie + HC) per misura del PSR, che è stato approvato con Decisione della Commissione Europea il 28 ottobre 2013. È il piano finanziario in vigore e include anche le risorse aggiuntive Health Check assegnate nel 2009.

3.2.2. *Dichiarazioni della spesa pubblica sostenuta da parte dell'Organismo pagatore:*

3.2.2.1.a *Tab. III.1.: Public Expenditure incurred in 2013, Annual summary of declarations Q1 to Q4 2013 (Health Check):*

La tabella sintetizza, per misura (Bolzano è tutto in non convergenza), le dichiarazioni di spesa effettuate dall'Organismo Pagatore di Bolzano nel corso dell'anno solare 2013 relative alle risorse Health Check. I dati della tabella coincidono con i dati riportati nelle tabelle precedenti (vedi punti 2.2.2.3 e 3.1.5).

La somma totale della spesa pubblica HC dichiarata alla CE nel corso dell'anno solare 2013, al netto delle correzioni e dei recuperi, ammonta a 3.801.239,91 €, a cui corrisponde una quota comunitaria di 2.280.743,95 €.

Come già scritto, si tratta di liquidazioni relative alle misure 121 e 214, intervento 1.

3.2.2.1.b *Tab. III.1.: Public Expenditure incurred in 2013, Annual summary of declarations Q1 to Q4 2013 (Non-Convergence Regions and Total all types of Regions):*

La tabella sintetizza, per misura (Bolzano è tutto in non convergenza), le dichiarazioni di spesa effettuate dall'Organismo Pagatore di Bolzano nel corso dell'anno solare 2013 relative alle risorse ordinarie.

Rimandando ai commenti già presentati nei capitoli precedenti, sono da sottolineare due aspetti molto soddisfacenti ed importanti: anche nel 2013 sono state dichiarate spese pubbliche per 16 misure del PSR; la spesa pubblica dichiarata raggiunge i 26,5 milioni di €.

La spesa pubblica ordinaria dichiarata, al netto delle correzioni e dei recuperi, ammonta a 26.527.644,49 € (la corrispondente quota UE è pari a 11.674.944,63 €).

La spesa dichiarata per l'asse 2 è il 57% del totale: l'asse 1 e l'asse 3 hanno contribuito per quasi la metà della spesa. Ciò denota un buon equilibrio tra misure di investimento e misure a superficie.

3.2.2.1.c Tab. III.1.: Public Expenditure incurred in 2013, Annual summary of declarations Q1 to Q4 2013 (Non-Convergence Regions and Total all types of Regions):

La tabella sintetizza, per misura (Bolzano è tutto in non convergenza), le dichiarazioni di spesa effettuate dall'Organismo Pagatore di Bolzano nel corso dell'anno solare 2013 relative al totale delle risorse (ordinarie ed HC).

La spesa pubblica totale dichiarata, al netto delle correzioni e dei recuperi, ammonta a 30.328.884,40 € (la corrispondente quota UE è pari a 13.955.688,58 €).

3.2.2.2. Tab. III.2.: Declarations of Expenditure Q4 2012 to Q4 2013, Public expenditure declared by quarter:

Una precisazione per chi legge é d'obbligo: l'anno finanziario 2013 include le spese sostenute nei trimestri Q4 2012 – Q3 2013, mentre l'anno solare 2013 include le spese dei trimestri Q1 2013 – Q4 2013. Gli importi della tabella includono sia le risorse ordinarie che quelle HC. Nell'anno finanziario 2013 la spesa pubblica dichiarata è pari a 30.402.288,90 €; nell'anno solare 2013 la spesa pubblica dichiarata è pari a 30.328.884,40 €.

Interessante evidenziare la distribuzione della spesa dichiarata nel corso dell'anno: essa si concentra essenzialmente nel terzo e nel quarto trimestre dell'anno, allorché vengono effettuate le liquidazioni dei premi a superficie. Minori sono le spese nel rimanente periodo dell'anno.

3.2.2.3. Tab.III.3.: Public Expenditure declared by RD measure (%):

La tabella contiene dati interessanti: le prime due colonne evidenziano il valore in € e l'importanza percentuale della spesa pubblica dichiarata (risorse ordinarie + HC) per misura nel corso dell'anno solare 2013. Si ritrova la stessa cifra delle tabelle precedenti (30.328.884,40 €); la distribuzione della spesa per asse ed il suo sostanziale equilibrio emergono dai dati della seconda colonna, da cui emerge il 61,18% dell'asse 2, il 18,79% dell'asse 1, il 10,66% dell'asse 3 ed il 9,37% dell'asse 4.

Le ultime due colonne riportano la spesa pubblica dichiarata complessivamente a partire dal primo anno di programmazione (Q4 2006-Q4 2013): venti sono le misure che hanno generato spesa pubblica, la quale ammonta in totale a 294.706.665,22 €.

Il dato storico relativo alla spesa pubblica dichiarata (vedi anche tab. V.I) include una doppia dichiarazione di spesa per le misure 122 e 226 rispettivamente 83.540,42 € e 1.313.442,15 €. Questa spesa è stata dichiarata una prima volta nel corso del 2007 (Q4 2007): a causa del superamento della stima dei trascinamenti previsti nel PSR per queste misure, la rendicontazione ed il rimborso comunitario furono temporaneamente sospesi fino all'avvenuta modifica della tabella 5.2 del PSR. Successivamente la stessa per le due misure è stata nuovamente presentata alla CE nel secondo trimestre del 2008 (Q2 2008), dopo l'approvazione della modifica del PSR e dell'aggiornamento degli importi della tabella dei trascinamenti.

La doppia contabilizzazione da parte della CE determina una spesa pubblica complessiva dichiarata superiore (294.706.665,22 €) rispetto a quella reale (293.309.682,65 €): sottraendo gli importi rendicontati due volte per le misure 122 e 226 (83.540,42 € e 1.313.442,15 €), il dato netto coincide con quello della tabella del capitolo 3.0.

3.2.3. Pagamenti comunitari:

3.2.3.1. Tab. IV.1.: EAFRD payments by measure, Annual Summary Q1 2013 to Q4 2013:

La tabella riporta, per misura, le spese FEASR per l'anno solare 2013 richieste ed effettivamente sostenute: la spesa comunitaria per l'anno solare 2013 è di 13.955.688,22 €, con una differenza di 0,36 € tra spese dichiarate e liquidate. L'importo è la somma delle risorse ordinarie e di quelle HC.

3.2.3.2. Tab. IV.2.: EAFRD contribution paid by quarter Q4 2012 to Q4 2013:

La tabella in questione evidenzia la quota comunitaria effettivamente liquidata nel corso dei 5 trimestri a partire dal 16 ottobre 2012 (risorse ordinarie e risorse HC). Il periodo Q4 2012 – Q3 2013 rappresenta l'anno finanziario comunitario 2013, mentre i trimestri Q1 - Q4 2013 rappresentano, come già detto, l'anno solare 2013.

Anno finanziario 2013: complessivamente la quota comunitaria liquidata ammonta a 13.934.963,68 €.

Anno solare 2013: complessivamente la quota comunitaria liquidata ammonta a 13.955.688,22 €.

Il rimborso CE si riferisce alle misure 111, 112, 121, 122, 123, 124, 125, 133, 211, 214, 226, 227, 311, 313, 321, 323, 411, 413 e 431. Si rimanda al precedente capitolo 3.0 per un'analisi di tipo qualitativo sulla composizione della spesa sostenuta nel corso dell'anno solare 2013.

3.2.3.3. Tab. IV.3.: Total EAFRD payments by measure for the financial and calendar year:

La tabella sintetizza, per misura, le spese FEASR sia per il bilancio 2013 che per l'anno solare 2013 riportate anche nella tabella precedente: la prima ammonta complessivamente a 13.934.963,68 €, mentre la seconda è pari a 13.955.688,22 €.

3.2.4. Dati storicizzati a partire dal quarto trimestre 2006:

3.2.4.1.a Tab. V.1.: Historic of public expenditure declared by measure Q4 2006 to Q4 2013 (Non-Convergence Regions and Total all types of Regions):

La tabella riassume le dichiarazioni di spesa effettuate dall'inizio della programmazione (meglio: dopo l'approvazione del PSR con le risorse aggiuntive) al quarto trimestre 2013 per le risorse Health Check.

Dal Q4 2010 al Q4 2013 le due misure (121 e 214-1) che possono beneficiare dei fondi HC hanno visto liquidazioni regolari che portano il totale della spesa pubblica HC dichiarata finora a 16.336.769,12 € (quasi il 91% del totale).

3.2.4.1.b Tab. V.1.: Historic of public expenditure declared by measure Q4 2006 to Q4 2013 (Non-Convergence Regions and Total all types of Regions):

Le colonne Q3 2007 - Q3 2008 riportano le dichiarazioni di spesa sostenute da Agea in qualità di organismo pagatore per Bolzano; le successive colonne riportano invece le spese dichiarate dall'Organismo pagatore provinciale dopo il suo riconoscimento. La tabella riporta esclusivamente la spesa pubblica ordinaria.

Come già riportato nel commento della tab. III.3., per le misure 122 e 226 la spesa pubblica (rispettivamente 83.540,42 € e 1.313.442,15 €) è stata dichiarata due volte: una prima volta nel corso del 2007 (Q4 2007), ciò fece emergere il problema del superamento della stima dei trascinamenti previsti nel PSR per queste misure; una seconda volta nel secondo trimestre del 2008 (Q2 2008), successivamente all'approvazione della modifica del PSR e dell'aggiornamento degli importi della tabella dei trascinamenti. La doppia contabilizzazione da parte della CE determina una spesa pubblica complessiva dichiarata superiore (278.369.896,10 €) rispetto a quella reale (276.972.913,53 €): sottraendo gli importi rendicontati due volte per le misure 122 e 226 (83.540,42 € e 1.313.442,15 €), il dato netto coincide con quello della tabella del capitolo 3.0.

3.2.4.1.c Tab. V.1.: Historic of public expenditure declared by measure Q4 2006 to Q4 2013 (Non-Convergence Regions and Total all types of Regions):

La tabella riporta il totale della spesa pubblica dichiarata, comprensiva tanto della parte ordinaria che di quella Health Check. La somma totale ammonta finora a 294.706.665,22 €: ovviamente la questione della doppia dichiarazione di una parte delle spese relative alle misure 122 e 226 incide anche su questo importo. Al netto delle somme sopra ricordate il dato comunitario coincide con quello provinciale e cioè con 293.309.682,65 €:

3.2.4.2. Tab. V.2.: Historic of EAFRD payments by measure Q4 2006 to Q4 2013:

La tabella riporta la quota FEASR effettivamente liquidata nei sette anni di programmazione: essa ammonta a 131.710.385,70 €. Il dato comprende le spese ordinarie e quelle Health Check.

3.2.4.3. Tab. V.3.: Historic of clearance of accounts:

La tabella riporta lo storico delle quote FEASR recuperate o versate nell'ambito del PSR della Provincia Autonoma di Bolzano relative alla liquidazione dei conti dell'organismo pagatore per le spese degli esercizi finanziari 2007-2013.

4. Riepilogo delle attività di valutazione in itinere (articolo 82, paragrafo 2, lettera d):

a) Il sistema posto in essere per la valutazione in itinere:

Affidamento dell'incarico:

La Provincia Autonoma di Bolzano ha selezionato nel corso del 2008 mediante gara d'appalto il Valutatore indipendente del PSR 2007 – 2013: l'incarico è stato affidato con lettera del 18/12/2008 all'Associazione Temporanea di Imprese formata dalle società IZI Metodi, analisi e valutazioni economiche S.p.A. di Roma e APOLLIS Ricerche Sociali e demoscopia di Bolzano.

Impianto metodologico della valutazione:

La definizione dell'impianto metodologico del processo valutativo ha visto il realizzarsi delle seguenti attività:

- definizione delle attività previste per il processo valutativo;
- individuazione delle domande valutative specifiche espresse dall'AdG;
- revisione delle fonti di informazione e dei dati che hanno alimentato il sistema di indicatori del PSR e la verifica della disponibilità di ulteriori dati/fonti di informazioni utili alla valutazione;
- definizione delle attività di rilevazione e analisi dei dati di attuazione a livello di misura ai fini della valutazione delle singole misure e dell'implementazione del questionario valutativo comune.

Approccio metodologico:

L'approccio metodologico proposto prevede un processo di valutazione che non si limiti ad una funzione di "analisi e verifica" dell'attuazione del Programma, ma fornisca un supporto operativo e strategico all'Autorità di Gestione, proponendo, contestualmente, elementi e suggerimenti in grado di riorientare il Programma e le strategie di sviluppo della Provincia verso traiettorie efficaci, efficienti e competitive.

Per tale motivo, ai due livelli del processo valutativo individuati dal Regolamento Generale sui Fondi Strutturali, ne è stato aggiunto un terzo che appare cruciale in relazione ad una visione più ampia dell'esercizio valutativo. Pertanto, nell'ambito della valutazione, possono definirsi i seguenti livelli:

- un livello operativo, concernente gli aspetti specifici legati all'attuazione del programma;
- un livello strategico che analizza il contributo del PSR al raggiungimento: degli obiettivi provinciali, nazionali e comunitari per la politica di sviluppo rurale (FEASR) e del complesso delle politiche attivate al livello provincia (FESR, FSE, FEASR, FAS);
- un livello sistemico riferito all'innovazione di sistema, sia dal punto di vista del contributo del Programma alle politiche di Ricerca e Sviluppo, sia dell'impatto che, attraverso gli interventi più innovativi, si determina sul posizionamento e la competitività del sistema economico provinciale nel contesto internazionale.

Le domande di valutazione:

Il processo valutativo deve rispondere alle esigenze di diversi soggetti che, ai vari livelli, sono interessati dall'attuazione del Programma. Una prima esigenza conoscitiva cui il valutatore dovrà far fronte è quella espressa dalla CE nel QCMV tramite le domande valutative del questionario comune.

A questa si aggiunge la domanda specifica di valutazione espressa dall'AdG del PSR che, con riferimento al Programma in esame, è riconducibile a tre temi specifici che si presentano tra loro coerenti e strettamente collegati:

- il costo opportunità per gli agricoltori e per l'amministrazione provinciale rispetto alle misure a premio;
- il rapporto tra le misure agroambientali e l'indennità compensativa;
- la zonizzazione.

Si tratta di tre elementi che nel loro insieme permettono di comprendere se effettivamente il sistema messo in piedi dal PSR contribuisca ad uno sviluppo sostenibile del sistema agricolo provinciale, in particolare nelle aree svantaggiate, o meglio, permette alle aziende agricole di "sopravvivere" nelle zone rurali contribuendo in questo modo al mantenimento della vitalità socio economica di tale aree.

Nel corso del 2012, essendo il Programma in una fase avanzata di attuazione, la domanda valutativa dell'Autorità di Gestione è stata orientata a chiedere analisi specifiche che permettessero di avviare analisi sulla programmazione 2014-2020.

Per tale motivo, il Rapporto di Valutazione elaborato nel mese di giugno 2012, che doveva costituire un aggiornamento della Valutazione Intermedia del 2010, si è concentrato sulle lezioni della presente programmazione da trasferire al nuovo Programma.

Le componenti di attuazione del Programma:

L'autorità competente per l'attuazione del PSR è la Ripartizione Agricoltura della Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Fondi Strutturali UE in agricoltura.

La gestione operativa delle singole misure è affidata agli Uffici dell'Amministrazione Provinciale responsabili in relazione al settore di riferimento ed alle singole tipologie di intervento, secondo le direttive e i criteri indicati nel PSR in conformità con quanto definito nelle procedure amministrative e contabili della Provincia.

Dati, fonti e strumenti necessari per la valutazione:

Tempistica di rilevazione ed elaborazione dei dati:

- i dati derivanti dal sistema di monitoraggio saranno disponibili annualmente, in relazione alla disponibilità di dati da parte dell'Amministrazione Provinciale;
- i dati di contesto avranno una disponibilità variabile a seconda della fonte di informazione utilizzata;
- i dati derivanti dalle indagini svolte dal valutatore avranno una tempistica che dipenderà dall'avanzamento delle singole misure ed azioni e che verrà definita annualmente.

Schema organizzativo dei rapporti ADG e Valutatore:

L'organizzazione delle attività necessarie per l'elaborazione dei documenti di valutazione prevede innanzitutto una costante interazione tra il valutatore ed i responsabili di misura: i tecnici esterni prendono contatto regolarmente con il personale dell'Amministrazione provinciale, chiedendo informazioni sull'attuazione delle misure in formato elettronico, verificando personalmente la documentazione di progetto presso gli uffici provinciali, chiedendo specifici dati relativi alle domande presenti nelle banche dati provinciali.

Vengono inoltre svolti con regolarità incontri bilaterali con ciascun responsabile di misura, mentre annualmente sono organizzati incontri allargati a tutti i soggetti direttamente coinvolti nell'attuazione del PSR (GAL, ecc.).

Le fonti dei dati:

Le fonti dei dati necessari per la valutazione, in sintesi, provengono da:

- Responsabile di Misura;
- Beneficiari;
- Documentazione allegata alle Domande;
- Sistema informatico provinciale (APIA, GeoLafis, EFIN, QlikView), SIAN;
- Ufficio Pianificazione forestale;
- Piattaforma e-learning copernicus <http://e-learn.provinz.bz.it>.

Il trasferimento dei risultati e delle competenze:

La funzione della valutazione a supporto delle scelte di governance della Pubblica Amministrazione assegna un ruolo importante alle azioni di trasferimento dei risultati e delle competenze nell'ambito del processo valutativo. Per tale motivo, nel corso dello svolgimento del servizio di valutazione viene garantita ad una costante diffusione dei risultati della valutazione ed il trasferimento delle competenze tecniche ai soggetti ai vari livelli interessati dal PSR:

- AdG e funzionari provinciali;
- Soggetti attuatori e GAL;
- Partenariato;
- Comitato di Sorveglianza;
- Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici;
- Beneficiari finali.

Gli strumenti, come pure le modalità adottate, dovranno essere differenziati a seconda del target di utenti a cui è rivolta l'attività di trasferimento, le modalità comunicative saranno adeguate alle diverse tipologie di fruitori, in termini di chiarezza e semplicità dei contenuti. Il trasferimento delle competenze e dei risultati del processo valutativo avverrà sia attraverso documenti appositamente prodotti dal valutatore e diffusi dall'AdG attraverso i canali ufficiali (sito internet, newsletters, ecc.), sia attraverso un percorso seminariale/formativo diretto ai referenti del programma e agli altri soggetti interessati. Gli esiti della valutazione saranno prioritariamente diffusi, tramite:

- l'intervento del valutatore alle riunioni del Comitato di Sorveglianza;
- la presentazione dei risultati della valutazione al Nucleo di valutazione in una sua apposita sessione;

- la presentazione dei risultati della valutazione operativa all'incontro annuale con il partenariato;
- predisposizione di report tematici e sintesi non tecniche dei rapporti di valutazione, che avranno massima diffusione tra i soggetti a vario titolo coinvolti nell'attuazione dei programmi;
- la pubblicazione sul sito web della Provincia di rapporti / report / sintesi;
- inserimento dei risultati della valutazione nell'ambito del materiale informativo e delle attività di pubblicità dei programmi.

Verranno poi realizzati dei seminari in occasione della presentazione dei Rapporti di Valutazione, intermedia, suo aggiornamento e valutazione ex post e, se opportuno, in occasione della presentazione dei report tematici.

b) Le attività di valutazione intraprese (in corso e completate):

La contemporaneità della definizione del nuovo Programma per il periodo 2014-2020 con le fasi finali del PSR 2007-2013, e la corrispondenza tra valutatore in itinere 2007-2013 e valutatore ex ante 2014-2020, ha fatto sì che, nel corso del 2013 e dei primi mesi del 2014, il valutatore mettesse a sistema la propria esperienza conoscitiva in modo da fornire all'AdG gli strumenti utili per indirizzare al meglio le nuove azioni del PSR e, nello stesso tempo, fornisse analisi e valutazioni in merito ai risultati raggiunti con l'attuale programma.

Inoltre, dal momento che per alcune misure (misura 122, misura 123 e misura 313) del PSR 2007-2013 della Provincia di Bolzano si sono verificati degli scostamenti significativi fra i valori obiettivo degli indicatori di prodotto ed i valori effettivamente raggiunti, è stata effettuata un'analisi delle misure interessate da tali scostamenti al fine di individuarne le motivazioni.

In particolare per la misura 122, si evidenzia come a fronte di una realizzazione finanziaria che nel 2012 era prossima al 98% e che nel 2013 ha raggiunto il 100%, si siano manifestate alcune differenze nel numero di aziende beneficiarie previste (89%) e nel volume totale degli investimenti (140% nel 2012 e 142% nel 2013).

Lo scostamento nel numero dei beneficiari rimane nel range di un errore di stima accettabile, tuttavia un'analisi più attenta evidenzia che il numero di domande presentate (1.593 al 2013) è in linea con il valore obiettivo riferito al numero di aziende beneficiarie previsto (1.600, con una realizzazione pari al 99,6%). La differenza viene dunque spiegata dal fatto che, probabilmente, il valore obiettivo è stato stimato non sul "numero di beneficiari" ma sul "numero di domande previste". D'altra parte il fatto che 166 aziende (cioè poco più del 10% dei beneficiari) presentassero più di una domanda era un fatto difficilmente prevedibile. Lo scostamento nel volume degli investimenti previsti si spiega con il fatto che la stima prudenziale condotta al momento della definizione del valore obiettivo aveva tenuto conto del tasso di finanziamento più alto erogabile.

La misura 123 risulta suddivisa in due sottomisure: una rivolta al settore agroalimentare, l'altra al settore forestale.

Se i valori attesi per il settore agroalimentare sono stati raggiunti in termini di numero di beneficiari e stanno per essere raggiunti in termini finanziari, così non è accaduto per il settore forestale dove i finanziamenti erogati sono pari alle previsioni, ma il numero dei beneficiari è inferiore al previsto (75 contro 280, pari ad un tasso di realizzazione del 27%).

Il motivo di tale differenza, secondo il responsabile di Misura, è da ricercare in due fatti concomitanti:

- la forte richiesta di meccanizzazione delle imprese forestali che ha permesso di utilizzare tutte le risorse disponibili indirizzandole in modo da favorire la produttività e migliorare la sicurezza dei lavoratori;
- lo stralcio dalla Misura, in sede di contrattazione con la CE nel 2007, degli interventi di realizzazione di viabilità aziendale. Tali interventi sono stati spostati sulla Misura 122 e, di fatto, non realizzati, anche perché prevedono la realizzazione di ulteriori tracciati forestali privati. Sempre secondo il responsabile dopo lo stralcio di questo intervento non è stato ridefinito il valore obiettivo.

Giunti ormai quasi alla conclusione del programma non sembra opportuno chiedere una variazione per ridefinire l'obiettivo visto l'errore materiale che sembra viziare il risultato, ma, anche in questo caso, è utile fare tesoro dell'esperienza e rammentarsi di operare le modifiche anche agli indicatori in caso di modifiche sul programma.

In merito alla misura 313 viene rilevato che il numero di progetti previsti è di gran lunga inferiore al numero di progetti realizzati. Ad una prima lettura potrebbe sembrare che i progetti presentati siano stati molto più piccoli di quelli che erano attesi. Ma questa è una lettura che attiene solo agli aspetti formali della realizzazione. Nella realtà i progetti presentati a finanziamento sono stati, nella maggior parte dei casi, stralciati da progetti più ampi ideati a livello sovracomunale. Ai fini di ottenere uno snellimento burocratico, un'accelerazione nell'erogazione dei fondi e di operare in modo consono alla brevità della stagione utile per l'esecuzione dei lavori, quindi, i progetti complessivi sono stati realizzati per lotti, che fanno riferimento comunque ad un'unica regia.

Sarebbe quindi opportuno ricalcolare l'indicatore basandosi non sul numero delle domande, ma sul numero di progetti complessivi che vengono realizzati.

c) *Raccolta dei dati di monitoraggio:*

Nella prima fase della programmazione, allorché AgEA è stato l'Organismo Pagatore per il PSR di Bolzano, i dati delle domande per le misure a superficie (211 e 214) raccolte nel corso del 2007 (e liquidate da Agea nel corso del 2008) sono stati trasmessi ad AgEA, che, dopo una fase di verifica, li ha giudicati completi ed idonei ad alimentare il sistema nazionale di monitoraggio.

A partire dal 16 ottobre 2008, e cioè dopo il riconoscimento dell'Organismo Pagatore provinciale, è stato implementato un sistema informatizzato provinciale, Qlik View, consultabile direttamente dai responsabili delle liquidazioni, che permette di ottenere le informazioni necessarie per la compilazione delle tabelle comunitarie di monitoraggio. Con esso è possibile ricavare i dati relativi alle domande ed ai relativi pagamenti per le domande a superficie (misure 211 e 214). Il sistema consente di ottenere ed elaborare tutti gli elementi richiesti e necessari al fine sia del monitoraggio sia della compilazione delle tabelle comunitarie ufficiali allegate al rapporto annuale d'esecuzione per le misure a superficie del PSR. I dati relativi alle misure a superficie vengono successivamente trasmessi ad AgEA e quindi caricati nel sistema nazionale SIAN. Vengono altresì trasmessi a Roma i dati relativi alle liquidazioni delle domande a superficie effettuate dall'OP di Bolzano.

Per quanto riguarda le misure di investimento del PSR, Bolzano opera invece direttamente sul portale SIAN, inserendo tutti i dati relativi a tali misure nel sistema informatico centralizzato.

Nel 2012 è stato portato avanti il processo di realizzazione definitiva del sistema di monitoraggio nazionale Monitweb del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Bolzano ha richiesto ufficialmente, vista la particolarità di disporre di un proprio Organismo Pagatore e di utilizzare con le modalità sopra descritte il sistema informatico SIN, di poter alimentare il sistema di monitoraggio nazionale avvalendosi della collaborazione di AgEA che quindi opererà come “sender” nei confronti del MEF anche per i dati del PSR di Bolzano. L'implementazione definitiva del sistema ora spetta all'Amministrazione centrale di Roma ed è adesso in fase di definizione e di sviluppo. Nel corso dell'estate del 2012 è stato concordato il contratto tra SIN, Organismo Pagatore Provinciale e Autorità di Gestione per la realizzazione del sistema di trasmissione e validazione dei dati di monitoraggio da realizzarsi per gli ultimi anni di programmazione 2007 – 2013.

Per quanto riguarda i dati necessari alla valutazione, essi sono messi a disposizione su richiesta del personale incaricato, che può consultare le singole domande di aiuto relative alle misure di investimento conservate presso gli uffici provinciali. Per le misure a superficie vengono rilasciate “Query” dai responsabili del sistema informatico provinciale contenenti le informazioni richieste.

d) Attività di messa in rete delle persone coinvolte nell'attività di valutazione:

Successivamente alla fase di selezione del valutatore, sono stati organizzati diversi incontri, al fine di mettere in rete tutti gli attori coinvolti nell'attività di valutazione e garantire un adeguato flusso di informazioni e dati.

Nel corso del 2009 era stato realizzato un incontro con i diversi responsabili di misura al fine di coinvolgerli attivamente nel processo di valutazione. L'incontro è stato finalizzato anche a dimostrare come, e in che misura, il PSR contribuisce alla politica di sviluppo rurale che la Provincia attua a livello provinciale tramite le diverse leggi di settore.

Nel 2010 i responsabili del Programma ed i responsabili di misura sono stati coinvolti direttamente nel processo di valutazione, sia attraverso incontri formali che incontri e contatti informali finalizzati a:

- raccogliere le informazioni e i dati necessari alle analisi valutative;
- verificare l'avanzamento del programma e delle singole misure;
- verificare e analizzare eventuali criticità rilevate nel corso dell'attuazione del programma;
- confrontarsi su risultati raggiunti, aspetti specifici del programma e criticità rilevate nel corso delle analisi.

Sono stati poi effettuati due focus group, finalizzati anche ad un confronto diretto tra i partecipanti, oltre che alla raccolta di informazioni utili alla valutazione, con i responsabili dei GAL ed i responsabili di misura dell'asse 3.

Nel corso del 2011 sono stati realizzati incontri specifici con l'AdG per verificare i contenuti del documento di valutazione che il valutatore dovrà presentare nel primo semestre del 2012, e aggiornare il data base informativo del valutatore.

Nel corso del 2012 e del 2013, visto l'avanzato stato di attuazione del programma, gli incontri con i responsabili di misura sono stati rivolti a definire le linee del nuovo periodo di programmazione.

e) Difficoltà incontrate e necessità di lavori supplementari:

Difficoltà incontrate da parte del Valutatore indipendente:

Di seguito si evidenziano alcuni evidenti limiti dell'approccio metodologico proposto che fanno riferimento principalmente alla disponibilità di dati e informazioni sul Programma. Si tratta di difficoltà già individuate ed esplicitate nelle precedenti relazioni annuali e che ad oggi rimangono valide.

a) Una prima criticità è rinvenibile in merito alla raccolta storica dei valori degli indicatori:

- per alcuni indicatori l'aggiornamento delle fonti è a cadenza molto lunga (ad es. decennale per i dati ricavati dai Censimenti);
- per alcuni indicatori l'aggiornamento delle fonti non è certo, perché legato a progetti il cui finanziamento non è sicuro (ad es. il progetto CORINE o il progetto MITO);
- l'aggiornamento degli indicatori, a parte alcune rare eccezioni, avviene con un certo ritardo rispetto al momento del rilievo (in genere almeno 2 anni dopo l'esecuzione del rilievo): questo fatto rende tutto il sistema poco efficiente nel registrare gli effetti dovuti a situazioni contingenti, come, ad esempio, l'attuale crisi economico-finanziaria.

b) Per la raccolta di dati eseguita direttamente dal valutatore la maggiore criticità è legata alla esigenza di un raccordo continuo e continuativo tra valutatore, Autorità di Gestione e responsabili di Misura per fare in modo che l'afflusso di dati qualitativi e quantitativi utili alla valutazione, ma non necessariamente legati al monitoraggio, prosegua con regolarità.

c) Un'ulteriore criticità ravvisata è riferita alle sole Misure di investimento. Per le particolari caratteristiche territoriali queste misure impegnano in molti casi il beneficiario per un periodo di tempo relativamente lungo, almeno 2-3 anni prima che le opere possano essere concluse. Se ai tempi di realizzazione delle opere si aggiungono i tempi in cui tali opere possono manifestare i loro effetti e i tempi necessari perché tali effetti siano resi misurabili, ad esempio attraverso la redazione di bilanci, si capisce che, dal momento della richiesta del finanziamento al momento in cui si rendono manifesti i suoi risultati possono passare molti anni. Questo fatto rende difficile la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia di molte Misure in sede di valutazione intermedia.

Infine appare opportuno segnalare alcune anomalie riscontrate nella raccolta dei dati. In alcuni casi, infatti, alcune serie storiche devono essere interrotte perché i dati non risultano più essere disponibili nelle forme utilizzate nel passato: si può trattare di raccolte eseguite con differenti metodiche, di restituzione dei dati in forme differenti oppure di rielaborazioni periodiche degli stessi dati forniti in precedenza. Le interruzioni sono state comunque opportunamente ravvisate e riportate in sede di raccolta dei dati che alimentano gli indicatori.

Difficoltà incontrate da parte dell'Autorità di Gestione:

Le difficoltà incontrate sono dovute soprattutto alla complessità delle norme di riferimento, nelle quali si possono trovare aspetti di difficile realizzazione pratica: si pensi ad esempio alla complicata gestione degli indicatori comuni, costruiti su livelli diversi (input, output, risultato, impatto), al fatto che a partire dal 2010 si aggiungono ulteriori tabelle che vanno compilate per le azioni attivate nell'ambito dell'Health Check; infine, alla necessità di alimentare il sistema nazionale di monitoraggio, costruito a partire da realtà regionali a volte completamente diverse dal punto di vista organizzativo ed informatico.

Rispetto al precedente PSR, il numero delle tabelle di monitoraggio è molto aumentato e ciò contrasta con l'auspicata semplificazione procedurale richiesta dai responsabili a livello operativo. Inoltre, una quantificazione con cadenza annuale degli indicatori di risultato rischia di distorcere il reale effetto del programma, che potrà essere analizzato solamente a distanza di alcuni anni dall'inizio.

Dovrebbe essere trovato un ragionevole equilibrio costi/benefici, in modo da lasciare solamente le attività di monitoraggio della programmazione realmente capaci di analizzare potenzialità e problematiche, evitando nel contempo un appesantimento eccessivo delle diverse fasi di lavoro amministrativo.

f) Azioni intraprese e da intraprendere da parte dell'Autorità di Gestione per superare le difficoltà incontrate e migliorare il sistema di monitoraggio:

Interazione tra responsabili delle diverse attività:

Le difficoltà espresse dal Valutatore indipendente, tanto nel Rapporto di valutazione intermedia quanto nel Rapporto di valutazione in itinere del 2011 sono state sottolineate anche dalla Commissione Europea nella comunicazione del 18 luglio 2011, in cui viene richiesto infatti all'AdG di migliorare ulteriormente il sistema di monitoraggio e della procedura di raccolta dati, per garantire che in futuro si possa giungere alla corretta quantificazione dei risultati e degli impatti del PSR.

L'Amministrazione provinciale concorda con la CE ed il Valutatore sulla necessità di creare un migliore e più costante raccordo operativo tra Valutatore stesso e Responsabili di misura durante la fase di raccolta dei dati necessari ai fini dell'attività di valutazione. Le azioni proposte ed attuate per potenziare l'interazione tra i responsabili delle diverse attività coinvolti nella raccolta e fornitura dei dati ai fini della valutazione sono le seguenti:

- durante gli incontri tra il valutatore ed i singoli responsabili di misura viene garantita la presenza di un rappresentante dell'AdG, al fine di supportare le migliori soluzioni operative per quanto riguarda il reperimento dei dati di valutazione;
- l'AdG garantisce al valutatore un accesso alle banche dati più semplice; inoltre contattata direttamente i responsabili provinciali dei sistemi informatici nell'eventualità di specifiche estrazioni di dati;
- la stessa funzione di raccordo viene svolta da parte dell'AdG anche per quanto riguarda i rapporti valutatore – beneficiari, nel caso sia necessario procedere a specifiche richieste di informazioni presso questi ultimi.

ELER	 FESAF	REGIONE PUGLIA REGIONE BASILICA PUGLIA REGIONE BASILICA	
Hier werden Europa in die Wirtschaften integriert.	ES - Von 1993/2005	 Reg. (CE) 1083/2005	L'Europa investe nelle zone rurali

Sistema di monitoraggio e raccolta dati:

L'AdG ritiene che le novità introdotte nell'ambiente informatico QlikView nel corso del 2011 hanno consentito non solo una migliore redazione del RAE e della raccolta dei dati di monitoraggio, ma sono state anche un valido supporto per le attività di valutazione.

5. Disposizioni prese dall'autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l'efficienza dell'esecuzione (articolo 82, paragrafo 2, lettera e):

5.1. Misure di sorveglianza e valutazione:

Le attività di valutazione del 2013 sono state presentate nel precedente capitolo. Qui vengono sintetizzate le misure di sorveglianza adottate nel corso dell'anno appena trascorso.

5.1.1. Comitato di Sorveglianza:

Il testo del PSR descrive, nel capitolo 12, le funzioni del Comitato, la sua composizione ed il regolamento interno. Sulla base di quanto previsto in programma, il Comitato di Sorveglianza è stato ufficialmente costituito con delibera della Giunta provinciale n. 3352 in data 8 ottobre 2007.

La settima riunione del Comitato di Sorveglianza è stata convocata in data 7 giugno 2013, a Bolzano.

All'ordine del giorno sono stati posti i seguenti argomenti:

1. Saluto di benvenuto ed apertura dei lavori;;
2. Approvazione del Rapporto Annuale di Esecuzione per l'anno 2012;
3. Valutazione delle problematiche relative al completamento del Programma (2013 – 2015);
4. Tasso d'errore nella politica dello Sviluppo Rurale: problematiche emerse per il PSR della Provincia Autonoma di Bolzano ed attività svolte per la sua riduzione;
5. La nuova programmazione dello Sviluppo Rurale per il periodo 2014 – 2020:
 - a. Attività in corso di svolgimento da parte dell'Autorità di Gestione, tempistica della presentazione del nuovo PSR;
 - b. Attività in corso di svolgimento da parte della Società incaricata per la Valutazione ex-ante e per la VAS;
 - c. Discussione sulle tematiche ritenute centrali dalla Commissione Europea e dalla Provincia Autonoma di Bolzano;
6. Varie ed eventuali.

Il testo del verbale della seduta viene allegato alla presente relazione al punto 9.1. Si ricorda che tutti i documenti relativi alle sedute del CDS vengono pubblicati nella seguente pagina Internet: <http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/documentazione.asp>

Il testo definitivo della RAE approvato dal CDS è stato trasmesso formalmente alla Commissione Europea attraverso il sistema Monitweb/SFC2007 entro il 30 giugno 2013. La Commissione ha rilevato alcune incongruenze per certi valori inseriti nelle tabelle di output, che la Provincia ha immediatamente corretto, provvedendo a ritrasmettere la RAE rivista a fine luglio del 2013.

5.1.2. Incontro bilaterale a Bruxelles del 23 ottobre 2013:

Accanto alla riunione tenutasi a Bolzano, deve essere ricordato, tra le attività di sorveglianza anche l'incontro annuale con la Commissione Europea svoltosi sotto forma di riunione bilaterale in videoconferenza in data 23 ottobre 2013, durante il quale i servizi della Commissione Europea, assieme al MIPAAF, ai rappresentanti dell'Autorità di Gestione di Bol-

2. Tasso di errore e Controlli

Negli ultimi due anni si è registrato un aumento significativo del tasso di errore per lo sviluppo rurale, che si attesta ben oltre il 2% del tasso di tolleranza (materiality threshold). La riduzione del tasso di errore è una priorità per la Commissione, perché un livello di errore al di sopra della tollerabilità danneggia in modo serio la credibilità di tutta la politica rurale. Si ritiene pertanto necessario sensibilizzare sull'argomento le Autorità di Gestione al fine di migliorare il funzionamento dei sistemi di controllo garantendo una buona gestione del programma e per ovviare problemi futuri.

Viene ricordata dal rappresentante della Commissione l'importanza di tenere aggiornato il piano di azione e di scambiare informazioni con le altre Regioni dato che gli errori sono molto spesso gli stessi. Per tale scopo la Rete Rurale potrebbe essere un ottimo strumento per avere scambi d'informazione permanenti.

Viene ribadito il ruolo fondamentale del flusso di informazioni e buone pratiche, anche per quanto riguarda i controlli, tra l'organismo pagatore e l'Autorità di Gestione, senza il quale il sistema dei controlli difficilmente può migliorare. La controllabilità delle misure sarà un elemento centrale della nuova programmazione.

Conclusioni e raccomandazioni:

I servizi della Commissione invitano la Provincia a seguire in maniera sistematica e periodica il piano d'errore che va aggiornato secondo eventuali nuove problematiche che si possono presentare sia in sede di attuazione del PSR sia in sede di audit.

Si chiede, inoltre, di inserire all'ordine del giorno del prossimo comitato di sorveglianza organizzato dalla Provincia un punto riguardante il piano di azione ed eventuali audit (obiettivi/conclusioni/raccomandazioni ricevute).

3. Varie ed eventuali

Viene riepilogato lo stato dell'arte delle attività e dei lavori svolti per la preparazione del nuovo Programma. Sono state predisposte le parti relative all'analisi di contesto, alla strategia ed alla combinazione delle misure con le relative schede. Entro la fine dell'anno dovrebbe essere disponibile una proposta di programma quasi del tutto completa. Inoltre, sono state incaricate due società esterne per l'elaborazione della valutazione ex ante e della valutazione ambientale strategica del programma e per la giustificazione economica dei premi. Risultano in corso di analisi i rapporti di coerenza con l'accordo di partenariato.

Da parte dei rappresentanti della Commissione viene richiamata l'attenzione sui seguenti argomenti:

- coerenza: ci deve essere coerenza assoluta fra l'accordo di partenariato ed il PSR;
- VAS: bisogna porre molta attenzione alla tempistica, in quanto la normativa italiana sulle valutazioni ambientali strategiche prevede una procedura piuttosto lunga;
- CLLD e approccio multifondo: l'Autorità di Gestione viene invitata a valutare con attenzione i costi ed i benefici legati all'attivazione dell'approccio multifondo per il CLLD;
- PEI: lo strumento del PEI viene inserito come concetto nuovo in questa fase di programmazione. Viene sottolineato come la relativa strategia debba essere coordinata anche con

- gli altri fondi strutturali e debba essere integrata nella strategia per la smart specialization e la crescita intelligente;
- e) viene suggerito di considerare l'opportunità di attivare nel programma le misure legate alla cosiddetta ingegneria finanziaria;
 - f) vengono discusse le nuove norme sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. La baseline risulta infatti modificata dall'introduzione del PAN per la lotta integrata. La giustificazione economica dei premi dovrà tenere conto di questa novità.

5.2. Riepilogo delle principali difficoltà incontrate nella gestione del programma e delle eventuali misure prese in conseguenza:

Non si segnalano nel corso del 2013 particolari criticità nella gestione del programma.

5.3. Ricorso all'assistenza tecnica:

Il programma non prevede il ricorso all'assistenza tecnica.

5.4. Informazioni volte a dare adeguata pubblicità al programma:

Per garantire la piena trasparenza degli interventi finanziati in base al nuovo PSR sono state adottate le seguenti misure:

1. Sul numero di gennaio/febbraio 2008 del mensile "Provincia Autonoma" è stato pubblicato un articolo divulgativo sullo Sviluppo Rurale ed il PSR della Provincia Autonoma di Bolzano;
2. Una brochure di sintesi delle direttive del PSR è stata pubblicata dalla Provincia Autonoma di Bolzano e capillarmente distribuita presso tutti i potenziali beneficiari finali come allegato al quindicinale "Der Südtiroler Landwirt" del Südtiroler Bauernbund (Unione Agricoltori e Coltivatori diretti sudtirolesi) (<http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/sintesi-opuscolo.asp>);
3. Il testo del nuovo PSR Health Check è stato integralmente pubblicato sul sito Internet della Provincia Autonoma di Bolzano (<http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/info-programma-sviluppo.asp>);
4. Il testo della delibera di approvazione del nuovo PSR Health Check da parte della Giunta provinciale (Deliberazione n. 74 del 25 gennaio 2010) è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 6 del 9 febbraio 2010;
5. Viene annualmente pubblicata la Relazione delle attività svolte dall'amministrazione provinciale, nella quale vengono pubblicati i dati consuntivi del PSR;
6. Analogamente i dati di consuntivo del PSR vengono pubblicati anche sulla Relazione Agraria e Forestale, che viene elaborata annualmente e che contiene tutti i dati consuntivi dell'attività delle Ripartizioni Agricoltura e Foreste della Provincia Autonoma di Bolzano (<http://www.provincia.bz.it/agricoltura/service/pubblicazioni.asp>);
7. Tutta la documentazione relativa al Comitato di Sorveglianza, compresa questa relazione annuale, viene pubblicata sul sito Internet della Provincia Autonoma di Bolzano (<http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/documentazione.asp>);
8. La documentazione relativa alla valutazione del PSR viene pubblicata sul sito Internet della Provincia Autonoma di Bolzano (<http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/1877.asp>);

9. Le informazioni che riguardano l'implementazione dell'asse 4 LEADER, inclusi i Piani di Sviluppo Locale approvati, sono riportate sul sito Internet della Provincia Autonoma di Bolzano (<http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/asse-leader.asp>);
10. I GAL pubblicano sui rispettivi siti web (GAL Val Sarentino: <http://www.grw.sarntal.com/>; GAL Valli di Tures ed Aurina: <http://www.leader-tat.com/it>; GAL Alta Val d'Isarco: <http://www.grwwipptal.it/>; GAL Val d'Ultimo/Alta Val di Non/Martello: <http://www.leader-udm.com/>) l'elenco dei progetti approvati durante le sedute e informazioni in merito all'attuazione dei Piani di Sviluppo Locale;
11. Asse Leader: le relazioni annuali elaborate dai GAL sull'attività svolta nell'ambito del LEADER e sull'attuazione dei piani di sviluppo locale sono state pubblicate sul sito web della Provincia;
12. Per le diverse misure del Programma ed in relazione ai diversi soggetti attuatori sono state realizzate dai GAL azioni informative rivolte ai beneficiari finali che, a seconda delle caratteristiche delle iniziative, sono state veicolate su media e per periodi differenti;
13. Mediante pubblicazione sulla rivista settoriale "Der Südtiroler Landwirt" del Südtiroler Bauernbund (Unione Agricoltori e Coltivatori diretti sudtirolesi) viene data notizia dell'inizio della campagna per i premi a superficie con le informazioni specifiche a riguardo;
14. L'Amministrazione scrivente ha aperto un punto di informazione sull'Unione Europea, sulle Istituzioni europee e sulle possibilità offerte nei diversi settori (EU Info Point), il quale è accessibile anche attraverso Internet (<http://www.provinz.bz.it/europa>);
15. Per quanto riguarda la misura 111, in particolare, i beneficiari vengono informati sulle procedure attraverso la creazione da parte della Ripartizione 22 Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica di una piattaforma informatica sul sito [www.copernicus.bz.it/Formazione professionale 22/2007-2013 Servizio Gestione Progetti](http://www.copernicus.bz.it/Formazione_professionale_22/2007-2013_Servizio_Gestione_Progetti) ([www.copernicus.bz.it/Berufsbildung 22/2007-2013 Projekte Service Stelle](http://www.copernicus.bz.it/Berufsbildung_22/2007-2013_Projekte_Service_Stelle)). Oltre ad un forum, i beneficiari trovano qui tutti documenti, moduli, prestampati che servono per la presentazione e gestione del progetto. A loro viene anche assegnato un ambiente digitale in cui archiviare la documentazione di progetto. Ciò garantisce anche un'istruttoria efficiente ed un accesso trasparente ai dati da parte del valutatore indipendente;
16. Progetto rural4kids della Rete Rurale Nazionale: si è collaborato con il Ministero elaborando le quattro schede relative alle sfide biodiversità, acqua, clima ed energia che serviranno per la realizzazione dei volumi dedicati.
17. Adesione all'iniziativa della Rete Rurale Nazionale " Il paesaggio rurale e le 4 sfide dello sviluppo rurale": si è collaborato con il Ministero inviando immagini fotografiche relative a buone prassi messe in atto nella Provincia Autonoma di Bolzano, che abbracciano le quattro sfide (acqua, clima, biodiversità, energia). Tali immagini sono servite per la realizzazione di un volume dedicato.

Per sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione Europea, sono state adottate le seguenti misure:

1. Ciascun beneficiario finale è stato informato, non soltanto dell'avvenuta approvazione di ogni progetto, ma anche della partecipazione finanziaria dell'Unione Europea, dello Stato e della Provincia Autonoma di Bolzano;

ELER		FEASR	AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL		PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE	
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete			EG – Ver. 1698/2005		Reg. (CE) 1698/2005	L'Europa investe nelle zone rurali

2. Nella stessa comunicazione viene allegato un avviso a colori con la descrizione della modalità di finanziamento ed il logo di ciascuno delle tre Istituzioni pubbliche finanziatrici;
3. È altresì raccomandato a ciascun beneficiario di garantire la massima informazione, sia all'interno della struttura del beneficiario finale, che presso l'opinione pubblica, della partecipazione comunitaria;
4. Al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica circa il ruolo della UE, l'Amministrazione provinciale ha provveduto alla stampa di targhe informative, che vengono distribuite ai beneficiari degli aiuti con la raccomandazione di apposizione sulle opere finanziate:

ELER		FEASR	AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL		PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE	
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete			EG – Ver. 1698/2005	Reg. (CE) 1698/2005		L'Europa investe nelle zone rurali

ELER		FEASR	AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL		PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE	
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete			EG – Ver. 1698/2005		Reg. (CE) 1698/2005	L'Europa investe nelle zone rurali

6. Dichiarazione di conformità con le politiche comunitarie pertinenti, problemi incontrati e misure adottate per porvi rimedio (articolo 82, paragrafo 2, lettera f):

La conformità degli interventi del PSR con le politiche comunitarie è garantita con l'adozione da parte della Provincia Autonoma di Bolzano delle seguenti misure:

a) Coerenza delle azioni finanziate con il PSR rispetto ad altri programmi comunitari:

PSR e Politica Regionale:

I funzionari provinciali responsabili della gestione dei diversi programmi comunitari (FEASR, FESR, FSE) si scambiano reciprocamente informazioni sull'andamento dei programmi stessi, al fine di evitare sovrapposizioni oppure doppi finanziamenti, nell'ambito dei Comitati di Sorveglianza di ciascun programma.

Inoltre è stato istituito un "Comitato di coordinamento e sorveglianza delle politiche regionali 2007-2013", al quale partecipano i responsabili di ciascun Programma cofinanziato dai Fondi comunitari e nel quale vengono affrontate le problematiche attinenti il coordinamento delle diverse programmazioni, l'analisi dello stato di attuazione dei diversi programmi, il coordinamento delle attività di valutazione dei programmi stessi. Il Comitato è stato istituito con Delibera della Giunta provinciale n. 1506 dell'8 giugno 2009 e la sua prima riunione si è tenuta il 24 giugno 2009.

Nel corso del 2013 si sono tenute diverse riunioni congiunte con i responsabili provinciali dei programmi previsti dai diversi Fondi comunitari per discutere e valutare le possibili forme di collaborazione e le sinergie possibili da implementare nel prossimo periodo di programmazione.

PSR e OCM ortofrutta - investimenti:

La Provincia Autonoma di Bolzano garantisce la verifica del rispetto del divieto del cumulo degli aiuti ad uno stesso beneficiario per uno stesso investimento attraverso lo scambio di informazioni tra gli Uffici provinciali della Ripartizione Agricoltura competenti sulle richieste di finanziamento pervenute e sul tipo di investimento previsto.

La Provincia Autonoma di Bolzano vigila affinché con i diversi strumenti operativi siano finanziati progetti funzionali ben distinti ed individualmente funzionali: durante la fase d'approvazione tecnico-economica, che avviene per tutti i progetti superiori a 516.457,00 € (l'importo di preventivo è stato aumentato a 1.500.000 € con la Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14 (Pubblicata nel Supplemento n. 1 al B.U. 20 dicembre 2011, n. 51)) nell'ambito della medesima Commissione Tecnica, viene verificata l'ammissibilità e la demarcazione degli investimenti per l'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, finanziati tanto con il PSR che con i Programmi Operativi delle OCM. Per importi inferiori, ciò è definito per mezzo di relazioni istruttorie preparate dai tecnici dei diversi uffici e controfirmate dal Direttore di Ripartizione.

I progetti finanziati attraverso ciascun strumento operativo sono verificati e controllati separatamente: le relative spese sostenute vengono accertate attraverso i documenti giustificativi in maniera separata. A tal proposito, i documenti giustificativi di spesa ammessi a finanziamento ai sensi della presente misura vengono singolarmente controllati e

timbrati e non possono quindi beneficiare di altri aiuti. Le due strutture amministrative provinciali responsabili si informano reciprocamente verificando in caso dubbio il contenuto delle fatture presentate.

PSR e OCM vino - investimenti:

Nell'ambito della misura 121 non sono stati finanziati progetti di ammodernamento delle aziende agricole che riguardino la ristrutturazione e riconversione dei vigneti; inoltre, si precisa che sono state e verranno finanziate esclusivamente aziende ad indirizzo zootecnico da latte. In data 1.11 2010 l'Amministrazione provinciale ha comunicato al Mipaaf che tutte le operazioni per le quali è stata richiesta l'attivazione della misura "investimenti" nell'ambito dell'OCM vino – Programma nazionale di sostegno – e precisamente l'acquisto a leasing con patto d'acquisto di macchine ed attrezzature per la trasformazione, lavorazione e stoccaggio del vino, sono escluse dal PSR della Provincia Autonoma di Bolzano 2007-2013, misure 121 e 123.

PSR e prodotti di qualità:

A seguito della modifica Health Check del 2009 sono stati esclusi dagli ambiti di competenza del PSR in relazione al sostegno delle azioni di promozione i settori ortofrutta e vino. Quindi con il PSR resta solamente il settore del latte e dei suoi derivati.

In particolare, la dotazione finanziaria della misura 133 è stata ridotta in funzione delle reali possibilità di sostegno al settore del latte. La misura 132 è stata in pratica eliminata, in quanto le attività previste sono già svolte dall'Amministrazione provinciale con fondi propri.

PSR e azioni ambientali nell'ambito delle OCM ortofrutta:

Nell'ambito dell'OCM ortofrutta non sono previsti premi a superficie assimilabili con quelli della misura 214 del PSR: la demarcazione introdotta nel corso del 2009 nel Programma ribadisce quanto era già in atto e cioè che i premi a superficie per il biologico vengono erogati esclusivamente nell'ambito dello Sviluppo Rurale, mentre con i PO ortofrutta vengono sostenute le spese attinenti alla produzione integrata.

PSR e articolo 68:

La tabella di demarcazione tra PSR e art. 68 presente nel PSR Health Check del 17 dicembre 2009 è stata presentata all'Organismo pagatore provinciale ed al Centro Assistenza Agricolo per la Provincia di Bolzano (Südtiroler Bauernbund) ed è alla base della predisposizione della raccolta delle domande del premio unico a partire dall'anno 2010. In tal modo si tiene conto delle tipologie di intervento ammissibili con i due strumenti comunitari della tabella citata evitando possibili sovrapposizioni tra PSR e domanda unica. Tale demarcazione è stata confermata anche dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con circolare del 30 marzo 2011.

b) Rispetto delle politiche comunitarie in materia di ambiente¹³:

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, bisogna distinguere tra lavori e progetti eseguiti in zone assoggettate a tutela specifica e lavori e progetti comunque soggetti a preventivo esame.

- L'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 8 della legge sulla tutela del paesaggio:

“Chiunque intenda eseguire lavori nei territori assoggettati a tutela specifica e cioè individuati come monumenti naturali, zone corografiche, biotopi, parchi e riserve naturali, giardini e parchi, deve chiedere l'autorizzazione di cui all'art. 8 della Legge provinciale n. 16/70. Lo stesso vale anche per i lavori intrapresi nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ex legge e cioè ai sensi dell'art.1/bis della Legge sulla “Tutela del paesaggio”.

L'autorizzazione prevista nel citato art. 8 è data dal Sindaco, sentita la commissione edilizia in sede di rilascio della concessione edilizia o, qualora questa non sia necessaria, con provvedimento autonomo. Il Sindaco può trasmettere di propria iniziativa o deve trasmettere, su richiesta dell'esperto nella commissione edilizia comunale, la domanda dell'interessato con la documentazione prescritta all'Assessore provinciale competente che deve comunicare al Comune il parere della seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio. Se questo non succede, ogni decisione in merito all'autorizzazione di cui all'art. 8 è demandata al Sindaco.

L'autorizzazione può essere subordinata all'osservanza di particolari condizioni o al versamento di una cauzione ed è valida limitatamente a tre anni dalla data del rilascio.

- L'autorizzazione di valutazione di impatto ambientale prevista dall'art. 8 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7:

L'art. 1 della Legge citata chiarisce che i progetti pubblici e privati che possono avere ripercussioni sull'ambiente sono sottoposti alla valutazione dell'impatto ambientale, al fine di proteggere la salute umana, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e proteggere l'ambiente.

L'art. 3 della citata Legge provinciale prevede che tra i lavori ed impianti speciali, tra i quali (elenco non esaustivo):

- Ricomposizione rurale (20 ha)
- Rimboschimenti e disboscamento a scopo di conversione ad altro tipo di sfruttamento del suolo (20 ha)
- Gestione delle risorse idriche per l'agricoltura compresi l'irrigazione e il drenaggio (300 ha)
- Malghe (200 UBA)
- Impianti di allevamento intensivo di volatili da cortile (30.000 capi), suini (500 capi), bovini (100 UBA da latte e 200 UBA da ingrasso) o conigli (5.000 capi)

¹³ Normativa comunitaria in materia di ambiente:

- a) Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;
- b) Direttiva 2001/42/ce del parlamento europeo e del consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- c) Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (85/337/CEE);
- d) Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale 2008/C 82/01.

- Estrazione di torba ed argilla, cave, attività mineraria a cielo aperto, attività mineraria sotterranea
- Estrazione di sabbia, ghiaia e minerali da acque
- Costruzione di strade poderali, interpoderali, forestali (15 km)
- Installazione di acquedotti (30 km)
- Derivazioni di acqua, realizzazione di centrali termoelettriche, serbatoi d'acqua, opere idrauliche di seconda e terza categoria
- Depositi di materiali di qualsiasi tipo,

siano soggetti alla procedura VIA. Per progetti al di sotto delle soglie dell'allegato della citata Legge, si applica la procedura di approvazione cumulativa prevista dall'art. 13 qualora si riferiscano ad attività soggette a due o più approvazioni, autorizzazioni o pareri vincolanti da parte dell'Amministrazione provinciale, richiesti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela dell'acqua, dell'aria e dell'inquinamento acustico, della gestione dei rifiuti, di tutela della natura e del paesaggio, della pesca, della gestione delle risorse idriche nonché di vincoli idrogeologico – forestale.

I progetti per le succitate attività vengono presentati dagli allegati previsti dalle singole leggi provinciali dai Comuni. Qualora per l'attività progettata vada richiesta anche la concessione edilizia, la documentazione deve essere integrata con il parere della commissione edilizia. Devono essere inoltre forniti i dati necessari per valutare gli effetti che il progetto può avere sull'ambiente.

Viene indetta una conferenza dei direttori degli uffici provinciali di volta in volta competenti per l'applicazione delle leggi. La conferenza dei direttori d'ufficio emette un parere vincolante sul progetto. Tale parere deve essere comunicato ai Comuni.

Tutte le misure del Piano sono state comunque sempre soggette al rispetto della legge comunitaria in materia ambientale, con particolare riferimento alle direttive 409/79/CEE e 43/92/CE.

Per quanto riguarda i progetti della Ripartizione Agricoltura e della Ripartizione Foreste, è stata richiesta copia della concessione edilizia, per il rilascio della quale viene, come descritto sopra, preventivamente valutato il possibile impatto sull'ambiente e sulla salute umana. Nelle commissioni edilizie sono, infatti, presenti rappresentanti della Ripartizione Natura e Paesaggio, i quali valutano i possibili rischi ambientali legati all'esecuzione di un determinato progetto.

Per i progetti della Ripartizione Foreste eseguiti in economia diretta è stata convocata un'apposita Commissione Tecnica, di cui fa parte anche un rappresentante della Ripartizione Natura e Paesaggio, il quale ha valutato il possibile impatto ambientale di ciascun progetto.

Infine, per quanto riguarda il possibile impatto dei diversi progetti nelle zone Natura 2000, tanto in Commissione edilizia, quanto in Commissione tecnica, i progetti sono stati esaminati sotto questo punto di vista da parte dei rappresentanti della Ripartizione Natura e Paesaggio. Anche in sede di monitoraggio ciascun ufficio ha verificato

se i progetti fossero situati in zone svantaggiate, in zone obiettivo 2 oppure in zone Natura 2000.

c) Rispetto delle politiche comunitarie in materia concorrenza¹⁴:

1. Come ampiamente descritto nel PSR, la Provincia Autonoma di Bolzano opera secondo il meccanismo dello sportello aperto. Attraverso le misure d'informazione sul PSR descritte in precedenza, tutti i potenziali beneficiari finali sono stati in grado di verificare le opportunità offerte e i requisiti richiesti per l'accesso ai finanziamenti. Inoltre, ogni Ufficio provinciale é a disposizione dei cittadini per qualsiasi richiesta di informazione e di chiarimento in materia di accesso ai finanziamenti comunitari. Di fatto, quindi, ogni interessato può conoscere le opportunità offerte dal Programma di Sviluppo Rurale e, qualora ne abbia la necessità, può fare richiesta di finanziamento.
2. Per quanto riguarda i tassi di aiuto concessi con il PSR, nessuna distorsione della concorrenza può essere stata anche involontariamente realizzata in quanto sono state applicate rigorosamente le percentuali di contributo stabilite nel piano finanziario di PSR approvato dalla UE, percentuali che rientravano nei massimali stabiliti dai Regolamenti comunitari.

d) Rispetto delle politiche comunitarie in materia di appalti¹⁵:

In materia di appalti pubblici si segnala quanto segue:

1. è adottata la Legge provinciale 17 giugno 1998 n. 6, "Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici", aggiornata con Legge provinciale n. 5 del 27 febbraio 2012;
2. qualora i beneficiari degli aiuti previsti dal PSR fossero Enti pubblici, i lavori oggetto di aiuto sono regolarmente appaltati secondo le norme vigenti; l'Amministrazione provinciale richiede infatti per questo tipo di opere i verbali di gara d'appalto e i contratti con le Ditte vincitrici.

e) Rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità e della non discriminazione¹⁶:

Nel PSR della Provincia Autonoma di Bolzano, ed in particolare nei criteri di selezione dei singoli interventi, viene data la priorità alle iniziative presentate che promuovano le

¹⁴ Normativa comunitaria in materia di concorrenza:

a) Norme di concorrenza comunitarie, articoli 81 e 82 del trattato.

¹⁵ Normativa comunitaria in materia di appalti:

a) Direttiva 2004/18/ce del parlamento europeo e del consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
 b) Direttiva 2004/17/ce del parlamento europeo e del consiglio del 31 marzo 2004 che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

¹⁶ Normativa comunitaria in materia di pari opportunità:

a) Trattato istitutivo della Comunità europea: art. 12, versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea (ex art. 6);
 b) Trattato di Amsterdam, artt. 2, 3, 13, 118, 119;
 c) Carta europea dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, articolo 21 - Non discriminazione; articolo 23- Parità tra uomini e donne.

pari opportunità. Un rappresentante delle pari opportunità partecipa come membro effettivo alle sedute del Comitato di Sorveglianza del PSR.

f) Conclusioni:

In conclusione, la Provincia Autonoma di Bolzano dichiara la conformità di tutti gli interventi ammessi agli aiuti previsti dalle misure del PSR con le politiche comunitarie pertinenti.

7. Riutilizzazione degli importi recuperati a norma dell'articolo 33 del Reg. (CE) n. 1290/2005 (articolo 82, paragrafo 2, lettera g):

Nella tabella che segue sono riportati gli importi recuperati dall'Organismo Pagatore nel rispetto di quanto disposto dall'art. 33 del Reg.(CE) 1290/2005. I prospetti di riepilogo sottolineano come le somme recuperate siano state reintegrate alle rispettive misure di competenza:

RISORSE ORDINARIE			
Misura	Totale spesa pubblica (€)	Quota FEASR (€)	Riutilizzo
112	- 14.448,04	- 6.357,15	Nell'ambito della misura
121	- 127.275,00	- 56.001,00	Nell'ambito della misura
123	- 5.120,00	- 2.252,80	Nell'ambito della misura
<i>Totale Asse 1</i>	- 146.843,04	- 64.610,95	
211	- 10.900,93	- 4.796,41	Nell'ambito della misura
214	- 195.779,91	- 86.143,14	Nell'ambito della misura
<i>Totale Asse 2</i>	- 206.680,84	- 90.939,55	
311	- 32.000,00	- 14.080,00	Nell'ambito della misura
<i>Totale Asse 3</i>	- 32.000,00	- 14.080,00	
413	- 7.320,00	- 3.220,80	Nell'ambito della misura
<i>Totale Asse 4</i>	- 7.320,00	- 3.220,80	
TOTALE	- 392.843,88	- 172.851,30	

RISORSE HEALTH CHECK			
Misura	Totale spesa pubblica (€)	Quota FEASR (€)	Riutilizzo
214	- 42.016,59	- 25.209,95	Nell'ambito della misura
<i>Totale Asse 2</i>	- 42.016,59	- 25.209,95	
TOTALE	- 42.016,59	- 25.209,95	

 ELER	 Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste	 Ministero dell'Interno e delle Regioni
 Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete	 EG – Vor 1993/2005	 Reg. (CE) 1080/2005

8. Tabelle degli indicatori comuni per la sorveglianza della programmazione dello sviluppo rurale 2007-2013

Parte II:

**TABELLE DEGLI INDICATORI COMUNI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE
DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE**

2007-2013

Convenzioni utilizzate

a. Colori

Da compilare	<i>Celeste chiaro</i>
Calcolato/compilato automaticamente	<i>Celeste</i>
Da non compilare	<i>Giallo</i>

b. Codici

Non pertinente	NP
Applicabile ma non (ancora) attuata	NI
Dato non disponibile	NA

c. Codici dei paesi

AUSTRIA	AT
BELGIO	BE
BULGARIA	BG
CIPRO	CY
REPUBBLICA CECA+T374	CZ
DANIMARCA	DK
ESTONIA	EE
FINLANDIA	FI
FRANCIA	FR
GERMANIA	DE
GRECIA	GR
UNGHERIA	HU
ITALIA	IT
IRLANDA	IE
LETTONIA	LV
LITUANIA	LT
LUSSEMBURGO	LU
MALTA	MT
PAESI BASSI	NL
POLONIA	PL
PORTOGALLO	PT
ROMANIA	RO
SLOVACCHIA	SK
SLOVENIA	SI
SPAGNA	ES
SVEZIA	SE
REGNO UNITO	UK

d. Codici delle regioni

Cfr. Orientamenti esplicativi

Tabelle di monitoraggio dello sviluppo rurale 2007-2013

Codice	Tabelle generali
G1*	Informazioni generali
G2*	Misure programmate
G3*	Avanzamento del programma
G4*	Ripartizione geografica del sostegno
G5*	Esecuzione finanziaria del programma

Codice	Tabelle degli indicatori di prodotto
O.111(1)	Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione - ripartizione dei partecipanti per tipo di settore/contenuto dell'attività
O.111(2)	Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione - ripartizione per genere/età
O.112(1)	Inseadimento di giovani agricoltori - ripartizione per tipo di settore agricolo
O.112(2)	Inseadimento di giovani agricoltori - ripartizione per genere
O.113	Prepensionamento
O.114(1)	Utilizzo di servizi di consulenza - ripartizione per imprenditori agricoli beneficiari di sostegno
O.114(2)	Utilizzo di servizi di consulenza - ripartizione per imprenditori forestali beneficiari di sostegno
O.115	Avvicinamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione
O.121(1)	Ammodernamento delle aziende agricole - ripartizione per tipo di settore agricolo/tipo di investimento
O.121(2)	Ammodernamento delle aziende agricole - ripartizione per status giuridico/genere/età
O.121(3)	Ammodernamento delle aziende agricole - ripartizione per area di intervento
O.122(1)	Migliore valorizzazione economica delle foreste - ripartizione per tipo di imprenditore
O.122(2)	Migliore valorizzazione economica delle foreste - ripartizione per area di intervento
O.123(1)	Valore aggiunto per i programmi agricoli e forestali - ripartizione per tipo di settore
O.123(2)	Valore aggiunto per i programmi agricoli e forestali - ripartizione per dimensioni delle imprese
O.123(3)	Valore aggiunto per i programmi agricoli e forestali - ripartizione per area di intervento
O.123(4)	Valore aggiunto per i programmi agricoli e forestali - ripartizione per area di intervento
O.124	Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale
O.125	Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
O.126(1)	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di mezzi di prevenzione adeguati - ripartizione delle superfici sovvenzionate per tipo di azione e tipo di danno
O.126(2)	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di mezzi di prevenzione adeguati - ripartizione delle domande per tipo di danno
O.131	Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria
O.132	Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare
O.133	Attività di informazione e promozione
O.141	Agricoltura di semisussistenza
O.142	Associazioni di produttori
O.143	Zone svantaggiate (aziende beneficiarie di indennità compensative per tipo predominante di zona) - Reg. (CE) n.1257/1999
O.211	Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali e delle zone montane (articolo 26, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1698/2005
O.212	Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane (articolo 36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005
O.213	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE (WFD - Direttiva quadro acque)
O.AGRI-ENV	Pagamenti agroambientali - contratti in corso conclusi nel precedente periodo di programmazione
O.214(1)	Pagamenti agroambientali
O.214(2)	Pagamenti agroambientali - numero di unità di bestiame
O.215	Pagamenti per il benessere degli animali
O.216	Investimenti non produttivi
O.221(1)	Imboschimento di superfici agricole - ripartizione per tipo di proprietà terriera
O.221(2)	Imboschimento di superfici agricole - ripartizione per motivazione ambientale
O.221(3)	Imboschimento di superfici agricole - ripartizione per area di intervento
O.222(1)	Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli - ripartizione per uso agricolo dei terreni
O.222(2)	Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli - ripartizione per area di intervento
O.223(1)	Imboschimento di superfici non agricole - ripartizione per tipo di proprietà terriera
O.223(2)	Imboschimento di superfici non agricole - ripartizione per motivazione ambientale
O.223(3)	Imboschimento di superfici non agricole - ripartizione per area di intervento
O.224	Indennità Natura 2000
O.225	Indennità per interventi silvoambientali
O.226(1)	Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi - ripartizione per tipo di azione
O.226(2)	Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi - ripartizione per tipo di intervento
O.227	Investimenti non produttivi
O.311	Diversificazione verso attività non agricole
O.312	Creazione e sviluppo di imprese
O.313	Incentivazione di attività turistiche
O.321	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale
O.322	Sviluppo e rinnovamento dei villaggi
O.323	Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
O.331(1)	Formazione e informazione rivolte agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano nell'asse 3 (ripartizione per contenuto dell'attività)
O.331(2)	Formazione e informazione rivolte agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano nell'asse 3 (ripartizione per tipo di partecipanti)
O.331(3)	Formazione e informazione rivolte agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano nell'asse 3 - ripartizione per genere/età
O.341(1)	Acquisizione di competenze, animazione e attuazione - Ripartizione per tipo di azione
O.341(2)	Acquisizione di competenze, animazione e attuazione - Ripartizione per genere/età
O.341(3)	Acquisizione di competenze, animazione e attuazione - Ripartizione per partenariati pubblici-privati
O.41(1)	Attuazione di strategie di sviluppo locale
O.41(2)	Attuazione di strategie di sviluppo locale
O.41(3)	Attuazione di strategie di sviluppo locale
O.421	Attuazione di progetti di cooperazione
O.431	Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di competenze e animazione sul territorio (articolo 59)
O.A	Indicatori di prodotto supplementari

Codice	Tabelle degli indicatori di risultato
R.1(1)	Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione in materia agricola e/o forestale - ripartizione per tipo di settore
R.1(2)	Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione in materia agricola e/o forestale - ripartizione genere/età
R.2	Valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie
R.3	Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche
R.4	Valore della produzione agricola soggetta a marchi/norme di qualità riconosciuti
R.5	Numero di aziende agricole entrate sul mercato
R.6	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo alla biodiversità, alla qualità dell'acqua, a attenuare i cambiamenti climatici, a migliorare la qualità del suolo, a evitare la marginalizzazione e l'abbandono dei
R.7	Valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie
R.8(1)	Numero lordo di posti di lavoro creati - ripartizione per genere/età/misure pertinenti
R.8(2)	Numero lordo di posti di lavoro creati - ripartizione per genere/età/azioni sovvenzionate
R.26	Numero supplementare di turisti
R.10	Popolazione rurale utente di servizi migliorati
R.11	Maggiore diffusione dell'Internet nelle zone rurali
R.12	Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione
R.A	Indicatori di risultato supplementari

Codice	Tabelle degli indicatori iniziali
B	Indicatori iniziali correlati agli obiettivi e al contesto
B.A	Indicatori iniziali supplementari

Codice	Tabelle degli indicatori di impatto
I	Indicatori di impatto
I.A	Indicatori d'impatto supplementari

PSR

G1 Informazioni di carattere generale

Paese		IT
Regione		Bolzano
Zona	Area di convergenza	No
	Area di non convergenza	Yes
	Aree miste (convergenza e non convergenza):	No
Anno di riferimento		2013
Codice di identificazione del programma		2007IT06RPO002
Modulazione volontaria, controllo disgiunto		No

Persona da contattare

Nome	PAOLO FOX
Organizzazione	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
E-mail	paolo.fox@provincia.bz.it
Telefono	0471/415160

G2 Misure programmate

Codice misura	Misura	Status	Tabelle di prodotto	Tabelle di risultato
111	Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione	X	O.111(1) O.111(2)	R.1(1) R.1(2)
112	Insedimento di giovani agricoltori	X	O.112(1) O.112(2)	R.2
113	Prepensionamento	NP	O.113	R.2
114	Utilizzo di servizi di consulenza	NP	O.114(1) O.114(2)	R.2
115	Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione	X	O.115	R.2
121	Ammodernamento delle aziende agricole	X	O.121(1) O.121(2) O.121(3)	R.2 R.3
122	Accrescimento del valore economico delle foreste	X	O.122(1) O.122(2)	R.2 R.3
123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	X	O.123(1) O.123(2) O.123(3) O.123(4)	R.2 R.3
124	Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale	X	O.124	R.2 R.3
125	Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	X	O.125	R.2
126	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione	NP	O.126(1) O.126(2)	R.2
131	Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	NP	O.131	R.2 R.4
132	Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare	NI	O.132	R.4
133	Attività di informazione e promozione	X	O.133	R.4
141	Agricoltura di semisussistenza	NP	O.141	R.5
142	Associazioni di produttori	NP	O.142	R.5
211	Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali e delle zone montane (articolo 36, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1698/2005)	X	O.LFA O.211	R.6
212	Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane (articolo 36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005)	NP	O.LFA O.212	R.6
213	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE (WFD - Direttiva quadro acque)	NP	O.213	R.6
214	Pagamenti agroambientali	X	O.AGRI-ENV O.214(1) O.214(2)	R.6
215	Pagamenti per il benessere degli animali	NP	O.215	R.6
216	Investimenti non produttivi	NP	O.216	R.6
221	Imboschimento di terreni agricoli	NP	O.221(1) O.221(2) O.221(3)	R.6
222	Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli	NP	O.222(1) O.222(2)	R.6
223	Imboschimento di superfici non agricole	NP	O.223(1) O.223(2) O.223(3)	R.6
224	Indennità Natura 2000	NP	O.224	R.6
225	Pagamenti silvoambientali	NP	O.225	R.6
226	Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi	X	O.226(1) O.226(2)	R.6
227	Investimenti non produttivi	X	O.227	R.6
311	Diversificazione verso attività non agricole	X	O.311	R.7 R.8(1) R.8(2)
312	Creazione e sviluppo di imprese	NP	O.312	R.7 R.8(1) R.8(2)
313	Incentivazione di attività turistiche	X	O.313	R.7 R.8(1) R.8(2) R.9
321	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale	X	O.321	R.10 R.11
322	Sviluppo e rinnovamento dei villaggi	NP	O.322	R.10
323	Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	X	O.323	R.10
331	Formazione e informazione rivolte agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano nell'asse 3	NP	O.331(1) O.331(2) O.331(3)	R.12
341	Acquisizione di competenze, animazione e attuazione	NP	O.341(1) O.341(2) O.341(3)	R.12
411	Attuazione di strategie di sviluppo locale	X	O.41(1) O.41(2) O.41(3)	R.8(1) R.8(2) R.12
412	Attuazione di strategie di sviluppo locale	NP	O.41(1) O.41(2) O.41(3)	R.8(1) R.8(2) R.12
413	Attuazione di strategie di sviluppo locale	X	O.41(1) O.41(2) O.41(3)	R.8(1) R.8(2) R.12
421	Attuazione di progetti di cooperazione	NI	O.421	R.8(1) R.8(2)
431	Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di competenze e animazione sul territorio (articolo 59)	X	O.431	R.12

G3 Avanzamento del Programma - impegni del precedente periodo di programmazione ESCLUSI

ASSE 1

Codice misura	Misura	Indicatori di prodotto	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2007 all'anno 2013	Obiettivi 2007-2013	Tasso di esecuzione del PSR
111	Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione	Numero di partecipanti alla formazione	171	2.458	3.890	63%
		Numero di giorni di formazione impartita	223	1.944	2.850	68%
112	Insediamiento di giovani agricoltori	Numero di giovani agricoltori beneficiari	-	456	450	101%
		Volume totale di investimenti (000 euro)	14,45	9.862,47	9.868,00	100%
113	Prepensionamento	Numero di beneficiari	NP	NP	NP	
		Numero di stari resi disponibili	NP	NP	NP	
114	Utilizzo di servizi di consulenza	Numero di agricoltori beneficiari	NP	NP	NP	
		Numero di proprietari di foreste beneficiari	NP	NP	NP	
115	Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione	Numero di nuovi servizi avviati	-	1	2	50%
121	Ammodernamento delle aziende agricole	Numero di aziende agricole beneficiarie	1	78	120	65%
		Volume totale di investimenti (000 euro)	617,13	21.553,30	23.474,00	92%
122	Accrescimento del valore economico delle foreste	Numero di aziende forestali beneficiarie	7	1.427	1.600	89%
		Volume totale di investimenti (000 euro)	101,49	9.385,79	6.621,00	142%
123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	Numero di imprese beneficiarie	7	79	309	26%
		Volume totale di investimenti (000 euro)	10.158,50	80.724,00	84.021,00	96%
124	Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale	Numero di iniziative di cooperazione sovvenzionate	4	4	5	80%
125	Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	Numero di operazioni sovvenzionate	-	43	71	61%
		Volume totale di investimenti (000 euro)	772,65	6.739,62	12.482,00	54%
126	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione	Zona di superficie agricola danneggiata sovvenzionata (ha)	NP	NP	NP	
		Volume totale di investimenti (000 euro)	NP	NP	NP	
131	Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	Numero di beneficiari	NP	NP	NP	
132	Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare	Numero di aziende agricole beneficiarie	NI	NI	-	
133	Attività di informazione e promozione	Numero di azioni sovvenzionate	-	1	2	50%
141	Agricoltura di semisussistenza	Numero di aziende agricole di semisussistenza beneficiarie	NP	NP	NP	
		Associazioni di produttori beneficiarie	NP	NP	NP	
142	Associazioni di produttori	Fatturato delle associazioni di produttori beneficiarie (000 euro)	NP	NP	NP	

ASSE 2

Codice misura	Misura	Indicatori di prodotto	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2007 all'anno 2013	Obiettivi 2007-2013	Tasso di esecuzione del PSR
211	Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali e delle zone montane (articolo 36, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1698/2005)	Numero di aziende beneficiarie	8.267	8.470	7.600	111%
		SAU beneficiarie (ha)	91.528	92.634	90.000	103%
212	Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane (articolo 36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005)	Numero di aziende beneficiarie	NP	NP	NP	
		SAU beneficiarie (ha)	NP	NP	NP	
213	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE (WFD - Direttiva quadro acque)	Numero di aziende beneficiarie	NP	NP	NP	
		SAU beneficiarie (ha)	NP	NP	NP	
214	Pagamenti agroambientali	Numero di aziende beneficiarie	7.982	9.982	9.000	111%
		Superficie complessivamente interessata dall'aiuto (ha)	148.874	167.784,00	160.000	105%
		Superficie fisica interessata dal sostegno (ha)	148.874	167.784,00	160.000	105%
		Numero di contratti	10.753	14.478	9.000	161%
215	Pagamenti per il benessere degli animali	Numero di aziende agricole beneficiarie	NP	NP	NP	
		Numero di contratti	NP	NP	NP	
216	Investimenti non produttivi	Numero di aziende beneficiarie	NP	NP	NP	
		Volume totale di investimenti (000 euro)	NP	NP	NP	
221	Imboschimento di terreni agricoli	Numero di beneficiari	NP	NP	NP	
		Numero di ettari imboschiti	NP	NP	NP	
222	Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli	Numero di beneficiari	NP	NP	NP	
		SAU beneficiarie (ha)	NP	NP	NP	
223	Imboschimento di superfici non agricole	Numero di beneficiari	NP	NP	NP	
		Numero di ettari imboschiti	NP	NP	NP	
224	Indennità Natura 2000	Numero di aziende forestali beneficiarie	NP	NP	NP	
		Superficie forestale sovvenzionata (ha)	NP	NP	NP	
225	Pagamenti silvoambientali	Numero di aziende forestali beneficiarie	NP	NP	NP	
		Superficie forestale complessivamente interessata dall'aiuto (ha)	NP	NP	NP	
		Superficie fisica forestale interessata dal sostegno (ha)	NP	NP	NP	
		Numero di contratti	NP	NP	NP	
226	Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi	Numero di azioni sovvenzionate	-	41	30	137%
		Numero di proprietari di foreste beneficiari	4	15	24	63%
227	Investimenti non produttivi	Volume totale di investimenti (000 euro)	42,73	241,95	438,00	55%

ASSE 3

Codice misura	Misura	Indicatori di prodotto	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2007 all'anno 2013	Obiettivi 2007-2013	Tasso di esecuzione del PSR
311	Diversificazione verso attività non agricole	Numero di beneficiari	19	167	199	84%
		Volume totale di investimenti (000 euro)	1.502,90	13.166,12	15.000,00	88%
312	Creazione e sviluppo di imprese	Numero di microimprese beneficiarie	NP	NP	NP	
313	Incentivazione di attività turistiche	Numero di nuove attività turistiche sovvenzionate	16	42	28	150%
		Volume totale di investimenti (000 euro)	687,69	1.800,52	10.948,00	16%
321	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale	Numero di azioni sovvenzionate	7	82	89	92%
		Volume totale di investimenti (000 euro)	2.233,25	16.993,07	21.900,00	78%
322	Sviluppo e rinnovamento dei villaggi	Numero di villaggi interessati	NP	NP	27	
		Volume totale di investimenti (000 euro)	NP	NP	7.228	
323	Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	Numero di azioni sovvenzionate	14	45	33	136%
		Volume totale di investimenti (000 euro)	250,40	942,17	1.276,00	74%
331	Formazione e informazione rivolte agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano nell'asse 3	Numero di operatori economici beneficiari	NP	NP	NP	
		Numero di giorni di formazione impartita	NP	NP	NP	
341	Acquisizione di competenze, animazione e attuazione	Numero di azioni sovvenzionate	NP	NP	NP	

ASSE 4

Codice misura	Misura	Indicatori di prodotto	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2007 all'anno 2013	Obiettivi 2007-2013	Tasso di esecuzione del PSR
411	Attuazione di strategie di sviluppo locale	Numero di GAL	-	4	4	100%
412		Superficie totale coperta dai GAL (km²)	-	2.031	3.000	68%
413		Popolazione totale coperta dai GAL	-	47.594	35.000	136%
		Numero di progetti finanziati dai GAL	36	79	266	30%
		Numero di beneficiari	18	42	678	6%
421	Attuazione di progetti di cooperazione	Numero di progetti di cooperazione finanziati	NI	NI	4	
		Numero di GAL cooperanti	NI	NI	4	
431	Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di competenze e animazione sul territorio (articolo 59)	Numero di azioni sovvenzionate	20	80	150	53%

G4 Ripartizione geografica del sostegno

Codice misura	Misura	Indicatore	Zona normale	Zone svantaggiate			TOTALE
				Territorio montano	Altre zone svantaggiate	Totale zone svantaggiate	
112	Insediamento di giovani agricoltori	Numero di domande approvate	62	395	0	395	457
		Spesa pubblica	1227990,07	8654483,52	0	8654483,52	9882473,59
121	Ammodernamento delle aziende agricole	Numero di domande approvate	0	78	0	78	78
		Spesa pubblica	0	9772487,16	0	9772487,16	9772487,16
122	Accrescimento del valore economico delle foreste	Numero di domande approvate	0	1639	0	1639	1639
		Spesa pubblica	0	4042272,03	0	4042272,03	4042272,03
213	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE (WFD - Direttiva quadro acque)	Numero di domande approvate	NP	NP	NP		
		Spesa pubblica	NP	NP	NP		
214	Pagamenti agroambientali	Numero di domande approvate	3778	65732	0	65732	69510
		Spesa pubblica	5785226,61	115349838	0	115349838	121135064,6
221	Imboschimento di terreni agricoli	Numero di domande approvate	NP	NP	NP		
		Spesa pubblica	NP	NP	NP		
222	Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli	Numero di domande approvate	NP	NP	NP		
		Spesa pubblica	NP	NP	NP		
223	Imboschimento di superfici non agricole	Numero di domande approvate	NP	NP	NP		
		Spesa pubblica	NP	NP	NP		
224	Indennità Natura 2000	Numero di aziende forestali beneficiarie	NP	NP	NP		
		Spesa pubblica	NP	NP	NP		

PSR

G5 Esecuzione finanziaria del programma

ASSE 1

Codice misura	Misura	Spesa pubblica (FEASR) - Anno 2013	Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi dal 2007 all'anno 2013		Spesa pubblica programmata 2007 - 2013		Esecuzione finanziaria del PSR
			FEASR	TOTALE	Di cui FEASR	TOTALE	
111	Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione	98,07	294,19	668,05	616,00	1.398,44	47,8%
112	Inseadimento di giovani agricoltori	6,36	4.349,56	9.882,47	4.355,34	9.887,50	99,9%
113	Prepensionamento	NP	NP	NP	NP	NP	
114	Utilizzo di servizi di consulenza	NP	NP	NP	NP	NP	
115	Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione	-	88,21	200,00	176,22	400,07	50,0%
121	Ammodernamento delle aziende agricole	138,15	4.304,91	9.772,49	4.653,00	10.563,25	92,5%
122	Accrescimento del valore economico delle foreste	16,10	1.782,48	4.042,27	1.804,00	4.095,45	98,7%
123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	1.674,28	12.784,59	28.995,07	15.463,21	35.104,61	82,6%
124	Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale	239,71	239,71	544,18	246,40	559,38	97,3%
125	Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	225,55	3.168,04	7.195,03	5.340,71	12.124,49	59,3%
126	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione	NP	NP	NP	NP	NP	
131	Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	NP	NP	NP	NP	NP	
132	Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare	NI	NI	NI	8,80	19,98	
133	Attività di informazione e promozione	-	119,06	270,20	330,00	749,17	36,1%
141	Agricoltura di semisussistenza	NP	NP	NP	NP	NP	
142	Associazioni di produttori	NP	NP	NP	NP	NP	

ASSE 2

Codice misura	Misura	Spesa pubblica (FEASR) - Anno 2013	Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi dal 2007 all'anno 2013		Spesa pubblica programmata 2007 - 2013		Esecuzione finanziaria del PSR
			FEASR	TOTALE	Di cui FEASR	TOTALE	
211	Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali e delle zone montane (articolo 36, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1698/2005)	4,51	27.431,88	62.345,17	27.434,52	62.351,21	100,0%
212	Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane (articolo 36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005)	NP	NP	NP	NP	NP	
213	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE (WFD - Direttiva quadro acque)	NP	NP	NP	NP	NP	
214	Pagamenti agroambientali	6.605,72	53.299,38	121.135,06	56.534,79	128.488,23	94,3%
215	Pagamenti per il benessere degli animali	NP	NP	NP	NP	NP	
216	Investimenti non produttivi	NP	NP	NP	NP	NP	
221	Imboschimento di terreni agricoli	NP	NP	NP	NP	NP	
222	Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli	NP	NP	NP	NP	NP	
223	Imboschimento di superfici non agricole	NP	NP	NP	NP	NP	
224	Indennità Natura 2000	NP	NP	NP	NP	NP	
225	Pagamenti silvoambientali	NP	NP	NP	NP	NP	
226	Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi	-	1.137,56	2.585,35	1.140,47	2.591,97	99,7%
227	Investimenti non produttivi	15,04	91,57	208,124	163,23	370,99	56,1%

ASSE 3

Codice misura	Misura	Spesa pubblica (FEASR) - Anno 2013	Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi dal 2007 all'anno 2013		Spesa pubblica programmata 2007 - 2013		Esecuzione finanziaria del PSR
			FEASR	TOTALE	Di cui FEASR	TOTALE	
311	Diversificazione verso attività non agricole	301,75	2.570,86	5.842,86	2.985,49	6.785,20	86,1%
312	Creazione e sviluppo di imprese	NP	NP	NP	NP	NP	
313	Incentivazione di attività turistiche	250,28	585,16	1.329,91	1.122,00	2.550,00	52,2%
321	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale	760,19	6.007,40	13.653,17	7.540,38	17.137,22	79,7%
322	Sviluppo e rinnovamento dei villaggi	NP	NP	NP	NP	NP	
323	Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	110,18	414,55	942,17	561,40	1.275,91	73,8%
331	Formazione e informazione rivolte agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano nell'asse 3	NP	NP	NP	NP	NP	
341	Acquisizione di competenze, animazione e attuazione	NP	NP	NP	NP	NP	

ASSE 4

Codice misura	Misura	Spesa pubblica (FEASR) - Anno 2013	Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi dal 2007 all'anno 2013		Spesa pubblica programmata 2007 - 2013		Esecuzione finanziaria del PSR
			FEASR	TOTALE	Di cui FEASR	TOTALE	
411 412 413	Attuazione di strategie di sviluppo locale	1.101,83	2.679,90	6.090,59	5.881,49	13.366,70	45,6%
421	Attuazione di progetti di cooperazione	NI	NI	NI	153,56	348,99	
431	Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di competenze e animazione sul territorio (articolo 59)	148,98	559,26	1.270,75	880,00	1.999,95	63,5%

Contenuto dell'attività	Numero di partecipanti alla formazione				Numero unico di partecipanti	Numero di giorni di formazione impartita	Spesa pubblica (000 di euro)	
	Agricoltura	Industria dei prodotti alimentari	Silvicoltura	TOTALE			FEASR	TOTALE
Capacità gestionali, amministrative e di marketing	79	0	0	79		1503	64,8557	147,3994
Formazione TIC	0	0	0	0		0	0	0
Nuovi macchinari e processi tecnologici/pratiche innovative	0	0	68	68		17	24,38109	55,16647
Nuovi requisiti	1578	0	62	1640		403	166,5156	378,19703
Qualità dei prodotti agricoli	15	0	0	15		11	5,67452	12,89663
Salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e protezione dell'ambiente	0	0	500	500		2	24,51345	55,71239
Altre	0	0	156	156		8	8,12256	18,38086
TOTALE	1672	0	786	2458	2458	1944	294,06292	667,75278

O.111(2) Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione

Genere	Età	Numero di partecipanti alla formazione			
		Agricoltura	Industria dei prodotti alimentari	Silvicoltura	TOTALE
Maschi	<40	718	0	198	916
	≥ 40	617	0	369	986
	TOTALE	1335	0	567	1902
Femmine	<40	67	0	51	118
	≥ 40	270	0	168	438
	TOTALE	337	0	219	556

Tipo di settore agricolo	Numero di domande approvate			Spesa pubblica (000 di euro)		Volume totale di investimenti (000 euro)
	Prepensionamento	Altre	TOTALE	FEASR	TOTALE	
Grandi colture	0	0	0	0,00	0,00	0
Orticoltura	0	0	0	0,00	0,00	0
Vino	0	20	20	189,28	430,00	430
Coltivazioni permanenti	0	117	117	1171,78	2662,50	2662,5
Settore lattiero-caseario	0	295	295	2728,86	6199,98	6199,98
Animali da pascolo (escluso settore lattiero-caseario)	0	0	0	0,00	0,00	0
Suini	0	0	0	0,00	0,00	0
Pollame	0	0	0	0,00	0,00	0
Aziende miste (coltivazioni - allevamento)	0	21	21	228,83	519,99	519,99
Altre	0	3	3	22,00	50,00	50
TOTALE	0	456	456	4340,76	9862,47	9862,47359
Impegni del precedente periodo di programmazione			1	8,80	20,00	

O.112(2) Insediamento di giovani agricoltori

<i>Genere</i>	Numero di giovani agricoltori beneficiari
Maschi	398
Femmine	58
TOTALE	456

Tipo di beneficiario	Numero di domande approvate	Numero di beneficiari					Numero di ettari resi disponibili	Spesa pubblica (000 di euro)	
		Maschi		Femmine		TOTALE		FEASR	TOTALE
		55-64	>64	55-64	>64				
Imprenditori agricoli	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP	NP
Lavoratori agricoli	NP	NP	NP	NP	NP			NP	NP
TOTALE									
Impegni del precedente periodo di programmazione	NP					NP	NP	NP	NP

Tipo di consulenza	Numero di domande approvate			Numero di agricoltori beneficiari	Spesa pubblica (000 di euro)	
	≤ 15.000 EUR	> 15.000 EUR	TOTALE		FEASR	TOTALE
Requisiti minimi (art. 24 del reg. (CE) n. 1698/2005)	NP	NP			NP	NP
Ambientale, incluso agroambientale	NP	NP			NP	NP
Sicurezza sul lavoro	NP	NP			NP	NP
Benessere degli animali	NP	NP			NP	NP
Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali	NP	NP			NP	NP
Gestione d'impresa	NP	NP			NP	NP
Agricoltura biologica	NP	NP			NP	NP
Altre	NP	NP			NP	NP
TOTALE				NP		

O.114(2)

Utilizzo di servizi di consulenza

<i>Tipo di consulenza</i>	Numero di domande approvate	Numero di proprietari di foreste beneficiari	Spesa pubblica (000 di euro)	
			FEASR	TOTALE
Gestione d'impresa	NP		NP	NP
Ambiente	NP		NP	NP
Altre	NP		NP	NP
TOTALE		NP		

O.115

Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione

Tipo di servizio	Numero di nuovi servizi avviati	Spesa pubblica (000 di euro)	
		FEASR	TOTALE
Servizi di gestione	0	0	0
Servizi di sostituzione	1	88,21444	200
Consulenza (aziende agricole/forestali)	0	0	0
TOTALE	1	88,21444	200

Tipo di settore agricolo	Tipologia di investimenti	Numero di domande approvate			Spesa pubblica (000 di euro)		Volume totale di investimenti (000 euro)
		Produzione biologica	Produzione convenzionale	TOTALE	FEASR	TOTALE	
Grandi colture	Miglioramento fondiario	0	0	0	0	0	0
	Macchine	0	0	0	0	0	0
	Fabbricati	0	0	0	0	0	0
	Altre	0	0	0	0	0	0
Orticoltura	Miglioramento fondiario	0	0	0	0	0	0
	Macchine	0	0	0	0	0	0
	Fabbricati	0	0	0	0	0	0
	Altre	0	0	0	0	0	0
Vino	Miglioramento fondiario	0	0	0	0	0	0
	Macchine	0	0	0	0	0	0
	Fabbricati	0	0	0	0	0	0
	Altre	0	0	0	0	0	0
Coltivazioni permanenti	Miglioramento fondiario	0	0	0	0	0	0
	Macchine	0	0	0	0	0	0
	Fabbricati	0	0	0	0	0	0
	Altre	0	0	0	0	0	0
Settore lattiero- caseario	Miglioramento fondiario	0	0	0	0	0	0
	Macchine	0	0	0	0	0	0
	Fabbricati	0	78	78	4304,90826	9772,48716	21553,29311
	Altre	0	0	0	0	0	0
Animali da pascolo (escluso settore lattiero-caseario)	Miglioramento fondiario	0	0	0	0	0	0
	Macchine	0	0	0	0	0	0
	Fabbricati	0	0	0	0	0	0
	Altre	0	0	0	0	0	0
Suini	Miglioramento fondiario	0	0	0	0	0	0
	Macchine	0	0	0	0	0	0
	Fabbricati	0	0	0	0	0	0
	Altre	0	0	0	0	0	0
Pollame	Miglioramento fondiario	0	0	0	0	0	0
	Macchine	0	0	0	0	0	0
	Fabbricati	0	0	0	0	0	0
	Altre	0	0	0	0	0	0
Aziende miste (coltivazioni - allevamento)	Miglioramento fondiario	0	0	0	0	0	0
	Macchine	0	0	0	0	0	0
	Fabbricati	0	0	0	0	0	0
	Altre	0	0	0	0	0	0
Altre	Miglioramento fondiario	0	0	0	0	0	0
	Macchine	0	0	0	0	0	0
	Fabbricati	0	0	0	0	0	0
	Altre	0	0	0	0	0	0
TOTALE		0	78	78	4304,90826	9772,48716	21553,29311
Impegni del precedente periodo di programmazione				0	0	0	

O.121(2)

Ammodernamento delle aziende

Tipo di beneficiario	Genere	Età	Numero di aziende agricole beneficiarie
Persone fisiche	Maschi	<40	26
		≥ 40	44
	Femmine	<40	1
		≥ 40	7
	TOTALE		78
Persone giuridiche			0
TOTALE			78

Area d'intervento	Numero di domande approvate			Spesa pubblica (000 di euro)		Volume totale di investimenti (000 euro)
	Produzione biologica	Altre produzioni	TOTALE	FEASR	TOTALE	
Regioni ultraperiferiche	0	0	0	0	0	0
Isole minori del Mar Egeo (reg. (CEE) n. 2019/93)	0	0	0	0	0	0
Territorio montano	0	78	78	4304,90826	9772,48716	21553,29311
Zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane	0	0	0	0	0	0
Zone Natura 2000	0	0	0	0	0	0
Zone di cui alla direttiva 2000/60/CE	0	0	0	0	0	0
Zone miste	0	0	0	0	0	0
Altre	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	78	78	4304,90826	9772,48716	21553,29311

O.122(1)

Accrescimento del valore economico delle foreste

Tipo di imprenditore	Numero di domande approvate	Numero di aziende forestali beneficiarie	Spesa pubblica (000 di euro)		Volume totale di investimenti (000 euro)
			FEASR	TOTALE	
Imprenditori privati	1478	1355	1555,74577	3527,31557	8519,46566
Comuni	21	16	50,99593	115,76638	246,27626
Altre	94	56	130,38498	296,1084	620,04415
TOTALE	1593	1427	1737,12668	3939,19035	9385,78607

Area d'intervento	Numero di domande approvate	Numero di aziende forestali beneficiarie	Spesa pubblica (000 di euro)		Volume totale di investimenti (000 euro)
			FEASR	TOTALE	
Regioni ultraperiferiche	0	0	0	0	0
Territorio montano	1593	1427	1737,12668	3939,19035	9385,78607
Zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane	0	0	0	0	0
Zone Natura 2000	0	0	0	0	0
Zone di cui alla direttiva 2000/60/CE	0	0	0	0	0
Zone miste	0	0	0	0	0
Altre	0	0	0	0	0
TOTALE	1593	1427	1737,12668	3939,19035	9385,78607

Tipo di settore	Tipo di attività	Numero di domande approvate			Numero di imprese beneficiarie	Spesa pubblica (000 di euro)		Volume totale di investimenti (000 euro)
		Produzione biologica	Produzione convenzionale	TOTALE		FEASR	TOTALE	
Agricoltura	Grandi colture	0	0	0	0	0	0	0
	Orticoltura	0	0	0	0	0	0	0
	Vino	0	8	8	8	3154,9329	7168,5	21495
	Coltivazioni permanenti	1	15	16	16	7797,98665	17668,874	49842,41333
	Settore lattiero-caseario	0	0	0	0	0	0	0
	Animali da pascolo	0	0	0	0	0	0	0
	Suini e/o pollame	0	0	0	0	0	0	0
	Aziende miste (coltivazioni - allevamento)	0	0	0	0	0	0	0
	Produzioni non alimentari	0	0	0	0	0	0	0
	Altre	0	0	0	0	0	0	0
Silvicoltura		0	75	75	53	675,72181	1533,7993	3886,59066
Industria dei prodotti alimentari		0	2	2	2	485,44	1100	5500
Aziende miste		0	0	0	0	0	0	0
TOTALE		1	100	101	79	12114,08136	27471,1733	80724,00399

O.123(2)

Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

<i>Tipo di impresa</i>	Numero di imprese beneficiarie
Microimprese / piccole imprese	56
Medie imprese	23
Imprese medio-grandi	0
Altre	0
TOTALE	79

O.123(3)

Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Area d'intervento	Numero di domande approvate			Spesa pubblica (000 di euro)		Volume totale di investimenti (000 euro)
	Produzione biologica	Produzione convenzionale	TOTALE	FEASR	TOTALE	
Regioni ultraperiferiche	0	0	0	0	0	0
Isole minori del Mar Egeo (reg. (CEE) n. 2019/93)	0	0	0	0	0	0
Altre regioni	1	100	101	12114,08136	27471,1733	80724,00398
TOTALE	1	100	101	12114,08136	27471,1733	80724,00398

O.123(4)

Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Tipo di settore	Numero di domande approvate		
	Trasformazione/ commercializzazione	Sviluppo	TOTALE
Agricoltura	24	0	24
Silvicoltura	75	0	75
Industria dei prodotti alimentari	2	0	2
Aziende miste	0	0	0
TOTALE	101	0	101

Tipo di iniziativa di cooperazione	Numero di iniziative di cooperazione sovvenzionate					Spesa pubblica (000 di euro)	
	Agricoltura	Alimenti	Silvicoltura	Aziende miste	TOTALE	FEASR	TOTALE
Sviluppo di nuovi prodotti	1	NI	2	NI	3	218,21385	495,37764
Sviluppo di nuove tecniche	NI	NI	1	NI	1	21,4964	48,8
TOTALE	1		3		4	239,71025	544,17764

Tipi di operazione	Numero di domande approvate	Numero di operazioni sovvenzionate			Spesa pubblica (000 di euro)		Volume totale di investimenti (000 euro)		
		Terreni agricoli	Terreni forestali	TOTALE	FEASR	TOTALE	Terreni agricoli	Terreni forestali	TOTALE
Accesso	NI	NI	NI		NI	NI	NI	NI	
Approvvigionamento di energia	NI	NI	NI		NI	NI	NI	NI	
Gestione delle risorse idriche	2	2	NI	2	1403,28592	3188,70431	4564,72441	NI	4564,72441
Ricomposizione e miglioramento fondiari	NI	NI	NI		NI	NI	NI	NI	
Altre	41	0	41	41	629,91436	1427,14401	0	2174,89068	2174,89068
TOTALE	43	2	41	43	2033,20028	4615,84832	4564,72441	2174,89068	6739,61509

O.126(1) Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione

Tipo di azione Sottotipo di azione		Numero di domande approvate	Zona di superficie agricola danneggiata sovvenzionata (ha)						Spesa pubblica (000 di euro)							Volume totale di investimenti (000 euro)
									FEASR						TOTALE	
			Alluvioni	Tempeste	Malattie	Incendi	Altre	TOTALE	Alluvioni	Tempeste	Malattie	Incendi	Altre	TOTALE		
Prevenzione		NP	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
Ripristino	Infrastrutture	NP	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	Reimpianto	NP	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	Altre	NP	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
TOTALE																

O.126(2)

Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione

<i>Tipo di danni</i>	Numero di domande approvate
Alluvioni	NP
Tempeste	NP
Malattie	NP
Incendi	NP
Altre	NP
TOTALE	

Tipo di azione	Numero di domande approvate	Numero di beneficiari	Spesa pubblica (000 di euro)	
			FEASR	TOTALE
Tutela dell'ambiente	NP		NP	NP
Sanità pubblica	NP		NP	NP
Polizia sanitaria	NP		NP	NP
Fitosanità	NP		NP	NP
Benessere degli animali	NP		NP	NP
Sicurezza sul lavoro	NP		NP	NP
Combinazione	NP		NP	NP
TOTALE		NP		
Impegni del precedente periodo di programmazione	NP		NP	NP

Categoria di prodotto	Numero di aziende agricole beneficiarie	Numero di domande approvate						Spesa pubblica (000 di euro)	
		Regime comunitario				Regime nazionale	TOTALE	FEASR	TOTALE
		509/2006	510/2006	2092/91	1493/99				
Carni fresche	NI	NI	NI	NI	NI	NI		NI	NI
Prodotti a base di carne	NI	NI	NI	NI	NI	NI		NI	NI
Formaggi	NI	NI	NI	NI	NI	NI		NI	NI
Altri prodotti di origine animale	NI	NI	NI	NI	NI	NI		NI	NI
Oli e grassi	NI	NI	NI	NI	NI	NI		NI	NI
Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati	NI	NI	NI	NI	NI	NI		NI	NI
Birra	NI	NI	NI	NI	NI	NI		NI	NI
Bevande a base di estratti di piante	NI	NI	NI	NI	NI	NI		NI	NI
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	NI	NI	NI	NI	NI	NI		NI	NI
Altri prodotti alimentari	NI	NI	NI	NI	NI	NI		NI	NI
TOTALE									
Impegni del precedente periodo di programmazione	NP							NP	NP

Categoria di prodotto	Numero di domande approvate	Numero di azioni sovvenzionate						Spesa pubblica (000 di euro)	
		Regime comunitario				Regime nazionale	TOTALE	FEASR	TOTALE
		509/2006	510/2006	2092/91	1493/99				
Carni fresche	NI	NI	NI	NI	NI	NI		NI	NI
Prodotti a base di carne	NI	NI	NI	NI	NI	NI		NI	NI
Formaggi	1	0	1	0	0	0	1	119,06134	270,195
Altri prodotti di origine animale	NI	NI	NI	NI	NI	NI		NI	NI
Oli e grassi	NI	NI	NI	NI	NI	NI		NI	NI
Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati	NI	NI	NI	NI	NI	NI		NI	NI
Birra	NI	NI	NI	NI	NI	NI		NI	NI
Bevande a base di estratti di piante	NI	NI	NI	NI	NI	NI		NI	NI
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	NI	NI	NI	NI	NI	NI		NI	NI
Altri prodotti alimentari	NI	NI	NI	NI	NI	NI		NI	NI
TOTALE	1	0	1	0	0	0	1	119,06134	270,195
Impegni del precedente periodo di programmazione	NP							NP	NP

<i>Dimensioni delle aziende</i>	Numero di domande approvate	Numero di aziende agricole di semisussistenza beneficiarie	Spesa pubblica (000 di euro)	
			FEASR	TOTALE
Dimensioni < 5 ha	NP	NP	NP	NP
5 ha ≤ dimensione < 10 ha	NP	NP	NP	NP
Dimensioni ≥ 10 ha	NP	NP	NP	NP
TOTALE				
Impegni del precedente periodo di programmazione	NP		NP	NP

Tipo di settore agricolo	Numero di domande approvate	Associazioni di produttori beneficiarie	Fatturato delle associazioni di produttori beneficiarie (000 euro)	Spesa pubblica (000 di euro)	
				FEASR	TOTALE
Grandi colture	NP	NP	NP	NP	NP
Orticoltura	NP	NP	NP	NP	NP
Vino	NP	NP	NP	NP	NP
Coltivazioni permanenti	NP	NP	NP	NP	NP
Settore lattiero-caseario	NP	NP	NP	NP	NP
Animali da pascolo (escluso settore lattiero-caseario)	NP	NP	NP	NP	NP
Suini	NP	NP	NP	NP	NP
Pollame	NP	NP	NP	NP	NP
Aziende miste	NP	NP	NP	NP	NP
Altre	NP	NP	NP	NP	NP
TOTALE					
Impegni del precedente periodo di programmazione	NP			NP	NP

Tipo di zona	Numero di aziende beneficiarie	Numero di ettari interessati dalle indennità di compensazione (ha)	Importo medio dei pagamenti (euro)		Spesa pubblica (000 di euro)	
			Per azienda	per ha	FEASR	TOTALE
Territorio montano	7416	66897,88	643	71	4766,989	10834,065
Altre zone svantaggiate	0	0	0	0	0	0
Zone caratterizzate da svantaggi specifici	0	0	0	0	0	0
TOTALE	7416	66898	643	71	4767	10834
di cui aree Natura 2000	333	3001,00	643	0	214,000	486,000

Tipo di zona	Numero di aziende beneficiarie	SAU beneficiarie (ha)	Spesa pubblica (000 di euro)	
			FEASR	TOTALE
Zone Natura 2000	0	0	0	0
Zone di cui alla direttiva 2000/60/CE	0	0	0	0
Zone miste	0	0	0	0
Altre	8470	92634	22664,88582	51511,10404
TOTALE	8470	92634	22664,88582	51511,10404

Tipo di zona	Numero di aziende beneficiarie						SAU beneficiarie (ha)						Spesa pubblica (000 di euro)	
	Zone umide	Zone collinari	Zone con condizioni climatiche avverse	Zone costiere e isole minori	Altre	TOTALE	Zone umide	Zone collinari	Zone con condizioni climatiche avverse	Zone costiere e isole minori	Altre	TOTALE	FEASR	TOTALE
Zone Natura 2000	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
Zone di cui alla direttiva 2000/60/CE	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
Zone miste	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
Altre	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
TOTALE														

Tipo di zona	Numero di aziende beneficiarie	SAU beneficiarie (ha)	Spesa pubblica (000 di euro)	
			FEASR	TOTALE
Zone Natura 2000	NP	NP	NP	NP
Zone di cui alla direttiva 2000/60/CE	NP	NP	NP	NP
Zone miste	NP	NP	NP	NP
TOTALE				

Tipo di azione	Tipo di colture	Numero di contratti	Numero di ettari oggetto di contratto (ha)	Premio medio per ha (euro)	Spesa pubblica (000 di euro)	
					FEASR	TOTALE
Agricoltura biologica	Colture annuali	82	497	266	132,350	300,795
	Colture permanenti specializzate	166	999	266	266,036	604,628
	Altre	150	901,94	267	240,894	547,487
	TOTALE	398	2397,94	267	639,280	1452,910
Altra riduzione degli input (compresa la produzione integrata)	Colture annuali	1	1,60	176	0,282	0,641
	Colture permanenti specializzate	14	26,19	318	8,332	18,936
	Altre	6973	43921,20	107	4703,214	10689,122
	TOTALE	6988	43948,99	107	4711,827	10708,699
Rotazione delle colture	Colture annuali	0	0	0	0	0
Estensivizzazione	Altre	16	3651,07	11	40,162	91,277
Paesaggio/natura (salvaguardia, ripristino, creazione)	Colture annuali	0	0	0	0	0
	Colture permanenti specializzate	0	0	0	0	0
	Altre	2323	6717	98	660,478	1501,086
	TOTALE	2323	6717	98	660	1501
Varietà vegetali minacciate di erosione genetica	Colture annuali	72	77,05	217	16,712	37,982
	Colture permanenti specializzate	0	0	0	0	0
	Altre	0	0	0	0	0
	TOTALE	72	77,05	217	16,712	37,982
Altre azioni	Colture annuali	0	0	0	0	0
	Colture permanenti specializzate	0	0	0	0	0
	Altre	1268	115885	12	1386,568	3151,292
	TOTALE	1268	115885	12	1387	3151
TOTALE		11065	172676,84	43	7455,027	16943,2442

Tipo di azione	Tipo di bestiame	Numero di contratti	Number of LU under contract	Average premium per LU (EUR)	Spesa pubblica (000 di euro)	
					FEASR	TOTALE
Razze animali che rischiano di non essere più utilizzate nell'allevamento	bovini	0	0	0	0	0
	ovini	0	0	0	0	0
	caprini	0	0	0	0	0
	equidi	0	0	0	0	0
	Suini	0	0	0	0	0
	pollame	0	0	0	0	0
	Aziende miste	1209	10671,8	54	573,633	1303,711
TOTALE		1209	10671,8	54	573,633	1303,7112

Tipo di impegno	Sottotipo di impegno	Numero di domande approvate	Numero di aziende beneficiarie		Superficie complessivamente interessata dall'aiuto (ha)			Superficie fisica interessata dal sostegno (ha)	Numero di contratti			Spesa pubblica (000 di euro)			
			Aziende agricole	Altri gestori del territorio	Aziende agricole	Altri gestori del territorio	TOTALE		Aziende agricole	Altri gestori del territorio	TOTALE	FEASR		TOTALE	
												Esistente	New*	Esistente	New*
0. Regime "Entry level"					0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
1. Agricoltura biologica					3354,57	31,52	3386,09		706	5	711	5316,396502	146,9379121	12082,72976	333,9498111
2. Produzione integrata					0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
3. Altre forme di estensivizzazione dei sistemi di produzione agricola	3a. Riduzione, migliore gestione dei fertilizzanti				0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	3b. Riduzione, migliore gestione dei prodotti fitosanitari				0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	3c. Estensivizzazione della produzione animale				42462,68	0	42462,68		6964	0	6964	23161,24669	215,0238436	52639,25668	488,69056
4. Diversificazione della rotazione delle colture, mantenimento di superfici messe a riposo					0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5. Riduzione delle zone irrigue e/o dei tassi di irrigazione, limitazione del drenaggio					0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6. Azioni mirate a preservare il suolo (ad es. tecniche per prevenire/ridurre l'erosione, inerbimento, agricoltura di conservazione, pacciamatura)					0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7. Creazione, mantenimento di caratteristiche ecologiche (ad es., margini dei terreni, aree tampone, inerbimento, siepi, alberi)					1599,85	58,29	1658,14		705	8	713	949,2989597	22,00179955	2157,49943	50,0041017
8. Gestione dei paesaggi, dei pascoli e dei siti ad elevato valore naturale	8a. Mantenimento del paesaggio e conservazione di habitat agricoli di alto pregio naturale, inclusa la conservazione del patrimonio storico (ad es. muri di pietra, terrazzamenti, piccole zone boschive)				5528,65	61,35	5590		2291	13	2304	4509,141449	56,01768325	10248,06061	127,3128983
	8b. Gestione (compresi limiti ai coefficienti di densità per il bestiame, misure relative alla scarsa intensità, falciatura) e creazione di pascoli (compresa la conversione di seminativi)				95134,46	5975,56	101110,02		1208	28	1236	6005,518282	43,6157892	13648,92015	99,1268
	8c. Gestione di altri habitat agricoli di alto pregio naturale (ad. es. frutteti tradizionali)				853,64	7	860,64		837	3	840	1485,978542	28,5248952	3377,227479	64,82931
9. Azioni mirate a mantenere gli habitat favorevoli alla biodiversità (ad es. lasciando le stoppie invernali sui seminativi, adeguando le date della falciatura)					0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
10. Specie minacciate di estinzione	10a. Mantenimento delle razze locali a rischio						12642,7857		1645	1	1646	3814,848844	63,4831468	8670,120763	144,27987
	10b. Protezione delle varietà vegetali rare minacciate di erosione genetica				73,64	0	73,64		64	0	64	28,28962955	2,323106	64,29458352	5,27979
11. Altre azioni mirate (ad es. uso della pianificazione ambientale integrata)					0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
TOTALE		10635	9616	366	149007,49	6133,72	167783,9957	167783,99	14420	58	14478	45270,7189	577,9281757	102888,1095	1313,473141

Tipo di azione		Tipo di impegno	Numero di domande approvate	Numero di aziende beneficiarie		Superficie complessivamente interessata dall'aiuto (ha)			Superficie fisica interessata dal sostegno (ha)	Numero di contratti			Spesa pubblica (000 di euro)			
				Aziende agricole	Altri gestori del territorio	Aziende agricole	Altri gestori del territorio	TOTALE		Aziende agricole	Altri gestori del territorio	TOTALE	FEASR		TOTALE	
													Esistente	New*	Esistente	New*
Azioni finalizzate in materia di risorse genetiche		Risorse genetiche delle piante coltivate	0										0	0	0	0
		Risorse genetiche animali	0										0	0	0	0
Azioni concertate			0										0	0	0	0
TOTALE			0										0	0	0	0

* Spesa per i nuovi contratti conclusi nell'anno N, this data should also be included in the 'existing' column

O.214(2)

Pagamenti agroambientali

<i>Tipo di impegno</i>	Numero di unità di bestiame
10a. Mantenimento delle razze locali a rischio	12165,4

Tipo di animali	Numero di domande approvate	Numero di aziende agricole beneficiarie	Numero di contratti	Spesa pubblica (000 di euro)			
				FEASR		TOTALE	
				Esistente	New*	Esistente	New*
Vitelli (direttiva 91/629/CEE);	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
Bovini diversi dai vitelli	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
Suini (Direttiva 91/630/CEE)	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
Pollame/uova	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
Altri animali tenuti per fini di allevamento (direttiva 98/58/CE)	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
TOTALE							
Impegni del precedente periodo di programmazione			NP	NP		NP	

* Spesa per i nuovi contratti conclusi nell'anno N, this data should also be included in the 'existing' column

Tipologia di investimenti	Sottotipo di zona	Numero di domande approvate	Numero di aziende beneficiarie	Spesa pubblica (000 di euro)		Volume totale di investimenti (000 euro)
				FEASR	TOTALE	
Investimenti connessi con	l'adempimento degli impegni adottati in conformità della misura di cui all'articolo 36, lettera a), punto iv)	NP		NP	NP	NP
	altri obiettivi agroambientali (biodiversità, uso dell'acqua, nitrati, ecc.)	NP		NP	NP	NP
Investimenti aziendali che valorizzano in termini di pubblica utilità i terreni agricoli	Zone Natura 2000	NP		NP	NP	NP
	di altre zone di valore elevato da definire nel programma	NP		NP	NP	NP
TOTALE			NP			

<i>Tipo di proprietà terriera</i>	Numero di domande approvate	Numero di beneficiari	Numero di ettari imboschiti					Spesa pubblica (000 di euro)	
			Conifere	Latifoglie	Specie a rapido accrescimento	Piantagioni miste	TOTALE	FEASR	TOTALE
Terreni agricoli di proprietà di privati (persone fisiche o giuridiche di diritto privato)	NP	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
Terreni agricoli detenuti da autorità pubbliche (comuni e associazioni municipali)	NP	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
Altre	NP	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
TOTALE									
Impegni del precedente periodo di programmazione	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP

Motivazione ambientale	Numero di domande approvate	Numero di ettari imboschiti					Spesa pubblica (000 di euro)	
		Conifere	Latifoglie	Specie a rapido accrescimento	Piantagioni miste	TOTALE	FEASR	TOTALE
Prevenzione dell'erosione o desertificazione	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
Miglioramento della biodiversità	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
Protezione delle risorse idriche	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
Prevenzione delle alluvioni	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
Riduzione dei cambiamenti climatici	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
Altre	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
TOTALE								

Tipo di zona	Numero di domande approvate	Numero di ettari imboschiti					Spesa pubblica (000 di euro)	
		Conifere	Latifoglie	Specie a rapido	Piantagioni miste	TOTALE	FEASR	TOTALE
Articolo 36, lettera a), punti i) e ii) del reg. 1698/2005	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
Articolo 36, lettera a), punto iii) del reg. 1698/2005	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
Regioni ultraperiferiche	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
Aziende miste	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
Altri settori	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
TOTALE								

O.222(1)

Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

Uso agricolo del suolo	Numero di domande approvate	Numero di beneficiari	SAU beneficiarie (ha)				Spesa pubblica (000 di euro)	
			Conifere	Latifoglie	Altre	TOTALE	FEASR	TOTALE
Agricoltura	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
Formazioni erbose	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
Altre	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
TOTALE								

O.222(2)

Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

Tipo di zona	SAU beneficiarie (ha)				Spesa pubblica (000 di euro)	
	Conifere	Latifoglie	Altre	TOTALE	FEASR	TOTALE
Articolo 36, lettera a), punti i) e ii) del reg. 1698/2005	NP	NP	NP		NP	NP
Articolo 36, lettera a), punto iii) del reg. 1698/2005	NP	NP	NP		NP	NP
Regioni ultraperiferiche	NP	NP	NP		NP	NP
Altri settori	NP	NP	NP		NP	NP
TOTALE						

Tipo di proprietà terriera	Numero di domande approvate	Numero di beneficiari	Numero di ettari imboschiti					Spesa pubblica (000 di euro)	
			Conifere	Latifoglie	Specie a rapido accrescimento	Piantagioni miste	TOTALE	FEASR	TOTALE
Terreni non agricoli di proprietà di privati (persone fisiche o giuridiche di diritto privato)	NP	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
Terreni non agricoli detenuti da autorità pubbliche (comuni e associazioni municipali)	NP	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
Altre	NP	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
TOTALE									
Impegni del precedente periodo di programmazione	NP		NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP

Motivazione ambientale	Numero di domande approvate	Numero di ettari imboschiti					Spesa pubblica (000 di euro)	
		Conifere	Latifoglie	Specie a rapido accrescimento	Piantagioni miste	TOTALE	FEASR	TOTALE
Prevenzione dell'erosione o desertificazione	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
Miglioramento della biodiversità	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
Protezione delle risorse idriche	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
Prevenzione delle alluvioni	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
Riduzione dei cambiamenti climatici	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
Altre	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
TOTALE								

Tipo di zona	Numero di domande approvate	Numero di ettari imboschiti					Spesa pubblica (000 di euro)	
		Conifere	Latifoglie	Specie a rapido accrescimento	Piantagioni miste	TOTALE	FEASR	TOTALE
Articolo 36, lettera a), punti i) e ii) del reg. 1698/2005	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
Articolo 36, lettera a), punto iii) del reg. 1698/2005	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
Regioni ultraperiferiche	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
Aziende miste	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
Altri settori	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
TOTALE								

Tipo di pagamento	Numero di aziende forestali beneficiarie	Superficie forestale sovvenzionata (ha)	Spesa pubblica (000 di euro)	
			FEASR	TOTALE
Indennità Natura 2000	NP	NP	NP	NP
TOTALE				

Tipo di impegno		Sottotipo di impegno	Numero di domande approvate	Numero di aziende forestali beneficiarie	Superficie forestale complessivame nte interessata dall'aiuto (ha)	Superficie fisica forestale interessata dal sostegno (ha)	Numero di contratti	Spesa pubblica (000 di euro)			
								FEASR		TOTALE	
								Esistente	New*	Esistente	New*
Miglioramento della biodiversità			NP	NP	NP		NP	NP	NP	NP	
Conservazione degli ecosistemi di grande pregio			NP	NP	NP		NP	NP	NP	NP	
Consolidamento della funzione protettiva delle foreste con riguardo a	Erosione del suolo		NP	NP	NP		NP	NP	NP	NP	
	Assetto idrologico e qualità dell'acqua		NP	NP	NP		NP	NP	NP	NP	
	Rischi naturali		NP	NP	NP		NP	NP	NP	NP	
Altre			NP	NP	NP		NP	NP	NP	NP	
TOTALE						NP					

* Spesa per i nuovi contratti conclusi nell'anno N, this data should also be included in the 'existing' column

O.226(1) Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi

Tipo di azione	Sottotipo di azione	Numero di domande approvate	Numero di azioni sovvenzionate	Superficie forestale danneggiata sovvenzionata (ha)			Volume totale di investimenti (000 euro)			Spesa pubblica (000 di euro)	
				Imprenditori privati	Proprietà pubblica	TOTALE	Imprenditori privati	Proprietà pubblica	TOTALE	FEASR	TOTALE
Prevenzione	dei danni provocati da incendi		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dei danni provocati da calamità naturali		41	34,8	85,5	120,3	108,78129	1163,12915	1271,91044	559,64058	1271,91044
Ripristino	dei danni provocati da incendi		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dei danni provocati da calamità naturali		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE		25	41	34,8	85,5	120,3	108,78129	1163,12915	1271,91044	559,64058	1271,91044

Tipologie di intervento	Numero di azioni sovvenzionate	Superficie forestale danneggiata sovvenzionata (ha)			Volume totale di investimenti (000 euro)			Spesa pubblica (000 di euro)	
		Imprenditori privati	Proprietà pubblica	TOTALE	Imprenditori privati	Proprietà pubblica	TOTALE	FEASR	TOTALE
Infrastrutture	3	2	13	15	27,181	84,35516	111,53616	49,07591	111,53616
Reimpianto	27	9	33	42	31,04645	477,76166	508,80811	223,87556	508,80811
Altri reinvestimenti in aziende forestali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre azioni di prevenzione	11	23,8	39,5	63,3	289,7851	361,78107	651,56617	286,68911	651,56617
TOTALE	41	34,8	85,5	120,3	348,01255	923,89789	1271,91044	559,64058	1271,91044

Tipologia di investimenti	Sottotipo di investimento	Numero di domande approvate	Numero di proprietari di foreste beneficiari	Spesa pubblica (000 di euro)		Volume totale di investimenti (000 euro)
				FEASR	TOTALE	
Investimenti connessi con	l'adempimento degli impegni adottati in conformità della misura di cui all'articolo 36, lettera b), punto iv)	NI	NI	NI	NI	NI
	altri obiettivi ambientali	NI	NI	NI	NI	NI
Investimenti intesi a valorizzare in termini di pubblica utilità le foreste e i boschi della zona interessata		15	15	85,16502	193,55682	241,94603
TOTALE		15	15	85,16502	193,55682	241,94603

Tipo di attività rurale non agricola	Numero di domande approvate	Numero di beneficiari							Spesa pubblica (000 di euro)		Volume totale di investimenti (000 euro)
		Persone fisiche					Persone giuridiche	TOTALE	FEASR	TOTALE	
		Maschi		Femmine		TOTALE					
		< 25	≥ 25	< 25	≥ 25						
Turismo	167	1	151	1	14	167	0	167	2570,8569	5842,8566	13166,12246
Artigianato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Commercio al dettaglio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produzione di energia rinnovabile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altro (custodia di bambini, ...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	167	1	151	1	14	167	0	167	2570,8569	5842,8566	13166,12246

Tipologia di microimpresa	Numero di domande approvate	Numero di microimprese beneficiarie							Spesa pubblica (000 di euro)	
		Persone fisiche					Persone giuridiche	TOTALE		
		Maschi		Femmine		TOTALE				
		< 25	≥ 25	< 25	≥ 25					
Creazione di microimprese	NP	NP	NP	NP	NP		NP		NP	NP
Sviluppo di microimprese	NP	NP	NP	NP	NP		NP		NP	NP
TOTALE										

Tipo di azione	Numero di nuove attività turistiche sovvenzionate	Spesa pubblica (000 di euro)		Volume totale di investimenti (000 euro)
		FEASR	TOTALE	
Infrastrutture su piccola scala (centri d'informazione, segnaletica stradale indicante località turistiche, ...)	0	0	0	0
Infrastrutture ricreative (che permettano l'accesso a aree naturali, con servizi di piccola ricettività, ...)	42	585,15894	1329,90666	1800,51941
Sviluppo e/o commercializzazione di servizi inerenti al turismo rurale	0		0	0
TOTALE	42	585,15894	1329,90666	1800,51941

Tipo di azione	Numero di azioni sovvenzionate	Spesa pubblica (000 di euro)		Volume totale di investimenti (000 euro)
		FEASR	TOTALE	
Iniziativa TIC (ad es., infrastruttura)	NI	NI	NI	NI
Mobilità	NI	NI	NI	NI
Infrastruttura culturale e sociale	NI	NI	NI	NI
Infrastruttura ambientale (fognature, trattamento delle acque reflue) / energia	NI	NI	NI	NI
Formazione	NI	NI	NI	NI
Custodia dei bambini	NI	NI	NI	NI
Altre	82	5955,6522	13535,57318	16993,07033
TOTALE	82	5955,6522	13535,57318	16993,07033

Tipologia di interventi di rilancio	Numero di domande approvate	Numero di villaggi interessati	Spesa pubblica (000 di euro)		Volume totale di investimenti (000 euro)
			FEASR	TOTALE	
Superficie fisica	NP		NP	NP	NP
Sociale	NP		NP	NP	NP
Economico	NP		NP	NP	NP
TOTALE		NP			

Tipo di azione	Numero di azioni sovvenzionate	Spesa pubblica (000 di euro)		Volume totale di investimenti (000 euro)
		FEASR	TOTALE	
Patrimonio naturale (articolo 57, lettera a), del reg. 1698/2005)	45	414,55388	942,16794	942,16794
Patrimonio culturale (articolo 57, lettera b), del reg. 1698/2005)	0	0	0	0
TOTALE	45	414,55388	942,16794	942,16794

O.331(1)

Formazione e informazione
rivolte agli operatori economici

Contenuto dell'attività	Numero di operatori economici beneficiari	Numero di operatori beneficiari - numero unico	Numero di giorni di formazione impartita	Spesa pubblica (000 di euro)	
				FEASR	TOTALE
Capacità gestionali, amministrative (contabilità) e di marketing	NP		NP	NP	NP
Formazione TIC	NP		NP	NP	NP
Salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e protezione dell'ambiente	NP		NP	NP	NP
Altre	NP		NP	NP	NP
TOTALE		NP			

O.331(2)

Formazione e informazione rivolte agli
operatori economici impegnati nei settori che

<i>Tipo di operatore</i>	Numero di operatori beneficiari - numero unico
Microimprese	NP
Organizzazioni senza fini di lucro	NP
Enti pubblici	NP
Singole imprese agricole	NP
Altri lavoratori autonomi	NP
TOTALE	

<i>Tipo di operatore</i>	<i>Genere</i>	<i>Età</i>	Numero di operatori economici beneficiari
Singoli imprenditori agricoli	Maschi	< 25	NP
		≥ 25	NP
	Femmine	< 25	NP
		≥ 25	NP
Altri lavoratori autonomi	Maschi	< 25	NP
		≥ 25	NP
	Femmine	< 25	NP
		≥ 25	NP
TOTALE			

O.341(1)

Acquisizione di competenze, animazione e attuazione

Tipo di azione	Numero di azioni sovvenzionate	Numero di partecipanti	Spesa pubblica (000 di euro)	
			FEASR	TOTALE
Studi sulla zona interessata	NP	NP	NP	NP
Attività d'informazione sulla zona e sulla strategia di sviluppo locale	NP	NP	NP	NP
Formazione del personale addetto all'elaborazione e all'esecuzione della strategia di sviluppo locale	NP	NP	NP	NP
Eventi promozionali	NP	NP	NP	NP
Altre	NP	NP	NP	NP
TOTALE				

O.341(2) Acquisizione di competenze, animazione e attuazione

<i>Genere</i>	<i>Età</i>	Numero di partecipanti
Maschi	< 25	NP
	≥ 25	NP
Femmine	< 25	NP
	≥ 25	NP
TOTALE		

O.341(3)

Acquisizione di competenze, animazione e attuazione

Tipo di azione	Numero di PPP sovvenzionati	Spesa pubblica (000 di euro)	
		FEASR	TOTALE
Attuazione da parte di partenariati pubblici-privati diversi da quelli definiti all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), (cioè i gruppi di azione locale nel quadro dell'asse 4 per quanto riguarda l'impostazione Leader) della strategia di sviluppo locale che comprende una o più delle misure di cui all'articolo 52, lettere a), b) e c).	NP	NP	NP
TOTALE			

O.41(1)

Attuazione di strategie di sviluppo locale

Tipo di GAL	Numero di GAL	Superficie totale coperta dai GAL (km ²)	Popolazione totale coperta dai GAL	Spesa pubblica (000 di euro)	
				FEASR	TOTALE
Nuovi GAL	0	0	0	0	0
GAL esistenti (finanziati nel periodo 2000-2006)	4	2031	47594	2679,89802	6090,59183
TOTALE	4	2031	47594	2679,89802	6090,59183

ASSE	Misura	Numero di progetti finanziati dai GAL	Numero di beneficiari					Spesa pubblica (000 di euro)	
			Settore privato		Settore pubblico	GAL	TOTALE	FEASR	TOTALE
			Singoli	Persone giuridiche					
ASSE 1	111	8	0	4	0	0	4	96,11518	218,4436
	112	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	113	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	114	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	115	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	121	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	122	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	123	2	0	2	0	0	2	27,29728	62,03926
	124	0	0	0	0	0	0	0	0
	125	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	126	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	131	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	132	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	133	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	141	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	142	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	Altre	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	TOTALE	10	0	6	0	0	6	123,41246	280,48286
ASSE 2	211	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	212	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	213	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	214	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	215	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	216	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	221	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	222	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	223	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	224	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	225	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	226	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	227	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	Altre	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	TOTALE								
ASSE 3	311	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	312	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	313	49	0	12	8	0	20	1247,09594	2834,30897
	321	0	0	0	0	0	0	0	0
	322	20	0	0	16	0	16	1309,38961	2975,8
	323	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	331	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	341	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	Altre	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	TOTALE	69	0	12	24	0	36	2556,48555	5810,10897

O.41(3) Attuazione di strategie di sviluppo locale

ASSE	Singoli				
	Maschi		Femmine		TOTALE
	< 25	≥ 25	< 25	≥ 25	
ASSE 1	0	0	0	0	0
ASSE 2	NP	NP	NP	NP	
ASSE 3	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0

ASSE	Misura	Numero di progetti di cooperazione finanziati			Numero di GAL cooperanti			Spesa pubblica (000 di euro)			
								FEASR		TOTALE	
		A livello interterritoriale	A livello transnazionale	TOTALE	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	TOTALE	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	A livello interterritoriale	A livello transnazionale
ASSE 1	111	NI	NI		NI	NI		NI	NI	NI	NI
	112	NP	NP		NP	NP		NP	NP	NP	NP
	113	NP	NP		NP	NP		NP	NP	NP	NP
	114	NP	NP		NP	NP		NP	NP	NP	NP
	115	NP	NP		NP	NP		NP	NP	NP	NP
	121	NP	NP		NP	NP		NP	NP	NP	NP
	122	NP	NP		NP	NP		NP	NP	NP	NP
	123	NI	NI		NI	NI		NI	NI	NI	NI
	124	NI	NI		NI	NI		NI	NI	NI	NI
	125	NP	NP		NP	NP		NP	NP	NP	NP
	126	NP	NP		NP	NP		NP	NP	NP	NP
	131	NP	NP		NP	NP		NP	NP	NP	NP
	132	NI	NI		NI	NI		NI	NI	NI	NI
	133	NP	NP		NP	NP		NP	NP	NP	NP
	141	NP	NP		NP	NP		NP	NP	NP	NP
	142	NP	NP		NP	NP		NP	NP	NP	NP
	Altre	NP	NP		NP	NP		NP	NP	NP	NP
	TOTALE										
ASSE 2	211	NP	NP		NP	NP		NP	NP	NP	NP
	212	NP	NP		NP	NP		NP	NP	NP	NP
	213	NP	NP		NP	NP		NP	NP	NP	NP
	214	NP	NP		NP	NP		NP	NP	NP	NP
	215	NP	NP		NP	NP		NP	NP	NP	NP
	216	NP	NP		NP	NP		NP	NP	NP	NP
	221	NP	NP		NP	NP		NP	NP	NP	NP
	222	NP	NP		NP	NP		NP	NP	NP	NP
	223	NP	NP		NP	NP		NP	NP	NP	NP
	224	NP	NP		NP	NP		NP	NP	NP	NP
	225	NP	NP		NP	NP		NP	NP	NP	NP
	226	NP	NP		NP	NP		NP	NP	NP	NP
	227	NP	NP		NP	NP		NP	NP	NP	NP
	Altre	NP	NP		NP	NP		NP	NP	NP	NP
	TOTALE										
ASSE 3	311	NP	NP		NP	NP		NP	NP	NP	NP
	312	NP	NP		NP	NP		NP	NP	NP	NP
	313	NI	NI		NI	NI		NI	NI	NI	NI
	321	NI	NI		NI	NI		NI	NI	NI	NI
	322	NI	NI		NI	NI		NI	NI	NI	NI
	323	NP	NP		NP	NP		NP	NP	NP	NP
	331	NP	NP		NP	NP		NP	NP	NP	NP
	341	NP	NP		NP	NP		NP	NP	NP	NP
	Altre	NP	NP		NP	NP		NP	NP	NP	NP
	TOTALE										

Tipo di evento	Numero di azioni sovvenzionate	Spesa pubblica (000 di euro)	
		FEASR	TOTALE
Studi sulla zona interessata	24	276,69449	628,67424
Attività d'informazione sulla zona e sulla strategia di sviluppo locale	24	175,13112	397,95157
Formazione del personale addetto all'elaborazione e all'esecuzione della strategia di sviluppo locale	24	55,92587	127,07477
Eventi promozionali	8	51,507216	117,0471
Altre	0	0	0
TOTALE	80	559,258696	1270,74768

OA Indicatori di prodotto supplementari

[illegible]

Commenti

NOTA BENE:

Tab. G3:

I dati - obiettivo sono stati aggiornati alla versione del PSR HC del 13 luglio 2010.

Per la misura 211 l'obiettivo dell'indicatore di prodotto relativo al numero medio annuo di aziende beneficiarie è uguale a 7.600.

Il dato cumulato per i 7 anni di programmazione è 53.200 aziende.

Tale obiettivo considera oltre alle risorse cofinanziate anche le risorse esclusivamente provinciali top up.

Gli indicatori relativi alle azioni attivate con l'asse LEADER ma relative alle diverse misure degli assi 1 e 3 sono stati quantificati direttamente negli assi di riferimento e non nell'asse 4

Tab.G5:

Per la suddivisione degli importi tra misure "ordinarie" e Health Check, per la misura 125 si é tenuto conto della provenienza dei fondi:

la quota parte delle risorse con FINALITÀ HC sono state aggiunte alle risorse ordinarie in quanto hanno la stessa provenienza.

per la misura 322 i fondi aggiuntivi HC sono considerati ordinari e sono stati inseriti nella tabella G5 assieme alle altre risorse.

Tab. O211:

Il dato relativo al numero di aziende ed alla superficie a premio é complessiva (parte cofinanziata + parte Top Up)

Ciò in quanto gli obiettivi della misura 211 sono complessivi (7.600 aziende/anno e 90.000 ettari/anno) [parte cofinanziata + parte Top Up]

Il dato finanziario invece fa riferimento solo alla parte cofinanziata, per rendere coerenti i valori rispetto ai dati ufficiali della CE.

I dati finanziari relativi alla quota provinciale Top Up sono stati inseriti nella tabella OA.

G3(2) Avanzamento del Programma - SOLO impegni del precedente periodo di programmazione

AXIS 1

Measure code	Measure	Output Indicators	Realised in year 2013	Total Realised - Cumulative from 2007 to year 2013	Targets 2007-2013
111	Vocational training and information actions	Number of participants in training	0	1	1
112	Setting up of young farmers	Number of applications approved	0	1	1
113	Early retirement	Number of beneficiaries	NP	NP	NP
		Number of hectares released	NP	NP	NP
114	Use of advisory services	Number of applications approved	NP	NP	NP
121	Modernisation of agricultural holdings	Number of applications approved	NP	NP	NP
122	Improvement of the economic value of forests	Number of applications approved	0	46	42
123	Adding value to agricultural and forestry products	Number of applications approved	0	3	3
125	Infrastructure related to the development and adaptation of agriculture and forestry	Number of applications approved	0	37	37
126	Restoring agricultural production potential damaged by natural disasters and introducing appropriate	Number of applications approved	NP	NP	NP
		Area of damaged agricultural land supported (Ha)	NP	NP	NP
131	Meeting standards based on Community legislation	Number of applications approved	NP	NP	NP
132	Participation of farmers in food quality schemes	Number of farm holdings supported	NP	NP	NP
133	Information and promotion activities	Number of applications approved	NP	NP	NP
141	Semi-subsistence farming	Number of applications approved	NP	NP	NP
142	Producer groups	Number of applications approved	NP	NP	NP

AXIS 2

Measure code	Measure	Output Indicators	Realised in year 2013	Total Realised - Cumulative from 2007 to year 2013	Targets 2007-2013
211 212	Payments to farmers in areas with handicaps (Article 36 (a) (i) and (ii) of Reg. (EC) N. 1698/2005)	Number of holdings supported	0	7416	7416
214	Agri-environment payments	Number of contracts	0	12274	12274
215	Animal welfare payments	Number of contracts	NP	NP	NP
216	Non-productive investments	Number of applications approved	NP	NP	NP
		Number of beneficiaries	NP	NP	NP
221	First afforestation of agricultural land	Number of afforested land (Ha)	NP	NP	NP
223	First afforestation of non-agricultural land	Number of afforested land (Ha)	NP	NP	NP
225	Forest-environment payments	Number of applications approved	NP	NP	NP
		Total forest area supported (Ha)	NP	NP	NP
226	Restoring forestry potential and introducing prevention actions	Number of applications approved	0	22	22
227	Non-productive investments	Number of applications approved	0	1	1

AXIS 3

Measure code	Measure	Output Indicators	Realised in year 2013	Total Realised - Cumulative from 2007 to year 2013	Targets 2007-2013
311	Diversification into non-agricultural	Number of applications approved	0	0	1
312	Business creation and development	Number of applications approved	NP	NP	NP
321	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale	Number of applications approved	0	1	1
322	Village renewal and development	Number of applications approved	NP	NP	NP

AXIS 4

Measure code	Measure	Output Indicators	Realised in year 2013	Total Realised - Cumulative from 2007 to year 2013	Targets 2007-2013
411	Implementing local development strategies	Number of projects financed by LAG	NP	NP	NP
412		Number of beneficiaries	NP	NP	NP
413					
421	Implementing cooperation projects	Number of cooperation projects supported	NP	NP	NP
		Number of cooperating LAGs	NP	NP	NP

Parte II:

**TABELLE DEGLI INDICATORI COMUNI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE
DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE**

Output - Health Check and European Economic Recovery Package

2007-2013

Convenzioni utilizzate

a. Colori

Da compilare	<i>Celeste chiaro</i>
Calcolato/compilato automaticamente	<i>Celeste</i>
Da non compilare	<i>Giallo</i>

b. Codici

Non pertinente	NP
Applicabile ma non (ancora) attuata	NI
Dato non disponibile	NA

c. Codici dei paesi

AUSTRIA	AT
BELGIO	BE
BULGARIA	BG
CIPRO	CY
REPUBBLICA Ceca+T374	CZ
DANIMARCA	DK
ESTONIA	EE
FINLANDIA	FI
FRANCIA	FR
GERMANIA	DE
GRECIA	GR
UNGHERIA	HU
ITALIA	IT
IRLANDA	IE
LETTONIA	LV
LITUANIA	LT
LUSSEMBURGO	LU
MALTA	MT
PAESI BASSI	NL
POLONIA	PL
PORTOGALLO	PT
ROMANIA	RO
SLOVACCHIA	SK
SLOVENIA	SI
SPAGNA	ES
SVEZIA	SE
REGNO UNITO	UK

d. Codici delle regioni

Cfr. Orientamenti esplicativi

Misure programmate

Codice misura	Misura	Status		Tabelle di risultato
111	Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione	NP	H.111	R.1(1) R.1(2)
112	Insedimento di giovani agricoltori	NP		R.2
113	Prepensionamento	NP		R.2
114	Utilizzo di servizi di consulenza	NP	H.114	R.2
115	Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione	NP	H.115	R.2
121	Ammodernamento delle aziende agricole	X	H.121	R.2 R.3
122	Accrescimento del valore economico delle foreste	NP	H.122	R.2 R.3
123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	NP	H.123	R.2 R.3
124	Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale	NP	H.124	R.2 R.3
125	Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	NI	H.125	R.2
126	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione	NP	H.126	R.2
131	Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	NP		R.2 R.4
132	Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare	NP		R.4
133	Attività di informazione e promozione	NP		R.4
141	Agricoltura di semisussistenza	NP		R.5
142	Associazioni di produttori	NP		R.5
211 212	Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali (articolo 36, lettera a), punto i) ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005)	NP		R.6
213	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE (WFD - Direttiva quadro acque)	NP	H.213	R.6
214	Pagamenti agroambientali	X	H.214	R.6
215	Pagamenti per il benessere degli animali	NP	H.215	R.6
216	Investimenti non produttivi	NP	H.216	R.6
221	Imboschimento di terreni agricoli	NP	H.221	R.6
222	Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli	NP	H.222	R.6
223	Imboschimento di superfici non agricole	NP	H.223	R.6
224	Indennità Natura 1997	NP	H.224	R.6
225	Pagamenti silvoambientali	NP	H.225	R.6
226	Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi	NP	H.226	R.6
227	Investimenti non produttivi	NP	H.227	R.6
311	Diversificazione verso attività non agricole	NP	H.311	R.7 R.8(1) R.8(2)
312	Creazione e sviluppo di imprese	NP	H.312	R.7 R.8(1) R.8(2)
313	Incentivazione di attività turistiche	NP	H.313	R.7 R.8(1) R.8(2)
321	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale	NP	H.321	R.26
322	Sviluppo e rinnovamento dei villaggi	NP	H.322	R.10 R.28
323	Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	NP	H.323	R.10
331	Formazione e informazione rivolte agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano nell'asse 3	NP	H.331	R.12
341	Acquisizione di competenze, animazione e attuazione	NP		R.12
411	Attuazione di strategie di sviluppo locale	NP	H.41	R.8(1) R.8(2) R.12
412	Attuazione di strategie di sviluppo locale	NP	H.41	R.8(1) R.8(2) R.12
413	Attuazione di strategie di sviluppo locale	NP	H.41	R.8(1) R.8(2) R.12
421	Attuazione di progetti di cooperazione	NP		R.8(1) R.8(2)
431	Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di competenze e animazione sul territorio (articolo 59)	NP		R.12

PSR

Avanzamento del programma

ASSE 1

Codice misura	Misura	Indicatori di prodotto	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2009 all'anno 2013	Obiettivi 2007-2013	Tasso di esecuzione del PSR
111	Azioni nel campo della formazione professionale dell'informazione	Numero di partecipanti alla formazione Numero di giorni di formazione impartita	NP NP	NP NP	NP NP	
112	Insedimento di giovani agricoltori	Numero di giovani agricoltori beneficiari	NP	NP	NP	
113	Prepensionamento	Volume totale di investimenti (000 euro) Numero di beneficiari	NP NP	NP NP	NP NP	
114	Utilizzo di servizi di consulenza	Numero di agricoltori beneficiari	NP	NP	NP	
115	Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione	Numero di aziende beneficiarie Numero di nuovi servizi avviati	NP NP	NP NP	NP NP	
121	Ammodernamento delle aziende agricole	Numero di aziende agricole beneficiarie Volume totale di investimenti (000 euro)	1 486,25	23 6061,03625	30 6.944	77% 87%
122	Accrescimento del valore economico delle foreste	Numero di aziende beneficiarie Volume totale di investimenti (000 euro)	NP NP	NP NP	NP NP	
123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	Numero di imprese beneficiarie Volume totale di investimenti (000 euro)	NP NP	NP NP	NP NP	
124	Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale	Numero di iniziative di cooperazione sovvenzionate	NP	NP	NP	
125	Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	Numero di operazioni sovvenzionate Volume totale di investimenti (000 euro)	NI NI	NI NI	2 3081	
126	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione	Area of damaged agricultural land supported (Ha) Volume totale di investimenti (000 euro)	NP NP	NP NP	NP NP	
131	Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	Numero di beneficiari	NP	NP	NP	
132	Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare	Numero di aziende agricole beneficiarie	NP	NP	NP	
133	Attività di informazione e promozione	Numero di azioni sovvenzionate	NP	NP	NP	
141	Agricoltura di semisussistenza	Numero di aziende agricole di semisussistenza beneficiarie	NP	NP	NP	
142	Associazioni di produttori	Associazioni di produttori beneficiarie Fatturato delle associazioni di produttori beneficiarie (000 euro)	NP NP	NP NP	NP NP	

ASSE 2

Codice misura	Misura	Indicatori di prodotto	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2009 all'anno 2013	Obiettivi 2007-2013	Tasso di esecuzione del PSR
211 212	Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali (articolo 36, lettera a), punto ii), del Regolamento (UE) 2000/60/CE (WFD - Direttiva quadro acque)	Numero di aziende beneficiarie SAU beneficiarie (ha)	NP NP	NP NP	NP NP	
213	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE (WFD - Direttiva quadro acque)	Numero di aziende beneficiarie SAU beneficiarie (ha)	NP NP	NP 2622	NP 2000	
214	Pagamenti agroambientali	Numero di aziende beneficiarie Superficie complessivamente interessata dall'aiuto (ha) Superficie fisica interessata dal sostegno (ha)	2173 12226,75 12226,75	2622 16212,441 16212,441	2000 20000 20000	131% 81% 81%
215	Pagamenti per il benessere degli animali	Numero di contratti Numero di aziende agricole beneficiarie	NP NP	NP 2622	NP 2000	
216	Investimenti non produttivi	Numero di contratti Numero di aziende beneficiarie Volume totale di investimenti (000 euro)	NP NP NP	NP NP NP	NP NP NP	
221	Imboschimento di terreni agricoli	Numero di ettari imboschiti Numero di beneficiari	NP NP	NP NP	NP NP	
222	Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli	Numero di ettari imboschiti SAU beneficiarie (ha)	NP NP	NP NP	NP NP	
223	Imboschimento di superfici non agricole	Numero di beneficiari Numero di ettari imboschiti	NP NP	NP NP	NP NP	
224	Indennità Natura 1998	Numero di aziende beneficiarie Superficie forestale sovvenzionata (ha) Numero di aziende beneficiarie	NP NP NP	NP NP NP	NP NP NP	
225	Pagamenti silvoambientali	Superficie forestale complessivamente interessata dall'aiuto (ha) Superficie fisica forestale interessata dal sostegno (ha) Numero di contratti	NP NP NP	NP NP NP	NP NP NP	
226	Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi	Numero di azioni sovvenzionate	NP	NP	NP	
227	Investimenti non produttivi	Numero di aziende beneficiarie Volume totale di investimenti (000 euro)	NP NP	NP NP	NP NP	

ASSE 3

Codice misura	Misura	Indicatori di prodotto	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2009 all'anno 2013	Obiettivi 2007-2013	Tasso di esecuzione del PSR
311	Diversificazione verso attività non agricole	Numero di beneficiari Volume totale di investimenti (000 euro)	NP NP	NP NP	NP NP	
312	Creazione e sviluppo di imprese	Numero di microimprese beneficiarie	NP	NP	NP	
313	Incentivazione di attività turistiche	Numero di nuove attività turistiche sovvenzionate Volume totale di investimenti (000 euro)	NP NP	NP NP	NP NP	
321	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale	Numero di azioni sovvenzionate Volume totale di investimenti (000 euro)	NP NP	NP NP	NP NP	
322	Sviluppo e rinnovamento dei villaggi	Numero di villaggi interessati Volume totale di investimenti (000 euro)	NP NP	NP NP	NP NP	
323	Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	Numero di azioni sovvenzionate Volume totale di investimenti (000 euro)	NP NP	NP NP	NP NP	
331	Formazione e informazione rivolte agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano	Numero di operatori economici beneficiari Numero di giorni di formazione impartita	NP NP	NP NP	NP NP	
341	Acquisizione di competenze, animazione e attuazione	Numero di azioni sovvenzionate	NP	NP	NP	

ASSE 4

Codice misura	Misura	Indicatori di prodotto	Realizzata nell'anno 2013	Totale realizzato - Valore cumulativo dal 2009 all'anno 2013	Obiettivi 2007-2013	Tasso di esecuzione del PSR
411	Attuazione di strategie di sviluppo locale	Numero di GAL	NP	NP	NP	
412		Superficie totale coperta dai GAL (km²)	NP	NP	NP	
413		Popolazione totale coperta dai GAL	NP	NP	NP	
413		Numero di beneficiari	NP	NP	NP	
421	Attuazione di progetti di cooperazione	Numero di progetti di cooperazione finanziati Numero di GAL cooperanti	NP NP	NP NP	NP NP	
431	Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e animazione sul territorio (articolo 59)	Numero di azioni sovvenzionate	NP	NP	NP	

PSR

Esecuzione finanziaria del programma

ASSE 1

Codice misura	Misura	Spesa pubblica (FEASR) - Anno 2013 (000 di euro)	Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi dal 2007 all'anno 2013 (000 di euro)		Spesa pubblica programmata 2007 - 2013 (000 di euro)		Esecuzione finanziaria del PSR
			FEASR	TOTALE	Di cui FEASR	TOTALE	
111	Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione	NP	NP	NP	NP	NP	
112	Insediamiento di giovani agricoltori	NP	NP	NP	NP	NP	
113	Prepensionamento	NP	NP	NP	NP	NP	
114	Utilizzo di servizi di consulenza	NP	NP	NP	NP	NP	
115	Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione	NP	NP	NP	NP	NP	
121	Ammodernamento delle aziende agricole	170,64	2140,85545	3568,09241	2500	4167	85,6%
122	Accrescimento del valore economico delle foreste	NP	NP	NP	NP	NP	
123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	NP	NP	NP	NP	NP	
124	Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale	NP	NP	NP	NP	NP	
125	Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	NI	NI	NI	700	1166,667	
126	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione	NP	NP	NP	NP	NP	
131	Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	NP	NP	NP	NP	NP	
132	Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare	NP	NP	NP	NP	NP	
133	Attività di informazione e promozione	NP	NP	NP	NP	NP	
141	Agricoltura di semisussistenza	NP	NP	NP	NP	NP	
142	Associazioni di produttori	NP	NP	NP	NP	NP	

ASSE 2

Codice misura	Misura	Spesa pubblica (FEASR) - Anno 2013 (000 di euro)	Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi dal 2007 all'anno 2013 (000 di euro)		Spesa pubblica programmata 2007 - 2013 (000 di euro)		Esecuzione finanziaria del PSR
			FEASR	TOTALE	Di cui FEASR	TOTALE	
211 212	Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali (articolo 36, lettera a), punto i) ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005)	NP	NP	NP	NP	NP	
213	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE (WFD - Direttiva quadro acque)	NP	NP	NP	NP	NP	
214	Pagamenti agroambientali	2110,10394	7661,20638	12768,67671	8314	13856,667	92,1%
215	Pagamenti per il benessere degli animali	NP	NP	NP	NP	NP	
216	Investimenti non produttivi	NP	NP	NP	NP	NP	
221	Imboschimento di terreni agricoli	NP	NP	NP	NP	NP	
222	Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli	NP	NP	NP	NP	NP	
223	Imboschimento di superfici non agricole	NP	NP	NP	NP	NP	
224	Indennità Natura 1999	NP	NP	NP	NP	NP	
225	Pagamenti silvoambientali	NP	NP	NP	NP	NP	
226	Ricostruzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi	NP	NP	NP	NP	NP	
227	Investimenti non produttivi	NP	NP	NP	NP	NP	

ASSE 3

Codice misura	Misura	Spesa pubblica (FEASR) - Anno 2013 (000 di euro)	Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi dal 2007 all'anno 2013 (000 di euro)		Spesa pubblica programmata 2007 - 2013 (000 di euro)		Esecuzione finanziaria del PSR
			FEASR	TOTALE	Di cui FEASR	TOTALE	
311	Diversificazione verso attività non agricole	NP	NP	NP	NP	NP	
312	Creazione e sviluppo di imprese	NP	NP	NP	NP	NP	
313	Incentivazione di attività turistiche	NP	NP	NP	NP	NP	
321	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale	NP	NP	NP	NP	NP	
322	Sviluppo e rinnovamento dei villaggi	NP	NP	NP	NP	NP	
323	Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	NP	NP	NP	NP	NP	
331	Formazione e informazione rivolte agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano nell'asse 5	NP	NP	NP	NP	NP	
341	Acquisizione di competenze, animazione e attuazione	NP	NP	NP	NP	NP	

ASSE 4

Codice misura	Misura	Spesa pubblica (FEASR) - Anno 2013 (000 di euro)	Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi dal 2007 all'anno 2013 (000 di euro)		Spesa pubblica programmata 2007 - 2013 (000 di euro)		Esecuzione finanziaria del PSR
			FEASR	TOTALE	Di cui FEASR	TOTALE	
411	Attuazione di strategie di sviluppo locale	NP	NP	NP	NP	NP	
412							
413							
421	Attuazione di progetti di cooperazione	NP	NP	NP	NP	NP	
431	Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di competenze e animazione sul territorio (articolo 59)	NP	NP	NP	NP	NP	

Priorite	Tipi di operazioni	Numero di partecipanti alla formazione				Numero unico di partecipanti	Numero di giorni di formazione impartita	Spesa pubblica (000 di euro)	
		Agricoltura	Industria dei prodotti alimentari	Silvicoltura	TOTALE			FEASR	TOTALE
adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti	Formazione e utilizzazione di servizi di consulenza agricola in relazione ai cambiamenti climatici	NP	NP	NP			NP	NP	NP
	Altre	NP	NP	NP				NP	NP
energie rinnovabili	Informazioni e divulgazione di conoscenze connesse alle energie rinnovabili	NP	NP	NP			NP	NP	NP
	Altre	NP	NP	NP			NP	NP	NP
Gestione delle risorse idriche	Informazioni e divulgazione di conoscenze connesse alla gestione delle risorse idriche	NP	NP	NP			NP	NP	NP
	Altre	NP	NP	NP			NP	NP	NP
biodiversità	Informazioni e divulgazione di conoscenze connesse alla biodiversità	NP	NP	NP			NP	NP	NP
	Altre	NP	NP	NP			NP	NP	NP
misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario		NP	NP	NP			NP	NP	NP
approcci innovativi		NP	NP	NP			NP	NP	NP
infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali		NP	NP	NP			NP	NP	NP
TOTALE						NP			

<i>Priorite</i>	<i>Tipi di operazioni</i>	Numero di domande approvate	Numero di agricoltori beneficiari	Numero di aziende beneficiarie	Spesa pubblica (000 di euro)	
					FEASR	TOTALE
adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti	Formazione e utilizzazione di servizi di consulenza agricola in relazione ai cambiamenti climatici	NP			NP	NP
	Altre	NP			NP	NP
energie rinnovabili		NP			NP	NP
Gestione delle risorse idriche		NP			NP	NP
biodiversità		NP			NP	NP
misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario		NP			NP	NP
approcci innovativi		NP			NP	NP
infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali		NP			NP	NP
TOTALE			NP	NP		

H.115

Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione

<i>Priorite</i>	Numero di nuovi servizi avviati	Spesa pubblica (000 di euro)	
		FEASR	TOTALE
adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei	NP	NP	NP
energie rinnovabili	NP	NP	NP
Gestione delle risorse idriche	NP	NP	NP
biodiversità	NP	NP	NP
misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario	NP	NP	NP
approcci innovativi	NP	NP	NP
infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali	NP	NP	NP
TOTALE			

Priorite	Tipi di operazioni	Numero di domande approvate			Numero di aziende agricole beneficiarie	Spesa pubblica (000 di euro)		Volume totale di investimenti (000 euro)
		Produzione biologica	Produzione convenzionale	TOTALE		FEASR	TOTALE	
adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti	Uso più razionale di concimi azotati (p.es., uso ridotto, attrezzatura, agricoltura di precisione), migliore stoccaggio del letame	NP	NP		NP	NP	NP	NP
	Miglioramento dell'efficienza energetica (p.es., utilizzo di materiali da costruzione che riducono la perdita di calore)	NP	NP		NP	NP		NP
	Meccanismi di prevenzione contro gli effetti negativi di eventi estremi connessi al clima (p.es., installazione di reti antigrandine)	NP	NP		NP	NP	NP	NP
	Altre	NP	NP		NP	NP	NP	NP
energie rinnovabili	Produzione di biogas da rifiuti organici (produzione aziendale e locale)	NP	NP		NP	NP	NP	NP
	Culture energetiche perenni (bosco ceduo a rotazione rapida e piante erbacee)	NP	NP		NP	NP	NP	NP
	Produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole/forestali	NP	NP		NP	NP	NP	NP
	Altre	NP	NP		NP	NP	NP	NP
Gestione delle risorse idriche	Tecnologie per il risparmio idrico (p.es., sistemi di irrigazione efficienti)	NP	NP		NP	NP	NP	NP
	Protezione delle risorse idriche (compresse superficiali con sistemi di pompaggio)	NP	NP		NP	NP	NP	NP
	Impianti per il trattamento delle acque di scarico nelle aziende agricole e nei settori della trasformazione e della commercializzazione	NP	NP		NP	NP	NP	NP
	Tecniche di produzione a basso consumo d'acqua (p.es.,)	NP	NP		NP	NP	NP	NP
	Altre	NP	NP		NP	NP	NP	NP
Misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario	Sostegno agli investimenti connesso alla produzione lattiero-casearia	0	23	23	23	2140,85545	3568,09241	6.061,04
	Altre	NP	NP		NP	NP	NP	NP
biodiversità		NP	NP		NP	NP	NP	NP
approcci innovativi		NP	NP		NP	NP	NP	NP
infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali		NP	NP		NP	NP	NP	NP
TOTALE		0	23	23	23	2140,85545	3568,09241	6061,03625

H.122

Accrescimento del valore economico delle foreste

Priorite	Numero di domande approvate	Numero di aziende beneficiarie	Spesa pubblica (000 di euro)		Volume totale di investimenti (000 euro)
			FEASR	TOTALE	
adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei	NP	NP	NP	NP	NP
energie rinnovabili	NP	NP	NP	NP	NP
Gestione delle risorse idriche	NP	NP	NP	NP	NP
biodiversità	NP	NP	NP	NP	NP
misure di accompagnamento della	NP	NP	NP	NP	NP
approcci innovativi	NP	NP	NP	NP	NP
infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali	NP	NP	NP	NP	NP
TOTALE					

Priorite	Tipi di operazioni	Numero di domande approvate			Numero di imprese beneficiarie	Spesa pubblica (000 di euro)		Volume totale di investimenti (000 euro)
		Produzione biologica	Produzione convenzionale	TOTALE		FEASR	TOTALE	
adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti	Miglioramento dell'efficienza energetica (p.es., utilizzo di materiali da costruzione che riducono la perdita di calore)	NP	NP		NP	NP	NP	NP
	Altre	NP	NP		NP	NP		NP
energie rinnovabili	Produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole/forestali	NP	NP		NP	NP	NP	NP
	Altre	NP	NP		NP	NP	NP	NP
Gestione delle risorse idriche	Tecnologie per il risparmio idrico (p.es., sistemi di irrigazione efficienti)	NP	NP		NP	NP	NP	NP
	Riserve idriche (ivi comprese superfici con sfioratori di piena)	NP	NP		NP	NP	NP	NP
	Impianti per il trattamento delle acque di scarico nelle aziende agricole e nei settori della trasformazione e della commercializzazione	NP	NP		NP	NP	NP	NP
	tecniche di produzione a basso consumo d'acqua (p.es., adeguamento delle pratiche colturali)	NP	NP		NP	NP	NP	NP
	Altre	NP	NP		NP	NP	NP	NP
misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario	Miglioramenti della trasformazione e commercializzazione connesse ai prodotti lattiero-caseari	NP	NP		NP	NP	NP	NP
	Altre	NP	NP		NP	NP	NP	NP
biodiversità		NP	NP		NP	NP	NP	NP
approcci innovativi		NP	NP		NP	NP	NP	NP
infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali		NP	NP		NP	NP	NP	NP
TOTALE								

Priorite	Tipi di operazioni	Numero di iniziative di cooperazione sovvenzionate					Spesa pubblica (000 di euro)	
		Agricoltura	Alimenti	Silvicoltura	Aziende miste	TOTALE	FEASR	TOTALE
adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti	Miglioramento dell'efficienza energetica (p.es., utilizzo di materiali da costruzione che riducono la perdita di calore)	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	Altre	NP	NP	NP	NP			NP
energie rinnovabili	Produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole/forestali	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	Altre	NP	NP	NP	NP		NP	NP
misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario	Innovazione connessa al settore lattiero-caseario	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	Altre	NP	NP	NP	NP		NP	NP
approcci innovativi	Operazioni innovative in relazione alle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	Operazioni innovative volte a sostenere sviluppo delle energie rinnovabili	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	Operazioni innovative per migliorare la gestione delle risorse idriche	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	Operazioni innovative volte a sostenere la conservazione della biodiversità	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	Altre	NP	NP	NP	NP		NP	NP
biodiversità		NP	NP	NP	NP		NP	NP
Gestione delle risorse idriche		NP	NP	NP	NP		NP	NP
infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali		NP	NP	NP	NP		NP	NP
TOTALE								

[illegible]

Priorite	Tipi di operazioni	Numero di aziende beneficiarie	SAU beneficiarie (ha)	Spesa pubblica (000 di euro)	
				FEASR	TOTALE
Gestione delle risorse idriche	Recupero di zone umide	NP	NP	NP	NP
	Conversione dei terreni agricoli in paludi	NP	NP	NP	NP
	Altre	NP	NP	NP	NP
biodiversità	Bordi dei campi e fasce riparie perenni e letti biologici	NP	NP	NP	NP
	Creazione/gestione di biotopi/habitat all'interno e al di fuori dei siti Natura 2000	NP	NP	NP	NP
	Modificazione dell'uso del suolo (prato esten-sivo, conversione da seminativo in pascolo permanente, messa a riposo di lungo periodo)	NP	NP	NP	NP
	Conduzione di colture perenni di alto pregio naturale	NP	NP	NP	NP
	Impianto e preservazione di frutteti prato	NP	NP	NP	NP
	Altre	NP	NP	NP	NP
	adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti	NP	NP	NP	NP
	energie rinnovabili	NP	NP	NP	NP
	misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario	NP	NP	NP	NP
	approcci innovativi	NP	NP	NP	NP
	infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali	NP	NP	NP	NP
TOTALE					

Priorite	Tipi di operazioni	Numero di domande approvate	Numero di aziende beneficiarie		Superficie complessivamente interessata dall'aiuto (ha)			Superficie fisica interessata dal sostegno (ha)	Numero di contratti			Spesa pubblica (000 di euro)			
			Aziende agricole	Altri gestori del territorio	Aziende agricole	Altri gestori del territorio	TOTALE		Aziende agricole	Altri gestori del territorio	TOTALE	FEASR		TOTALE	
												Esistente	New*	Esistente	New*
adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti	Uso più razionale di concimi azotati (p.es., uso ridotto, attrezzatura, agricoltura di precisione), migliore stoccaggio del letame				NP	NP			NP	NP		NP	NP	NP	NP
	Pratiche di gestione del suolo (p.es., metodi di dissodamento, colture intercalari, rotazione diversificata delle colture)				NP	NP			NP	NP		NP	NP	NP	NP
	Estensivizzazione dell'allevamento (p.es., riduzione della densità di carico) e gestione delle formazioni erbose				16180,863	31,578	16212,441		2618	4	2622	7661,206034	0	12768,67671	0
	Modificazione dell'uso del suolo (p.es., conversione da seminativo in pascolo, messa a riposo permanente)				NP	NP			NP	NP		NP	NP	NP	NP
	Altre				NP	NP			NP	NP		NP	NP	NP	NP
Gestione delle risorse idriche	Recupero di zone umide				NP	NP			NP	NP		NP	NP	NP	NP
	Conversione dei terreni agricoli in paludi				NP	NP			NP	NP		NP	NP	NP	NP
	Sviluppo di corpi d'acqua seminaturali				NP	NP			NP	NP		NP	NP	NP	NP
	Creazione di argini naturali				NP	NP			NP	NP		NP	NP	NP	NP
	Pratiche di gestione del suolo (p.es., colture intercalari, agricoltura biologica, conversione da seminativo in pascolo permanente)				NP	NP			NP	NP		NP	NP	NP	NP
	Riserve idriche (ivi comprese superfici con sfioratori di piena)				NP	NP			NP	NP		NP	NP	NP	NP
	Tecniche di produzione a basso consumo d'acqua (p.es., adeguamento delle pratiche colturali)				NP	NP			NP	NP		NP	NP	NP	NP
	Altre				NP	NP			NP	NP		NP	NP	NP	NP
biodiversità	Forme estensive di gestione dell'allevamento				NP	NP			NP	NP		NP	NP	NP	NP
	Produzione integrata e biologica				NP	NP			NP	NP		NP	NP	NP	NP
	Creazione/gestione di biotopi/habitat all'interno e al di fuori dei siti Natura 2001				NP	NP			NP	NP		NP	NP	NP	NP
	Bordi dei campi e fasce riparie perenni e letti biologici				NP	NP			NP	NP		NP	NP	NP	NP
	Modificazione dell'uso del suolo (prato estensivo, conversione da seminativo in pascolo permanente, messa a riposo di lungo periodo)				NP	NP			NP	NP		NP	NP	NP	NP
	Condizione di colture perenni di alto pregio naturale				NP	NP			NP	NP		NP	NP	NP	NP
	Salvaguardia della diversità genetica				NP	NP			NP	NP		NP	NP	NP	NP
	Condizione di terreni agricoli di alto pregio naturale senza apporto di fertilizzanti e pesticidi				NP	NP			NP	NP		NP	NP	NP	NP
misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario	Premi per le superfici prative e la produzione estensiva di bestiame, produzione biologica connessa alla produzione lattiero-casearia, premi per i pascoli permanenti nelle zone svan-tagliate, premi al pascolo				NP	NP			NP	NP		NP	NP	NP	NP
	Altre				NP	NP			NP	NP		NP	NP	NP	NP
energie rinnovabili					NP	NP			NP	NP		NP	NP	NP	NP
approcci innovativi					NP	NP			NP	NP		NP	NP	NP	NP
infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali					NP	NP			NP	NP		NP	NP	NP	NP
TOTALE		2622	2618	4	16180,863	31,578	16212,441	16212,441	2618	4	2622	7661,206034	0	12768,67671	0

* Spesa per i nuovi contratti conclusi nell'anno N, this data should also be included in the 'existing' column

H.215

Pagamenti per il benessere degli animali

Priorite	Numero di domande approvate	Numero di aziende agricole beneficiarie	Numero di contratti	Spesa pubblica (000 di euro)			
				FEASR		TOTALE	
				Esistente	New*	Esistente	New*
adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti	NP	NP	NP	NP	NP	NP	
energie rinnovabili	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
Gestione delle risorse idriche	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
biodiversità	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
approcci innovativi	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
TOTALE							

* Spesa per i nuovi contratti conclusi nell'anno N, this data should also be included in the 'existing' column

Priorite	Tipi di operazioni	Numero di domande approvate	Numero di aziende beneficiarie	Spesa pubblica (000 di euro)		Volume totale di investimenti (000 euro)
				FEASR	TOTALE	
adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti	Modificazione dell'uso del suolo (p.es., conversione da seminativo in pascolo, messa a riposo permanente)	NP		NP	NP	NP
	Altre	NP		NP	NP	NP
Gestione delle risorse idriche	Recupero di zone umide	NP		NP	NP	NP
	Conversione dei terreni agricoli in paludi	NP		NP	NP	NP
	Altre	NP		NP	NP	NP
biodiversità	Creazione/gestione di biotopi/habitat all'interno e al di fuori dei siti Natura 2002	NP		NP	NP	NP
	Bordi dei campi e fasce riparie perenni e letti biologici	NP		NP	NP	NP
	Modificazione dell'uso del suolo (prato estensivo, conversione da seminativo in pascolo permanente, messa a riposo di lungo periodo)	NP		NP	NP	NP
	Condizione di colture perenni di alto pregio naturale	NP		NP	NP	NP
	Impianto e preservazione di frutteti prato	NP		NP	NP	NP
	Altre	NP		NP	NP	NP
	energie rinnovabili	NP		NP	NP	NP
misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario		NP		NP	NP	NP
approcci innovativi		NP		NP	NP	NP
infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali		NP		NP	NP	NP
TOTALE			NP			

Priorite	Tipi di operazioni	Numero di domande approvate	Numero di beneficiari	SAU beneficiarie (ha)				Spesa pubblica (000 di euro)	
				Conifere	Latifoglie	Altre	TOTALE	FEASR	TOTALE
adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti	Imboschimento, impianto di sistemi agrofore-stali	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
	Altre	NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
Gestione delle risorse idriche		NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
energie rinnovabili		NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
biodiversità		NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario		NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
approcci innovativi		NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali		NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
TOTALE									

Priorite	Tipi di operazioni	Numero di aziende beneficiarie	Superficie forestale sovvenzionata (ha)	Spesa pubblica (000 di euro)	
				FEASR	TOTALE
biodiversità	Modificazione dell'uso del suolo (prato esten-sivo, conversione da seminativo in pascolo permanente, messa a riposo di lungo periodo)	NP	NP	NP	NP
	Creazione/gestione di biotopi/habitat all'interno e al di fuori dei siti Natura 2003	NP	NP	NP	NP
	Altre	NP	NP	NP	NP
Gestione delle risorse idriche		NP	NP	NP	NP
energie rinnovabili		NP	NP	NP	NP
adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti		NP	NP	NP	NP
misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario		NP	NP	NP	NP
approcci innovativi		NP	NP	NP	NP
infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali		NP	NP	NP	NP
TOTALE					

Priorite	Tipi di operazioni	Numero di domande approvate	Numero di aziende beneficiarie	Superficie forestale complessivamente interessata dall'aiuto	Superficie fisica forestale interessata dal sostegno (ha)	Numero di contratti	Spesa pubblica (000 di euro)			
							FEASR		TOTALE	
							Esistente	New*	Esistente	New*
adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti	Conversione a tipi di foreste più resistenti	NP	NP	NP		NP		NP	NP	NP
	Altre	NP	NP	NP		NP	NP	NP	NP	NP
biodiversità	Modificazione dell'uso del suolo (prato esten-sivo, conversione da seminativo in pascolo permanente, messa a riposo di lungo periodo)	NP	NP	NP		NP	NP	NP	NP	NP
	Creazione/gestione di biotopi/habitat all'interno e al di fuori dei siti Natura 2004	NP	NP	NP		NP	NP	NP	NP	NP
	Altre	NP	NP	NP		NP	NP	NP	NP	NP
energie rinnovabili		NP	NP	NP		NP	NP	NP	NP	NP
Gestione delle risorse idriche		NP	NP	NP		NP	NP	NP	NP	NP
misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario		NP	NP	NP		NP	NP	NP	NP	NP
approcci innovativi		NP	NP	NP		NP	NP	NP	NP	NP
infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali		NP	NP	NP		NP	NP	NP	NP	NP
TOTALE					NP					

* Spesa per i nuovi contratti conclusi nell'anno N, this data should also be included in the 'existing' column

H.226

Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi

[illegible]

H.227

Investimenti non produttivi

Priorite	Tipi di operazioni	Numero di domande approvate	Numero di aziende beneficiarie	Spesa pubblica (000 di euro)		Volume totale di investimenti (000 euro)
				FEASR	TOTALE	
adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei	Conversione a tipi di foreste più resistenti	NP	NP	NP	NP	NP
	Altre	NP	NP	NP	NP	NP
Gestione delle risorse idriche		NP	NP	NP	NP	NP
energie rinnovabili		NP	NP	NP	NP	NP
biodiversità		NP	NP	NP	NP	NP
misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario		NP	NP	NP	NP	NP
approcci innovativi		NP	NP	NP	NP	NP
infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali		NP	NP	NP	NP	NP
TOTALE						

[illegible]

H.313

Incentivazione di attività turistiche

Priorite	Numero di nuove attività turistiche sovvenzionate	Spesa pubblica (000 di euro)		Volume totale di investimenti (000 euro)
		FEASR	TOTALE	
adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti	NP	NP	NP	NP
energie rinnovabili	NP	NP	NP	NP
Gestione delle risorse idriche	NP	NP	NP	NP
biodiversità	NP	NP	NP	NP
misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario	NP	NP	NP	NP
approcci innovativi	NP	NP	NP	NP
infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali	NP	NP	NP	NP
TOTALE				

Priorite	Tipi di operazioni	Numero di azioni sovvenzionate	Spesa pubblica (000 di euro)		Volume totale di investimenti (000 euro)
			FEASR	TOTALE	
energie rinnovabili	Impianti/infrastrutture per l'energia rinnovabile da biomassa ed altre fonti di energia rinnovabile (energia solare ed eolica, energia geotermica)	NP	NP	NP	NP
	Altre	NP	NP	NP	NP
infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali	Creazione di nuove infrastrutture a banda larga, con concessione dell'accesso, comprese le infrastrutture di backhaul e gli impianti al suolo (ad esempio sistemi fissi, terrestri senza fili, satellitari o una combinazione di tali sistemi)	NP	NP	NP	NP
	Potenziamento delle infrastrutture a banda larga esistenti	NP	NP	NP	NP
	Installazione di infrastrutture passive per la banda larga (ad esempio opere di ingegneria civile quali condotti e altri elementi della rete come la fibra spenta, ecc.), anche in sinergia con altre infrastrutture (energia, trasporti, impianti idrici, reti fognarie ecc.).	NP	NP	NP	NP
	Altre	NP	NP	NP	NP
adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti		NP	NP	NP	NP
Gestione delle risorse idriche		NP	NP	NP	NP
biodiversità		NP	NP	NP	NP
misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario		NP	NP	NP	NP
approcci innovativi		NP	NP	NP	NP
TOTALE					

H.322

Sviluppo e rinnovamento dei villaggi

Priorite	Numero di domande approvate	Numero di villaggi interessati	Spesa pubblica (000 di euro)		Volume totale di investimenti (000 euro)
			FEASR	TOTALE	
adattamento ai cambiamenti climatici e	NP		NP	NP	NP
energie rinnovabili	NP		NP	NP	NP
Gestione delle risorse idriche	NP		NP	NP	NP
biodiversità	NP		NP	NP	NP
misure di accompagnamento della	NP		NP	NP	NP
approcci innovativi	NP		NP	NP	NP
infrastrutture per internet a banda larga nelle zone	NP		NP	NP	NP
TOTALE		NP			

Priorite	Tipi di operazioni	Numero di azioni sovvenzionate	Spesa pubblica (000 di euro)		Volume totale di investimenti (000 euro)
			FEASR	TOTALE	
Gestione delle risorse idriche	Sviluppo di corpi d'acqua seminaturali	NP	NP	NP	NP
	Creazione di argini naturali	NP	NP	NP	NP
	Fiumi a meandri	NP	NP	NP	NP
	Altre	NP	NP	NP	NP
biodiversità	Conduzione di colture perenni di alto pregio naturale	NP	NP	NP	NP
	Impianto e preservazione di frutteti prato	NP	NP	NP	NP
	Modificazione dell'uso del suolo (prato esten-sivo, conversione da seminativo in pascolo permanente, messa a riposo di lungo periodo)	NP	NP	NP	NP
	Bordi dei campi e fasce riparie perenni e letti biologici	NP	NP	NP	NP
	Creazione/gestione di biotopi/habitat all'interno e al di fuori dei siti Natura 2005	NP	NP	NP	NP
	Elaborazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000	NP	NP	NP	NP
	Altre	NP	NP	NP	NP
adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti		NP	NP	NP	NP
energie rinnovabili		NP	NP	NP	NP
misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario		NP	NP	NP	NP
approcci innovativi		NP	NP	NP	NP
infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali		NP	NP	NP	NP
TOTALE					

H.331

Formazione e informazione rivolte agli operatori economici impegnati nei settori che

Priorite	Tipi di operazioni	Numero di operatori economici beneficiari	Numero di operatori beneficiari numero unico	Numero di giorni di formazione impartita	Spesa pubblica (000 di euro)	
					FEASR	TOTALE
adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti	Formazione e utilizzazione di servizi di consulenza agricola in relazione ai	NP		NP	NP	NP
	Altre	NP		NP	NP	NP
energie rinnovabili	Informazioni e divulgazione di conoscenze connesse alle energie rinnovabili	NP		NP	NP	NP
	Altre	NP		NP	NP	NP
Gestione delle risorse idriche	Informazioni e divulgazione di conoscenze connesse alla gestione delle	NP		NP	NP	NP
	Altre	NP		NP	NP	NP
biodiversità	Informazioni e divulgazione di conoscenze connesse alla biodiversità	NP		NP	NP	NP
	Altre	NP		NP	NP	NP
misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario		NP		NP	NP	NP
approcci innovativi		NP		NP	NP	NP
infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali		NP		NP	NP	NP
TOTALE			NP			

H.Others

Output CMEF indicators for Other measures

[illegible]

[illegible]

Commenti

R.1(1)

Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione in ambito agricolo e/o forestale

<i>Tipologia di risultati positivi</i>	Numero di partecipanti			
	Agricoltura	Industria alimentare	Silvicoltura	TOTALE
Ottenimento di certificato, diploma, laurea	120	0	165	285
Attuazione delle abilità acquisite	1541	0	621	2162
TOTALE	1661	0	786	2447

R.1(2)

Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione in ambito agricolo e/o forestale

<i>Tipologia di risultati positivi</i>	Numero di partecipanti				
	Maschi		Femmine		TOTALE
	< 40	≥ 40	< 40	≥ 40	
Ottenimento di certificato, diploma, laurea	69	117	46	53	285
Attuazione delle abilità acquisite	830	867	85	380	2162
TOTALE	899	984	131	433	2447

R.2

<i>Misura correlata</i>	VAL nelle aziende beneficiarie (000 EUR)			
	Settore agricolo	Industria dei prodotti alimentari	Silvicoltura	TOTALE
Insediamiento di giovani agricoltori	1851,36	0	0	1851,36
Prepensionamento	NP	NP	NP	
Utilizzo di servizi di consulenza	NP	NP	NP	
Introduzione di servizi di sostituzione, di assistenza e di consulenza nella gestione delle aziende agricole	26,5	NI	NI	26,5
Ammodernamento delle aziende	1230,45	NI	NI	1230,45
Migliore valorizzazione economica delle foreste	0	0	624,3125	624,3125
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	0	5095,940521	223,3571429	5319,297664
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale	99,57571872	NI	29,81025464	129,3859734
Miglioramento e sviluppo dell'infrastruttura in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	473,413065	NP	211,860772	685,273837
Sostegno agli agricoltori per conformarsi ai rigorosi requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	NP	NP	NP	
TOTALE	3681,298784	5095,940521	1089,34067	9866,579974

R.3

Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche

Misura correlata	Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche						
	Aziende agricole		Imprese agroalimentari		Aziende forestali		TOTALE
	Nuova tecnica	Nuovo prodotto	Nuova tecnica	Nuovo prodotto	Nuova tecnica	Nuovo prodotto	
Ammodernamento delle aziende	5	0	0	0	0	0	5
Migliore valorizzazione economica delle foreste	0	0	0	0	4	0	4
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	0	0	15	0	0	0	15
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie	0	1	NI	NI	1	1	3
TOTALE	5	1	15	0	5	1	27

Tipo di prodotto agricolo	Valore della produzione agricola soggetta a marchi/norme di qualità riconosciuti (000 euro)							
	Marchio/norma europea				Marchio/norma di uno Stato membro			
	Rispetto delle norme	Partecipazione di agricoltori ai sistemi qualità	Associazioni di produttori - attività di informazione e di promozione	TOTALE	Rispetto delle norme	Partecipazione di agricoltori ai sistemi qualità	Associazioni di produttori - attività di informazione e di promozione	TOTALE
Carni fresche (e frattaglie)	NP	NP	NP		NP	NP	NP	
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)	NP	NI	NI		NP	NP	NP	
Formaggi	NP	NI	10260	10260	NP	NP	NP	
Altri prodotti di origine animale (uova, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.)	NP	NP	NP		NP	NP	NP	
Materie grasse (burro, margarina, oli, ecc.)	NP	NP	NP		NP	NP	NP	
Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati	NP	NP	NP		NP	NP	NP	
Birra	NP	NP	NP		NP	NP	NP	
Bevande a base di estratti di piante	NP	NP	NP		NP	NP	NP	
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	NP	NP	NP		NP	NP	NP	
Altri prodotti alimentari	NP	NP	NP		NP	NP	NP	
TOTALE			10260	10260				

R.5

Numero di aziende agricole entrate sul mercato

<i>Misura correlata</i>	Numero di aziende agricole entrate sul mercato
Agricoltura di semisussistenza	NP
Costituzione di associazioni di produttori	NP
TOTALE	

Ambito	Misura correlata	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio (ha)				
		Biodiversità	Qualità dell'acqua	Cambiamento climatico	Qualità del suolo	Riduzione della marginalizzazione
Agricoltura	Indennità a favore delle zone montane e di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali	11437,95	0	115487,6889	228759	332545,3333
	Natura 2000	NP	NP	NP	NP	NP
	Indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE	NP	NP	NP	NP	NP
	Misure agroambientali	31594,9375	375233	193820,8125	410389,25	0
	Benessere degli animali	NP	NP	NP	NP	NP
	Investimenti non produttivi	NP	NP	NP	NP	NP
Silvicoltura	Imboschimento di terreni agricoli	NP	NP	NP	NP	NP
	Sistemi agroforestali	NP	NP	NP	NP	NP
	Imboschimento di superfici non agricole	NP	NP	NP	NP	NP
	Natura 2000	NP	NP	NP	NP	NP
	Misure silvoambientali	NP	NP	NP	NP	NP
	Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi	NP	NP	132,8740654	26,42593458	NP
	Investimenti non produttivi	100	NP	NP	NP	NP
TOTALE		43132,8875	375233	309441,3755	639174,6759	332545,3333

R.7

Valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie

<i>Misura correlata</i>	Valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie ('000 EUR)		
	Aziende agricole	Altre imprese	TOTALE
Diversificazione verso attività non agricole	2056,030151	0	2056,030151
Creazione e sviluppo di imprese	NP	NP	
Incentivazione di attività turistiche	0	469,3788212	469,3788212
TOTALE	2056,030151	469,3788212	2525,408972

R.8(1)

Numero lordo di posti di lavoro creati

Misura correlata	Numero lordo di posti di lavoro creati				
	Maschi		Femmine		TOTALE
	< 25	≥ 25	< 25	≥ 25	
Diversificazione verso attività non agricole	0,075376884	11,38190955	0,075376884	1,055276382	12,5879397
Creazione e sviluppo di imprese	NP	NP	NP	NP	
Incentivazione di attività turistiche	0	20	0	0	20
Asse 1	NP	NP	NP	NP	
Asse 2	NP	NP	NP	NP	
Asse 3	0	0	0	0	0
TOTALE	0,075376884	31,38190955	0,075376884	1,055276382	32,5879397

R.8(2)

Numero lordo di posti di lavoro creati

Tipo di attività aziendale	Tipo di settore	Numero lordo di posti di lavoro creati				
		Maschi		Femmine		TOTALE
		< 25	≥ 25	< 25	≥ 25	
Posti di lavoro in azienda	Agriturismo.	0,075376884	11,38190955	0,075376884	1,055276382	12,5879397
	Artigianato	NP	NP	NP	NP	
	Commercio al dettaglio	NP	NP	NP	NP	
	Produzione di energia rinnovabile	NP	NP	NP	NP	
	Altro	NP	NP	NP	NP	
Posti di lavoro fuori azienda	Turismo	0	20	0	0	20
	Artigianato	NP	NP	NP	NP	
	Commercio al dettaglio	NP	NP	NP	NP	
	Produzione di energia rinnovabile	NP	NP	NP	NP	
	Altro	NP	NP	NP	NP	
TOTALE		0,075376884	31,38190955	0,075376884	1,055276382	32,5879397

R.9

<i>Misura correlata</i>	Numero supplementare di presenze di turisti	
	+	Numero di visitatori giornalieri
Incentivazione di attività turistiche	1980	66
TOTALE	1980	66

R.10

Popolazione rurale utente di servizi migliorati

<i>Misura correlata</i>	Popolazione rurale utente di servizi migliorati
Servizi di base	2764,044944
Rinnovamento dei villaggi	1914,441943
Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	68,18181818
TOTALE	4746,668705

R.11

Maggiore diffusione di Internet nelle zone rurali

<i>Misura correlata</i>	Maggiore diffusione di Internet nelle zone rurali
Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale	NP
TOTALE	

R.12

Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione

<i>Misura correlata</i>	Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione				
	Maschi		Femmine		TOTALE
	< 25	≥ 25	< 25	≥ 25	
Formazione e informazione rivolte agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano nell'asse 3	NP	NP	NP	NP	
Acquisizione di competenze e animazione per elaborare e attuare strategie di sviluppo locale	0	7	0	4	11
TOTALE	0	7	0	4	11

R.A Indicatori di risultato supplementari

[illegible]

Commenti

Tab. O211:

I dati sono complessivi (parte cofinanziata + parte Top Up)

i risultati possono essere confrontabili con le previsioni di programma
esclusivamente sommando le due fonti di finanziamento

Misura 112:

Per questa misura nel 2011 sono stati usati fondi Top Up

I risultati tengono conto esclusivamente della parte cofinanziata

I risultati possono essere confrontabili con le previsioni di programma

9.1. Tabelle finanziarie della Commissione Europea – Financial Implementation report 2013:

I. Piano finanziario, liquidazioni e regola n+2:

I. Financial Overview 2007 - 2013								
Financial information at 31/12/2013								
Rural Development Programme CCI n° : 2007IT06RPO002								
Calendar Year	Financial Plan by year	Committed	Paid on account	Clearing of the amount paid on account	Total Payments (including paid on account)	Payment claims in treatment at 31/12	Recovered	Payments / Total FP (%)
2007	20,170,000.00	20,170,000.00	6,275,370.12	0.00	20,170,000.00	0.00	0.00	13.61%
2008	20,051,000.00	20,051,000.00	3,354,879.88	0.00	18,121,384.98	0.00	0.00	12.23%
2009	20,473,000.00	20,473,000.00	0.00	0.00	18,354,123.44	0.00	0.00	12.38%
2010	22,031,000.00	22,031,000.00	807,520.00	0.00	26,079,491.58	990,231.93	0.00	17.60%
2011	21,626,000.00	21,626,000.00	0.00	-807,520.00	20,634,402.07	0.00	16,285.58	13.92%
2012	22,132,000.00	22,132,000.00	0.00	0.00	17,518,193.76	46,327.74	0.00	11.82%
2013	21,722,000.00	21,722,000.00	0.00	0.00	13,981,291.41	0.00	0.00	9.43%
Total	148,205,000.00	148,205,000.00	10,437,770.00	-807,520.00	134,858,887.24		16,285.58	90.99%

Instalment Year	Committed	Decomitted	Paid on account	Clearing of the amount paid on account **	Total Payments (including paid on account)	RAL*	Q4 Request	Payments / commitment (%)
2007	20,170,000.00	0.00	6,275,370.12		20,170,000.00	0.00	1,292,154.76	100.00%
2008	20,051,000.00	0.00	3,354,879.88		20,051,000.00	0.00	0.00	100.00%
2009	20,473,000.00	0.00	0.00		20,473,000.00	0.00	12,072,299.96	100.00%
2010	22,031,000.00	0.00	807,520.00		22,031,000.00	0.00	9,961,152.45	100.00%
2011	21,626,000.00	0.00	0.00		21,626,000.00	0.00	8,359,719.64	100.00%
2012	22,132,000.00	0.00	0.00		22,132,000.00	0.00	6,461,023.91	100.00%
2013	21,722,000.00	0.00	0.00		8,375,887.24	13,346,112.76	6,481,748.46	38.56%
Total	148,205,000.00	0.00	10,437,770.00	-1,353,405.70	134,858,887.24	13,346,112.76	44,628,099.18	90.99%

*Supplementary commitments of instalment year "n" made in year "n+1" are included (incorporated) for the purpose of RAL in year "n+1".

**The clearance amount could not be divided by the instalment year for certain programmes.

II.1.: Piano finanziario per anno – quota FEASR:

II. 1. Financial plan by year in force at 31/12/2013								
Rural Development Programme CCI n° : 2007IT06RPO002								
Type of region	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Non-Convergence Regions	20,170,000	20,051,000	19,533,000	19,843,000	19,675,000	19,587,000	18,532,000	137,391,000
New Challenges – Non Convergence Region			940,000	2,188,000	1,951,000	2,545,000	3,190,000	10,814,000
Total EAFRD	20,170,000	20,051,000	20,473,000	22,031,000	21,626,000	22,132,000	21,722,000	148,205,000

II.2.: Piano finanziario complessivo per asse – spesa pubblica e quota FEASR:

II. 2. Financial plan by axis and type of region in force at 31/12/2013

Rural Development Programme CCI n° : 2007IT06RPO002

Financial plan by axis in Non-Convergence Regions

	Public Contribution		
	Public Expenditure	EAFRD Applicable Contribution Rate (%)	EAFRD Contribution
1. Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	74,902,320	44.00%	32,993,678
2. Improving the environment and the countryside	193,802,400	44.00%	85,273,007
3. The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy	27,748,329	44.00%	12,209,265
4. Leader	15,715,643	44.00%	6,915,050
Total	312,168,692		137,391,000

Financial plan by axis in New Challenges – Non Convergence Region

	Public Contribution		
	Public Expenditure	EAFRD Applicable Contribution Rate (%)	EAFRD Contribution
1. Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	4,166,667	60.00%	2,500,000
2. Improving the environment and the countryside	13,856,667	60.00%	8,314,000
Total	18,023,334		10,814,000

II.3.: Piano finanziario per misura – spesa pubblica, quota FEASR, quota privati e costi totali:

II. 3. Financial plan by rural development measures

Rural Development Programme CCI n° : 2007IT06RPO002

Axis/Measure	Public Expenditure	EAFRD Contribution	Private Expenditure	Total Cost
111. Vocational training and information actions	1,398,444	616,000	124,861	1,523,305
112. Setting up of young farmers	9,887,500	4,355,339	0	9,887,500
115. Setting up of management, relief and advisory services	400,065	176,224	100,016	500,081
121. Modernisation of agricultural holdings	14,729,918	7,153,000	15,688,417	30,418,335
122. Improvement of the economic value of forests	4,095,445	1,804,000	2,730,297	6,825,742
123. Adding value to agricultural and forestry products	35,104,606	15,463,207	52,656,910	87,761,516
124. Cooperation for development of new products	559,377	246,400	139,844	699,221
125. Infrastructure related to the development and adaptation ...	12,124,487	5,340,708	3,691,271	15,815,758
132. Participation of farmers in food quality schemes	19,978	8,800	4,994	24,972
133. Information and promotion activities	749,167	330,000	749,167	1,498,334
Total Axis 1 : Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	79,068,987	35,493,678	75,885,777	154,954,764
211. Natural handicap payments to farmers in mountain areas	62,351,211	27,434,517	0	62,351,211
214. Agri-environment payments	142,344,897	64,848,789	0	142,344,897
226. Restoring forestry potential and introducing prevention ...	2,591,974	1,140,468	0	2,591,974
227. Non-productive investments	370,985	163,233	92,746	463,731
Total Axis 2 : Improving the environment and the countryside	207,659,067	93,587,007	92,746	207,751,813
311. Diversification into non-agricultural activities	6,785,200	2,985,488	8,293,022	15,078,222
313. Encouragement of tourism activities	2,550,000	1,122,000	637,500	3,187,500
321. Basic services for the economy and rural population	17,137,220	7,540,377	4,284,305	21,421,525
323. Conservation and upgrading of the rural heritage	1,275,909	561,400	0	1,275,909
Total Axis 3 : The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy	27,748,329	12,209,265	13,214,827	40,963,156
411. Implementing local development strategies. Competitiveness	585,236	257,510	167,496	752,732
413. Implementing local development strategies. Quality of life	12,781,464	5,623,980	3,195,366	15,976,830
421. Implementing cooperation projects	348,991	153,560	0	348,991
431. Running the local action group, acquiring skills and ...	1,999,952	880,000	0	1,999,952
Total Axis 4 : Leader	15,715,643	6,915,050	3,362,862	19,078,505
Total	330,192,026	148,205,000	92,556,212	422,748,238

III.1.: Health Check - Spesa pubblica dichiarata nell'anno solare 2013 e relativa quota FEASR:

III. 1. Public Expenditure incurred in 2013. Annual summary of declarations Q1 2013 to Q4 2013						
Rural Development Programme CCI n° : 2007IT06RPO002						
Measure / Axis	New Challenges – Non Convergence Region					
	Public Expenditure (€)			EAFRD contribution (€)		
Measure / Axis	Amount declared	Recoveries / Corrections	Total	Amount	Recoveries / Corrections	Total
121 - Modernisation of agricultural holdings	284,400.00	0.00	284,400.00	170,640.00	0.00	170,640.00
Total Axis 1 : Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	284,400.00	0.00	284,400.00	170,640.00	0.00	170,640.00
214 - Agri-environment payments	3,558,856.50	-42,016.59	3,516,839.91	2,135,313.90	-25,209.95	2,110,103.95
Total Axis 2 : Improving the environment and the countryside	3,558,856.50	-42,016.59	3,516,839.91	2,135,313.90	-25,209.95	2,110,103.95
Total	3,843,256.50	-42,016.59	3,801,239.91	2,305,953.90	-25,209.95	2,280,743.95

III.1.: Risorse ordinarie - Spesa pubblica dichiarata nell'anno solare 2013 e relativa quota FEASR:

III. 1. Public Expenditure incurred in 2013. Annual summary of declarations Q1 2013 to Q4 2013						
Rural Development Programme CCI n° : 2007IT06RPO002						
Measure / Axis	Non-Convergence Regions					
	Public Expenditure (€)			EAFRD contribution (€)		
Measure / Axis	Amount declared	Recoveries / Corrections	Total	Amount	Recoveries / Corrections	Total
111 - Vocational training and information actions	222,630.98	0.00	222,630.98	98,068.95	0.00	98,068.95
112 - Setting up of young farmers	0.00	-14,448.04	-14,448.04	0.00	-6,357.15	-6,357.15
121 - Modernisation of agricultural holdings	440,742.86	-127,275.00	313,467.86	194,147.23	-56,001.00	138,146.23
122 - Improvement of the economic value of forests	36,540.46	0.00	36,540.46	16,096.07	0.00	16,096.07
123 - Adding value to agricultural and forestry products	3,805,969.20	-5,120.00	3,800,849.20	1,676,529.43	-2,252.80	1,674,276.63
124 - Cooperation for development of new products	544,177.64	0.00	544,177.64	239,710.25	0.00	239,710.25
125 - Infrastructure related to the development and adaptation of rural areas and communities	512,041.49	0.00	512,041.49	225,554.28	0.00	225,554.28
Total Axis 1 : Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	5,562,102.63	-146,843.04	5,415,259.59	2,450,106.21	-64,610.95	2,385,495.26
211 - Natural handicap payments to farmers in mountain areas	639.70	-10,900.93	-10,261.23	281.47	-4,796.41	-4,514.94
214 - Agri-environment payments	15,208,774.95	-195,779.91	15,012,995.04	6,691,860.98	-86,143.14	6,605,717.84
227 - Non-productive investments	34,181.40	0.00	34,181.40	15,039.82	0.00	15,039.82
Total Axis 2 : Improving the environment and the countryside	15,243,596.05	-206,680.84	15,036,915.21	6,707,182.26	-90,939.55	6,616,242.71
311 - Diversification into non-agricultural activities	717,785.00	-32,000.00	685,785.00	315,825.40	-14,080.00	301,745.40
313 - Encouragement of tourism activities	568,809.48	0.00	568,809.48	250,276.17	0.00	250,276.17
321 - Basic services for the economy and rural population	1,727,712.93	0.00	1,727,712.93	760,193.69	0.00	760,193.69
323 - Conservation and upgrading of the rural heritage	250,403.07	0.00	250,403.07	110,177.35	0.00	110,177.35
Total Axis 3 : The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy	3,264,710.48	-32,000.00	3,232,710.48	1,436,472.61	-14,080.00	1,422,392.61
411 - Implementing local development strategies. Community-led local groups	167,128.84	0.00	167,128.84	73,536.69	0.00	73,536.69
413 - Implementing local development strategies. Quality of life	2,344,352.69	-7,320.00	2,337,032.69	1,031,515.18	-3,220.80	1,028,294.38
431 - Running the local action group, acquiring skills and knowledge	338,597.68	0.00	338,597.68	148,982.98	0.00	148,982.98
Total Axis 4 : Leader	2,850,079.21	-7,320.00	2,842,759.21	1,254,034.85	-3,220.80	1,250,814.05
Total	26,920,488.37	-392,843.88	26,527,644.49	11,847,795.93	-172,851.30	11,674,944.63

III.1.: Risorse totali - Spesa pubblica dichiarata nell'anno solare 2013 e relativa quota FEASR:

III. 1. Public Expenditure incurred in 2013. Annual summary of declarations Q1 2013 to Q4 2013						
Rural Development Programme CCI n° : 2007IT06RPO002						
Measure / Axis	Total all Types of region					
	Public Expenditure (€)			EAFRD contribution (€)		
Measure / Axis	Amount declared	Recoveries / Corrections	Total	Amount	Recoveries / Corrections	Total
111 - Vocational training and information actions	222,630.98	0.00	222,630.98	98,068.95	0.00	98,068.95
112 - Setting up of young farmers	0.00	-14,448.04	-14,448.04	0.00	-6,357.15	-6,357.15
121 - Modernisation of agricultural holdings	725,142.86	-127,275.00	597,867.86	364,787.23	-56,001.00	308,786.23
122 - Improvement of the economic value of forests	36,540.46	0.00	36,540.46	16,096.07	0.00	16,096.07
123 - Adding value to agricultural and forestry products	3,805,969.20	-5,120.00	3,800,849.20	1,676,529.43	-2,252.80	1,674,276.63
124 - Cooperation for development of new products	544,177.64	0.00	544,177.64	239,710.25	0.00	239,710.25
125 - Infrastructure related to the development and adaptation of rural areas	512,041.49	0.00	512,041.49	225,554.28	0.00	225,554.28
Total Axis 1 : Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	5,846,502.63	-146,843.04	5,699,659.59	2,620,746.21	-64,610.95	2,556,135.26
211 - Natural handicap payments to farmers in mountain areas	639.70	-10,900.93	-10,261.23	281.47	-4,796.41	-4,514.94
214 - Agri-environment payments	18,767,631.45	-237,796.50	18,529,834.95	8,827,174.88	-111,353.09	8,715,821.79
227 - Non-productive investments	34,181.40	0.00	34,181.40	15,039.82	0.00	15,039.82
Total Axis 2 : Improving the environment and the countryside	18,802,452.55	-248,697.43	18,553,755.12	8,842,496.16	-116,149.50	8,726,346.66
311 - Diversification into non-agricultural activities	717,785.00	-32,000.00	685,785.00	315,825.40	-14,080.00	301,745.40
313 - Encouragement of tourism activities	568,809.48	0.00	568,809.48	250,276.17	0.00	250,276.17
321 - Basic services for the economy and rural population	1,727,712.93	0.00	1,727,712.93	760,193.69	0.00	760,193.69
323 - Conservation and upgrading of the rural heritage	250,403.07	0.00	250,403.07	110,177.35	0.00	110,177.35
Total Axis 3 : The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy	3,264,710.48	-32,000.00	3,232,710.48	1,436,472.61	-14,080.00	1,422,392.61
411 - Implementing local development strategies. Competitiveness	167,128.84	0.00	167,128.84	73,536.69	0.00	73,536.69
413 - Implementing local development strategies. Quality of life	2,344,352.69	-7,320.00	2,337,032.69	1,031,515.18	-3,220.80	1,028,294.38
431 - Running the local action group, acquiring skills and knowledge	338,597.68	0.00	338,597.68	148,982.98	0.00	148,982.98
Total Axis 4 : Leader	2,850,079.21	-7,320.00	2,842,759.21	1,254,034.85	-3,220.80	1,250,814.05
Total	30,763,744.87	-434,860.47	30,328,884.40	14,153,749.83	-198,061.25	13,955,688.58

III.2.: Risorse totali - Spesa pubblica dichiarata nel 4° trimestre 2012e nell'anno solare 2013:

III. 2. Declarations of expenditure Q4 2012 to Q4 2013 **Public expenditure declared by quarter**

Rural Development Programme CCI n° : 2007IT06RPO002

Measure / Axis	Public expenditures declared (€) (1)				
	Q4 2012	Q1 2013	Q2 2013	Q3 2013	Q4 2013
111 - Vocational training and information actions	4,285.19	0.00	123,089.80	0.00	99,541.18
112 - Setting up of young farmers	-10,578.37	-1,217.01	-13,231.03	0.00	0.00
121 - Modernisation of agricultural holdings	0.00	0.00	173,213.11	40,850.00	383,804.75
122 - Improvement of the economic value of forests	751,535.52	0.00	36,540.46	0.00	0.00
123 - Adding value to agricultural and forestry products	582,783.33	0.00	0.00	3,415,049.20	385,800.00
124 - Cooperation for development of new products	0.00	0.00	0.00	544,177.64	0.00
125 - Infrastructure related to the development and adaptation of rural areas	257,192.50	0.00	193,815.84	318,225.65	0.00
133 - Information and promotion activities	94,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Axis 1 : Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	1,679,693.17	-1,217.01	513,428.18	4,318,302.49	869,145.93
211 - Natural handicap payments to farmers in mountain	-3,379.09	-8,595.20	-1,005.02	-661.01	0.00
214 - Agri-environment payments	10,389,756.47	565,707.75	1,251,846.71	5,303,748.32	11,408,532.17
226 - Restoring forestry potential and introducing prevention	93,139.73	0.00	0.00	0.00	0.00
227 - Non-productive investments	0.00	0.00	0.00	34,181.40	0.00
Total Axis 2 : Improving the environment and the countryside	10,479,517.11	557,112.55	1,250,841.69	5,337,268.71	11,408,532.17
311 - Diversification into non-agricultural activities	32,000.00	0.00	316,600.00	185,185.00	184,000.00
313 - Encouragement of tourism activities	441,000.57	0.00	0.00	495,706.36	73,103.12
321 - Basic services for the economy and rural population	349,800.00	370,300.02	151,200.00	746,212.91	460,000.00
323 - Conservation and upgrading of the rural heritage	232,160.92	0.00	0.00	250,403.07	0.00
Total Axis 3 : The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy	1,054,961.49	370,300.02	467,800.00	1,677,507.34	717,103.12
411 - Implementing local development strategies. Competitiveness	0.00	0.00	67,134.69	47,051.95	52,942.20
413 - Implementing local development strategies. Quality of life	619,229.25	262,440.00	406,680.00	1,050,639.59	617,273.10
431 - Running the local action group, acquiring skills and knowledge	0.00	71,217.00	0.00	172,380.68	95,000.00
Total Axis 4 : Leader	619,229.25	333,657.00	473,814.69	1,270,072.22	765,215.30
Total	13,833,401.02	1,259,852.56	2,705,884.56	12,603,150.76	13,759,996.52

(1) Public expenditure declared after recoveries/correction

III.3.: Risorse totali - Spesa pubblica dichiarata nell'anno solare 2013e spesa pubblica dichiarata totale:

III. 3. Public expenditure declared by RD measure (%)

Rural Development Programme CCI n° : 2007IT06RPO002

Measure / Axis	Public expenditure declared (€) (1)			
	Sum Q1 2013 to Q4 2013	% of total	Sum Q4 2006 to Q4 2013	% of total
111 - Vocational training and information actions	222,630.98	0.73%	668,052.78	0.23%
112 - Setting up of young farmers	-14,448.04	-0.05%	9,882,473.59	3.35%
115 - Setting up of management, relief and advisory serv	0.00	0.00%	200,000.00	0.07%
121 - Modernisation of agricultural holdings	597,867.86	1.97%	13,340,579.57	4.53%
122 - Improvement of the economic value of forests	36,540.46	0.12%	4,125,812.45	1.40%
123 - Adding value to agricultural and forestry products	3,800,849.20	12.53%	28,995,066.98	9.84%
124 - Cooperation for development of new products	544,177.64	1.79%	544,177.64	0.18%
125 - Infrastructure related to the development and adap	512,041.49	1.69%	7,195,034.04	2.44%
133 - Information and promotion activities	0.00	0.00%	270,195.00	0.09%
Total Axis 1 : Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	5,699,659.59	18.79%	65,221,392.05	22.13%
211 - Natural handicap payments to farmers in mountain	-10,261.23	-0.03%	62,345,169.36	21.15%
214 - Agri-environment payments	18,529,834.95	61.10%	133,903,741.36	45.44%
226 - Restoring forestry potential and introducing prevent	0.00	0.00%	3,898,794.74	1.32%
227 - Non-productive investments	34,181.40	0.11%	208,123.82	0.07%
Total Axis 2 : Improving the environment and the countryside	18,553,755.12	61.18%	200,355,829.28	67.98%
311 - Diversification into non-agricultural activities	685,785.00	2.26%	5,842,856.60	1.98%
313 - Encouragement of tourism activities	568,809.48	1.88%	1,329,906.66	0.45%
321 - Basic services for the economy and rural population	1,727,712.93	5.70%	13,653,173.18	4.63%
323 - Conservation and upgrading of the rural heritage	250,403.07	0.83%	942,167.94	0.32%
Total Axis 3 : The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy	3,232,710.48	10.66%	21,768,104.38	7.39%
411 - Implementing local development strategies. Compete	167,128.84	0.55%	280,482.86	0.10%
413 - Implementing local development strategies. Quality	2,337,032.69	7.71%	5,810,108.97	1.97%
431 - Running the local action group, acquiring skills and	338,597.68	1.12%	1,270,747.68	0.43%
Total Axis 4 : Leader	2,842,759.21	9.37%	7,361,339.51	2.50%
Total	30,328,884.40	100.00%	294,706,665.22	100.00%

(1) Public expenditure declared after recoveries/correction

IV.1.: Risorse totali - Spesa FEASR liquidata nell'anno solare 2013:

IV. 1. EAFRD payments by measure. Annual Summary Q1 2013 to Q4 2013					
Rural Development Programme CCI n° : 2007IT06RPO002					
Measure / Axis	EAFRD amounts (€)				
	Requested Q1 2013 to Q4 2013	Clearance of accounts 2012	Non eligible Q1 2013 to Q4 2013	Transitory reduction Q4 2013	Paid for Q1 2013 to Q4 2013
111 - Vocational training and information actions	98,068.95	-0.01	0.00	0.00	98,068.94
112 - Setting up of young farmers	-6,357.15	0.00	0.00	0.00	-6,357.15
121 - Modernisation of agricultural holdings	308,786.23	-0.01	0.00	0.00	308,786.22
122 - Improvement of the economic value of forests	16,096.07	0.00	0.00	0.00	16,096.07
123 - Adding value to agricultural and forestry products	1,674,276.63	0.00	0.00	0.00	1,674,276.63
124 - Cooperation for development of new products	239,710.25	0.00	0.00	0.00	239,710.25
125 - Infrastructure related to the development and adap	225,554.28	0.00	0.00	0.00	225,554.28
Excess over Financial Plan Axis 1					0.00
Total Axis 1 Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	2,556,135.26	-0.02	0.00	0.00	2,556,135.24
211 - Natural handicap payments to farmers in mountain	-4,514.94	-0.01	0.00	0.00	-4,514.95
214 - Agri-environment payments	8,715,821.79	-0.33	0.00	0.00	8,715,821.46
227 - Non-productive investments	15,039.82	0.00	0.00	0.00	15,039.82
Excess over Financial Plan Axis 2					0.00
Total Axis 2 Improving the environment and the countryside	8,726,346.66	-0.34	0.00	0.00	8,726,346.32
311 - Diversification into non-agricultural activities	301,745.40	0.00	0.00	0.00	301,745.40
313 - Encouragement of tourism activities	250,276.17	0.00	0.00	0.00	250,276.17
321 - Basic services for the economy and rural population	760,193.69	0.00	0.00	0.00	760,193.69
323 - Conservation and upgrading of the rural heritage	110,177.35	0.00	0.00	0.00	110,177.35
Excess over Financial Plan Axis 3					0.00
Total Axis 3 The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy	1,422,392.61	0.00	0.00	0.00	1,422,392.61
411 - Implementing local development strategies. Competitiveness	73,536.69	0.00	0.00	0.00	73,536.69
413 - Implementing local development strategies. Quality of life	1,028,294.38	0.00	0.00	0.00	1,028,294.38
431 - Running the local action group, acquiring skills and	148,982.98	0.00	0.00	0.00	148,982.98
Excess over Financial Plan Axis 4					0.00
Total Axis 4 Leader	1,250,814.05	0.00	0.00	0.00	1,250,814.05
Total	13,955,688.58	-0.36	0.00	0.00	13,955,688.22

IV.2.: Risorse totali - Spesa FEASR liquidata nel 4° trimestre 2010 e nell'anno solare 2013:

IV. 2. EAFRD contribution paid by quarter Q4 2012 to Q4 2013

Rural Development Programme CCI n° : 2007IT06RPO002

Measure / Axis	EAFRD amount paid by quarter				
	Q4 2012	Q1 2013	Q2 2013	Q3 2013	Q4 2013
111 - Vocational training and information actions	1,885.48	0.00	54,221.05	0.00	43,847.89
112 - Setting up of young farmers	-4,660.48	-535.49	-5,821.66	0.00	0.00
121 - Modernisation of agricultural holdings	0.00	0.00	86,339.29	17,994.43	204,452.50
122 - Improvement of the economic value of forests	330,675.63	0.00	16,096.07	0.00	0.00
123 - Adding value to agricultural and forestry products	256,424.67	0.00	0.00	1,504,331.73	169,944.90
124 - Cooperation for development of new products	0.00	0.00	0.00	239,710.25	0.00
125 - Infrastructure related to the development and adaptation of rural areas	113,164.70	0.00	85,375.88	140,178.40	0.00
133 - Information and promotion activities	41,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Axis 1 Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	739,059.00	-535.49	236,210.63	1,902,214.81	418,245.29
211 - Natural handicap payments to farmers in mountain areas	-1,486.74	-3,781.89	-442.22	-290.84	0.00
214 - Agri-environment payments	4,945,826.25	257,413.57	550,530.01	2,496,594.81	5,411,283.07
226 - Restoring forestry potential and introducing preventive measures	40,981.48	0.00	0.00	0.00	0.00
227 - Non-productive investments	0.00	0.00	0.00	15,039.82	0.00
Total Axis 2 Improving the environment and the countryside	4,985,320.99	253,631.68	550,087.79	2,511,343.78	5,411,283.07
311 - Diversification into non-agricultural activities	14,080.00	0.00	139,304.00	81,481.40	80,960.00
313 - Encouragement of tourism activities	194,040.25	0.00	0.00	218,110.80	32,165.37
321 - Basic services for the economy and rural population	153,912.00	162,932.01	66,528.00	328,333.68	202,400.00
323 - Conservation and upgrading of the rural heritage	102,150.80	0.00	0.00	110,177.35	0.00
Total Axis 3 The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy	464,183.06	162,932.01	205,832.00	738,103.23	315,525.37
411 - Implementing local development strategies. Competitiveness	0.00	0.00	29,539.26	20,702.86	23,294.57
413 - Implementing local development strategies. Quality of life	272,460.87	115,473.60	178,939.20	462,281.42	271,600.16
431 - Running the local action group, acquiring skills and knowledge	0.00	31,335.48	0.00	75,847.50	41,800.00
Total Axis 4 Leader	272,460.87	146,809.08	208,478.46	558,831.78	336,694.73
Total	6,461,023.91	562,837.28	1,200,608.89	5,710,493.59	6,481,748.46

IV.3.: Risorse totali - Spesa FEASR liquidata nell'anno finanziario 2013 e in quello solare 2013:

IV. 3. Total EAFRD payments by measure for the financial and calendar year				
Rural Development Programme CCI n° : 2007IT06RPO002				
Measure / Axis	EAFRD payments by measure (€)			
	Financial year Q4 2012 to Q3 2013	% of total	Calendar year Q1 2013 to Q4 2013	% of total
111 - Vocational training and information actions	56,106.53	0.40%	98,068.94	0.70%
112 - Setting up of young farmers	-11,017.63	-0.08%	-6,357.15	-0.05%
121 - Modernisation of agricultural holdings	104,333.72	0.75%	308,786.22	2.21%
122 - Improvement of the economic value of forests	346,771.70	2.49%	16,096.07	0.12%
123 - Adding value to agricultural and forestry products	1,760,756.40	12.64%	1,674,276.63	12.00%
124 - Cooperation for development of new products	239,710.25	1.72%	239,710.25	1.72%
125 - Infrastructure related to the development and adaptation of rural areas and communities	338,718.98	2.43%	225,554.28	1.62%
133 - Information and promotion activities	41,569.00	0.30%	0.00	0.00%
Total Axis 1 Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	2,876,948.95	20.65%	2,556,135.24	18.32%
211 - Natural handicap payments to farmers in mountain areas	-6,001.69	-0.04%	-4,514.95	-0.03%
214 - Agri-environment payments	8,250,364.64	59.21%	8,715,821.46	62.45%
226 - Restoring forestry potential and introducing preventive measures in forestry management	40,981.48	0.29%	0.00	0.00%
227 - Non-productive investments	15,039.82	0.11%	15,039.82	0.11%
Total Axis 2 Improving the environment and the countryside	8,300,384.25	59.57%	8,726,346.32	62.53%
311 - Diversification into non-agricultural activities	234,865.40	1.69%	301,745.40	2.16%
313 - Encouragement of tourism activities	412,151.05	2.96%	250,276.17	1.79%
321 - Basic services for the economy and rural population	711,705.69	5.11%	760,193.69	5.45%
323 - Conservation and upgrading of the rural heritage	212,328.16	1.52%	110,177.35	0.79%
Total Axis 3 The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy	1,571,050.29	11.27%	1,422,392.61	10.19%
411 - Implementing local development strategies. Competitiveness and innovation	50,242.12	0.36%	73,536.69	0.53%
413 - Implementing local development strategies. Quality of life and environment	1,029,155.09	7.39%	1,028,294.38	7.37%
431 - Running the local action group, acquiring skills and knowledge	107,182.98	0.77%	148,982.98	1.07%
Total Axis 4 Leader	1,186,580.19	8.52%	1,250,814.05	8.96%
Total	13,934,963.68	100.00%	13,955,688.22	100.00%

V.1.(A): Health Check - Spesa pubblica dichiarata a partire dall'inizio della programmazione:

<u>V. 1. Historic of public expenditure declared by measure Q4 2006 to Q4 2013</u>									
Rural Development Programme CCI n° : 2007IT06RPO002									
	New Challenges – Non Convergence Region								
Measure / Axis	Public expenditures declared (€) (1)								
	Q4 2010	Q1 2011	Q2 2011	Q3 2011	Q4 2011	Q1 2012	Q2 2012	Q3 2012	Q4 2012
121 - Modernisation of agricultural holdings	0.00	1,610,641.45	175,185.00	266,201.20	351,558.00	613,796.76	171,300.00	95,010.00	0.00
Total Axis 1 : Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	0.00	1,610,641.45	175,185.00	266,201.20	351,558.00	613,796.76	171,300.00	95,010.00	0.00
214 - Agri-environment payments	2,444,075.90	3,374.00	-84.66	989,484.21	2,445,676.66	57,874.49	958,450.15	13,402.36	2,339,583.69
Total Axis 2 : Improving the environment and the countryside	2,444,075.90	3,374.00	-84.66	989,484.21	2,445,676.66	57,874.49	958,450.15	13,402.36	2,339,583.69
Total	2,444,075.90	1,614,015.45	175,100.34	1,255,685.41	2,797,234.66	671,671.25	1,129,750.15	108,412.36	2,339,583.69

(1) Public expenditure declared after recoveries/correction

V.1.(B): Health Check - Spesa pubblica dichiarata a partire dall'inizio della programmazione:

<u>V. 1. Historic of public expenditure declared by measure Q4 2006 to Q4 2013</u>					
Rural Development Programme CCI n° : 2007IT06RPO002					
	New Challenges – Non Convergence Region				
Measure / Axis	Public expenditures declared (€) (1)				
	Q1 2013	Q2 2013	Q3 2013	Q4 2013	Total
121 - Modernisation of agricultural holdings	0.00	62,940.00	0.00	221,460.00	3,568,092.41
Total Axis 1 : Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	0.00	62,940.00	0.00	221,460.00	3,568,092.41
214 - Agri-environment payments	53,138.37	-1,763.96	1,018,409.76	2,447,055.74	12,768,676.71
Total Axis 2 : Improving the environment and the countryside	53,138.37	-1,763.96	1,018,409.76	2,447,055.74	12,768,676.71
Total	53,138.37	61,176.04	1,018,409.76	2,668,515.74	16,336,769.12

V.1. (A): Risorse ordinarie - Spesa pubblica dichiarata a partire dall'inizio della programmazione:

V. 1. Historic of public expenditure declared by measure Q4 2006 to Q4 2013									
Rural Development Programme CCI n° : 2007IT06RPO002									
	Non-Convergence Regions								
Measure / Axis	Public expenditures declared (€) (1)								
	Q3 2007	Q4 2007	Q2 2008	Q3 2008	Q2 2009	Q3 2009	Q4 2009	Q1 2010	Q2 2010
111 - Vocational training and information actions	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,459.61	19,862.69	0.00	0.00
112 - Setting up of young farmers	20,000.00	0.00	0.00	2,512,500.00	485,000.00	2,470,000.00	192,500.00	0.00	340,000.00
115 - Setting up of management, relief and advisory services	0.00	0.00	0.00	0.00	86,650.00	0.00	0.00	0.00	89,350.00
121 - Modernisation of agricultural holdings	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545,538.41	311,550.00	0.00	1,244,650.65
122 - Improvement of the economic value of forests	12,929.03	83,540.42	83,540.42	6,612.23	917,389.24	471,312.14	545,082.78	7,435.80	-242.59
123 - Adding value to agricultural and forestry products	1,523,893.68	0.00	0.00	951,600.00	1,197,386.85	0.00	2,060,587.49	60,000.00	1,200,000.00
124 - Cooperation for development of new products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125 - Infrastructure related to the development and adaptation ...	1,499,686.24	1,079,499.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 - Information and promotion activities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Axis 1 : Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	3,056,808.95	1,163,039.90	83,540.42	3,470,712.23	2,686,426.09	4,627,310.16	3,129,582.96	67,435.80	2,873,758.06
211 - Natural handicap payments to farmers in mountain areas	10,748,779.92	54,859.90	10,031,232.66	3,093,581.18	9,670,218.21	4,262,544.45	14,077,894.66	380,372.01	93,040.42
214 - Agri-environment payments	17,640,948.40	405,373.40	112,549.90	13,915,447.51	13,746,773.10	4,887,179.48	9,023,966.41	1,047,322.57	155,337.64
226 - Restoring forestry potential and introducing prevention ...	0.00	1,313,442.15	1,313,442.15	0.00	0.00	0.00	0.00	74,314.53	0.00
227 - Non-productive investments	14,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,053.29	0.00
Total Axis 2 : Improving the environment and the countryside	28,404,295.32	1,773,675.45	11,457,224.71	17,009,028.69	23,416,991.31	9,149,723.93	23,101,861.07	1,552,062.40	248,378.06
311 - Diversification into non-agricultural activities	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,720.00	338,975.00	72,000.00	450,940.00	143,200.00
313 - Encouragement of tourism activities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,843.00	0.00
321 - Basic services for the economy and rural population	117,600.00	0.00	0.00	0.00	255,770.00	77,000.00	1,116,463.38	483,350.00	43,200.00
323 - Conservation and upgrading of the rural heritage	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Axis 3 : The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy	117,600.00	0.00	0.00	0.00	1,270,490.00	415,975.00	1,188,463.38	944,133.00	186,400.00

V.1. (B): Risorse ordinarie - Spesa pubblica dichiarata a partire dall'inizio della programmazione:

V. 1. Historic of public expenditure declared by measure Q4 2006 to Q4 2013									
Rural Development Programme CCI n° : 2007IT06RPO002									
	Non-Convergence Regions								
Measure / Axis	Public expenditures declared (€) (1)								
	Q3 2010	Q4 2010	Q1 2011	Q2 2011	Q3 2011	Q4 2011	Q1 2012	Q2 2012	Q3 2012
111 - Vocational training and information actions	38,647.24	55,921.56	55,712.39	0.00	76,043.90	0.00	35,072.76	0.00	19,116.46
112 - Setting up of young farmers	0.00	2,625,000.00	1,140,000.00	72,500.00	47,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
115 - Setting up of management, relief and advisory services	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 - Modernisation of agricultural holdings	441,107.03	0.00	1,515,073.93	1,073,975.00	507,743.52	790,094.96	543,978.85	1,205,831.13	279,475.82
122 - Improvement of the economic value of forests	1,047,380.03	16,050.37	0.00	1,840.00	144,866.60	0.00	0.00	0.00	0.00
123 - Adding value to agricultural and forestry products	7,038,625.72	5,387,150.00	79,720.00	838,626.40	387,198.83	0.00	0.00	2,772,250.00	1,114,395.48
124 - Cooperation for development of new products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125 - Infrastructure related to the development and adaptation ...	827,398.96	0.00	0.00	1,336,280.00	428,400.00	992,537.74	0.00	269,382.82	-7,385.19
133 - Information and promotion activities	73,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,578.00	0.00	0.00	0.00
Total Axis 1 : Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	9,466,300.98	8,108,121.93	2,790,506.32	3,323,221.40	1,591,752.85	1,887,710.70	579,051.61	4,247,463.95	1,405,602.57
211 - Natural handicap payments to farmers in mountain areas	5,668,796.47	2,603,111.57	419,181.82	99,677.81	1,097,357.27	5,087.35	53,311.60	-237.62	0.00
214 - Agri-environment payments	7,379,976.34	7,841,071.00	967,809.49	4,347,978.44	855,542.25	9,638,003.26	1,615,413.20	4,466,093.44	25,111.00
226 - Restoring forestry potential and introducing prevention ...	407,254.17	0.00	0.00	0.00	0.00	756,498.60	0.00	0.00	-59,296.59
227 - Non-productive investments	40,919.79	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.58	0.00	0.00	50,851.76
Total Axis 2 : Improving the environment and the countryside	13,496,946.77	10,444,182.57	1,386,991.31	4,447,656.25	1,952,899.52	10,417,139.79	1,668,724.80	4,465,855.82	16,666.17
311 - Diversification into non-agricultural activities	468,085.00	0.00	804,210.00	268,800.00	583,209.92	103,120.00	451,675.18	67,200.00	358,936.50
313 - Encouragement of tourism activities	60,519.92	0.00	0.00	46,120.00	-46,120.00	259,501.51	0.00	0.00	-9,767.82
321 - Basic services for the economy and rural population	2,276,159.24	571,477.63	200,000.00	772,880.00	621,560.00	1,454,310.00	1,422,210.00	1,544,800.00	618,880.00
323 - Conservation and upgrading of the rural heritage	262,785.25	0.00	0.00	0.00	0.00	216,247.09	0.00	0.00	-19,428.39
Total Axis 3 : The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy	3,067,549.41	571,477.63	1,004,210.00	1,087,800.00	1,158,649.92	2,033,178.60	1,873,885.18	1,612,000.00	948,620.29

V.1. (C): Risorse ordinarie - Spesa pubblica dichiarata a partire dall'inizio della programmazione:

V. 1. Historic of public expenditure declared by measure Q4 2006 to Q4 2013						
Rural Development Programme CCI n° : 2007IT06RPO002						
	Non-Convergence Regions					
Measure / Axis	Public expenditures declared (€) (1)					
	Q4 2012	Q1 2013	Q2 2013	Q3 2013	Q4 2013	Total
111 - Vocational training and information actions	4,285.19	0.00	123,089.80	0.00	99,541.18	668,052.78
112 - Setting up of young farmers	-10,578.37	-1,217.01	-13,231.03	0.00	0.00	9,882,473.59
115 - Setting up of management, relief and advisory services	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
121 - Modernisation of agricultural holdings	0.00	0.00	110,273.11	40,850.00	162,344.75	9,772,487.16
122 - Improvement of the economic value of forests	751,535.52	0.00	36,540.46	0.00	0.00	4,125,812.45
123 - Adding value to agricultural and forestry products	582,783.33	0.00	0.00	3,415,049.20	385,800.00	28,995,066.98
124 - Cooperation for development of new products	0.00	0.00	0.00	544,177.64	0.00	544,177.64
125 - Infrastructure related to the development and adaptation ...	257,192.50	0.00	193,815.84	318,225.65	0.00	7,195,034.04
133 - Information and promotion activities	94,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,195.00
Total Axis 1 : Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	1,679,693.17	-1,217.01	450,488.18	4,318,302.49	647,685.93	61,653,299.64
211 - Natural handicap payments to farmers in mountain areas	-3,379.09	-8,595.20	-1,005.02	-661.01	0.00	62,345,169.36
214 - Agri-environment payments	8,050,172.78	512,569.38	1,253,610.67	4,285,338.56	8,961,476.43	121,135,064.65
226 - Restoring forestry potential and introducing prevention ...	93,139.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898,794.74
227 - Non-productive investments	0.00	0.00	0.00	34,181.40	0.00	208,123.82
Total Axis 2 : Improving the environment and the countryside	8,139,933.42	503,974.18	1,252,605.65	4,318,858.95	8,961,476.43	187,587,152.57
311 - Diversification into non-agricultural activities	32,000.00	0.00	316,600.00	185,185.00	184,000.00	5,842,856.60
313 - Encouragement of tourism activities	441,000.57	0.00	0.00	495,706.36	73,103.12	1,329,906.66
321 - Basic services for the economy and rural population	349,800.00	370,300.02	151,200.00	746,212.91	460,000.00	13,653,173.18
323 - Conservation and upgrading of the rural heritage	232,160.92	0.00	0.00	250,403.07	0.00	942,167.94
Total Axis 3 : The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy	1,054,961.49	370,300.02	467,800.00	1,677,507.34	717,103.12	21,768,104.38

V.1. (D): Risorse ordinarie - Spesa pubblica dichiarata a partire dall'inizio della programmazione:

V. 1. Historic of public expenditure declared by measure Q4 2006 to Q4 2013									
Rural Development Programme CCI n° : 2007IT06RPO002									
	Non-Convergence Regions								
Measure / Axis	Public expenditures declared (€) (1)								
	Q3 2007	Q4 2007	Q2 2008	Q3 2008	Q2 2009	Q3 2009	Q4 2009	Q1 2010	Q2 2010
411 - Implementing local development strategies. Competitiveness	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 - Implementing local development strategies. Quality of life	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,680.00
431 - Running the local action group, acquiring skills and ...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Axis 4 : Leader	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	62,680.00
Total	31,578,704.27	2,936,715.35	11,540,765.13	20,479,740.92	27,373,907.40	14,340,009.09	27,419,907.41	2,563,631.20	3,371,216.12

(1) Public expenditure declared after recoveries/correction

V.1. (E): Risorse ordinarie - Spesa pubblica dichiarata a partire dall'inizio della programmazione:

<u>V. 1. Historic of public expenditure declared by measure Q4 2006 to Q4 2013</u>									
Rural Development Programme CCI n° : 2007IT06RPO002									
	Non-Convergence Regions								
Measure / Axis	Public expenditures declared (€) (1)								
	Q3 2010	Q4 2010	Q1 2011	Q2 2011	Q3 2011	Q4 2011	Q1 2012	Q2 2012	Q3 2012
411 - Implementing local development strategies. Competitiveness	0.00	0.00	0.00	27,656.00	57,230.58	0.00	28,467.44	0.00	0.00
413 - Implementing local development strategies. Quality of life	0.00	149,880.00	0.00	239,944.25	381,540.00	746,922.88	502,824.00	104,092.31	665,963.59
431 - Running the local action group, acquiring skills and ...	216,200.00	32,490.00	94,600.00	0.00	145,360.00	100,000.00	99,800.00	96,700.00	0.00
Total Axis 4 : Leader	216,200.00	182,370.00	94,600.00	267,600.25	584,130.58	846,922.88	631,091.44	200,792.31	665,963.59
Total	26,246,997.16	19,306,152.13	5,276,307.63	9,126,277.90	5,287,432.87	15,184,951.97	4,752,753.03	10,526,112.08	3,036,852.62

V.1. (F): Risorse ordinarie - Spesa pubblica dichiarata a partire dall'inizio della programmazione:

<u>V. 1. Historic of public expenditure declared by measure Q4 2006 to Q4 2013</u>						
Rural Development Programme CCI n° : 2007IT06RPO002						
	Non-Convergence Regions					
Measure / Axis	Public expenditures declared (€) (1)					
	Q4 2012	Q1 2013	Q2 2013	Q3 2013	Q4 2013	Total
411 - Implementing local development strategies. Competitiveness	0.00	0.00	67,134.69	47,051.95	52,942.20	280,482.86
413 - Implementing local development strategies. Quality of life	619,229.25	262,440.00	406,680.00	1,050,639.59	617,273.10	5,810,108.97
431 - Running the local action group, acquiring skills and ...	0.00	71,217.00	0.00	172,380.68	95,000.00	1,270,747.68
Total Axis 4 : Leader	619,229.25	333,657.00	473,814.69	1,270,072.22	765,215.30	7,361,339.51
Total	11,493,817.33	1,206,714.19	2,644,708.52	11,584,741.00	11,091,480.78	278,369,896.10

V.1. (A): Risorse totali - Spesa pubblica dichiarata a partire dall'inizio della programmazione:

V. 1. Historic of public expenditure declared by measure Q4 2006 to Q4 2013									
Rural Development Programme CCI n° : 2007IT06RPO002									
Measure / Axis	Total all Types of region								
	Public expenditures declared (€) (1)								
	Q3 2007	Q4 2007	Q2 2008	Q3 2008	Q2 2009	Q3 2009	Q4 2009	Q1 2010	Q2 2010
111 - Vocational training and information actions	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,459.61	19,862.69	0.00	0.00
112 - Setting up of young farmers	20,000.00	0.00	0.00	2,512,500.00	485,000.00	2,470,000.00	192,500.00	0.00	340,000.00
115 - Setting up of management, relief and advisory services	0.00	0.00	0.00	0.00	86,650.00	0.00	0.00	0.00	89,350.00
121 - Modernisation of agricultural holdings	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545,538.41	311,550.00	0.00	1,244,650.65
122 - Improvement of the economic value of forests	12,929.03	83,540.42	83,540.42	6,612.23	917,389.24	471,312.14	545,082.78	7,435.80	-242.59
123 - Adding value to agricultural and forestry products	1,523,893.68	0.00	0.00	951,600.00	1,197,386.85	0.00	2,060,587.49	60,000.00	1,200,000.00
124 - Cooperation for development of new products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125 - Infrastructure related to the development and adaptation ...	1,499,686.24	1,079,499.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 - Information and promotion activities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Axis 1 : Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	3,056,808.95	1,163,039.90	83,540.42	3,470,712.23	2,686,426.09	4,627,310.16	3,129,582.96	67,435.80	2,873,758.06
211 - Natural handicap payments to farmers in mountain areas	10,748,779.92	54,859.90	10,031,232.66	3,093,581.18	9,670,218.21	4,262,544.45	14,077,894.66	380,372.01	93,040.42
214 - Agri-environment payments	17,640,948.40	405,373.40	112,549.90	13,915,447.51	13,746,773.10	4,887,179.48	9,023,966.41	1,047,322.57	155,337.64
226 - Restoring forestry potential and introducing prevention ...	0.00	1,313,442.15	1,313,442.15	0.00	0.00	0.00	0.00	74,314.53	0.00
227 - Non-productive investments	14,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,053.29	0.00
Total Axis 2 : Improving the environment and the countryside	28,404,295.32	1,773,675.45	11,457,224.71	17,009,028.69	23,416,991.31	9,149,723.93	23,101,861.07	1,552,062.40	248,378.06
311 - Diversification into non-agricultural activities	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,720.00	338,975.00	72,000.00	450,940.00	143,200.00
313 - Encouragement of tourism activities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,843.00	0.00
321 - Basic services for the economy and rural population	117,600.00	0.00	0.00	0.00	255,770.00	77,000.00	1,116,463.38	483,350.00	43,200.00
323 - Conservation and upgrading of the rural heritage	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Axis 3 : The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy	117,600.00	0.00	0.00	0.00	1,270,490.00	415,975.00	1,188,463.38	944,133.00	186,400.00
411 - Implementing local development strategies. Competitiveness	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 - Implementing local development strategies. Quality of life	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,680.00

V.1. (B): Risorse totali - Spesa pubblica dichiarata a partire dall'inizio della programmazione:

V. 1. Historic of public expenditure declared by measure Q4 2006 to Q4 2013									
Rural Development Programme CCI n° : 2007IT06RPO002									
Measure / Axis	Total all Types of region								
	Public expenditures declared (€) (1)								
	Q3 2010	Q4 2010	Q1 2011	Q2 2011	Q3 2011	Q4 2011	Q1 2012	Q2 2012	Q3 2012
111 - Vocational training and information actions	38,647.24	55,921.56	55,712.39	0.00	76,043.90	0.00	35,072.76	0.00	19,116.46
112 - Setting up of young farmers	0.00	2,625,000.00	1,140,000.00	72,500.00	47,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
115 - Setting up of management, relief and advisory services	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 - Modernisation of agricultural holdings	441,107.03	0.00	3,125,715.38	1,249,160.00	773,944.72	1,141,652.96	1,157,775.61	1,377,131.13	374,485.82
122 - Improvement of the economic value of forests	1,047,380.03	16,050.37	0.00	1,840.00	144,866.60	0.00	0.00	0.00	0.00
123 - Adding value to agricultural and forestry products	7,038,625.72	5,387,150.00	79,720.00	838,626.40	387,198.83	0.00	0.00	2,772,250.00	1,114,395.48
124 - Cooperation for development of new products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125 - Infrastructure related to the development and adaptation ...	827,398.96	0.00	0.00	1,336,280.00	428,400.00	992,537.74	0.00	269,382.82	-7,385.19
133 - Information and promotion activities	73,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,578.00	0.00	0.00	0.00
Total Axis 1 : Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	9,466,300.98	8,108,121.93	4,401,147.77	3,498,406.40	1,857,954.05	2,239,268.70	1,192,848.37	4,418,763.95	1,500,612.57
211 - Natural handicap payments to farmers in mountain areas	5,668,796.47	2,603,111.57	419,181.82	99,677.81	1,097,357.27	5,087.35	53,311.60	-237.62	0.00
214 - Agri-environment payments	7,379,976.34	10,285,146.90	971,183.49	4,347,893.78	1,845,026.46	12,083,679.92	1,673,287.69	5,424,543.59	38,513.36
226 - Restoring forestry potential and introducing prevention ...	407,254.17	0.00	0.00	0.00	0.00	756,498.60	0.00	0.00	-59,296.59
227 - Non-productive investments	40,919.79	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.58	0.00	0.00	50,851.76
Total Axis 2 : Improving the environment and the countryside	13,496,946.77	12,888,258.47	1,390,365.31	4,447,571.59	2,942,383.73	12,862,816.45	1,726,599.29	5,424,305.97	30,068.53
311 - Diversification into non-agricultural activities	468,085.00	0.00	804,210.00	268,800.00	583,209.92	103,120.00	451,675.18	67,200.00	358,936.50
313 - Encouragement of tourism activities	60,519.92	0.00	0.00	46,120.00	-46,120.00	259,501.51	0.00	0.00	-9,767.82
321 - Basic services for the economy and rural population	2,276,159.24	571,477.63	200,000.00	772,880.00	621,560.00	1,454,310.00	1,422,210.00	1,544,800.00	618,880.00
323 - Conservation and upgrading of the rural heritage	262,785.25	0.00	0.00	0.00	0.00	216,247.09	0.00	0.00	-19,428.39
Total Axis 3 : The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy	3,067,549.41	571,477.63	1,004,210.00	1,087,880.00	1,158,649.92	2,033,178.60	1,873,885.18	1,612,000.00	948,620.29
411 - Implementing local development strategies. Competitiveness	0.00	0.00	0.00	27,656.00	57,230.58	0.00	28,467.44	0.00	0.00
413 - Implementing local development strategies. Quality of life	0.00	149,880.00	0.00	239,944.25	381,540.00	746,922.88	502,824.00	104,092.31	665,963.59

V.1. (C): Risorse totali - Spesa pubblica dichiarata a partire dall'inizio della programmazione:

V. 1. Historic of public expenditure declared by measure Q4 2006 to Q4 2013						
Rural Development Programme CCI n° : 2007IT06RPO002						
Measure / Axis	Total all Types of region					
	Public expenditures declared (€) (1)					
	Q4 2012	Q1 2013	Q2 2013	Q3 2013	Q4 2013	Total
111 - Vocational training and information actions	4,285.19	0.00	123,089.80	0.00	99,541.18	668,052.78
112 - Setting up of young farmers	-10,578.37	-1,217.01	-13,231.03	0.00	0.00	9,882,473.59
115 - Setting up of management, relief and advisory services	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
121 - Modernisation of agricultural holdings	0.00	0.00	173,213.11	40,850.00	383,804.75	13,340,579.57
122 - Improvement of the economic value of forests	751,535.52	0.00	36,540.46	0.00	0.00	4,125,812.45
123 - Adding value to agricultural and forestry products	582,783.33	0.00	0.00	3,415,049.20	385,800.00	28,995,066.98
124 - Cooperation for development of new products	0.00	0.00	0.00	544,177.64	0.00	544,177.64
125 - Infrastructure related to the development and adaptation ...	257,192.50	0.00	193,815.84	318,225.65	0.00	7,195,034.04
133 - Information and promotion activities	94,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,195.00
Total Axis 1 : Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	1,679,693.17	-1,217.01	513,428.18	4,318,302.49	869,145.93	65,221,392.05
211 - Natural handicap payments to farmers in mountain areas	-3,379.09	-8,595.20	-1,005.02	-661.01	0.00	62,345,169.36
214 - Agri-environment payments	10,389,756.47	565,707.75	1,251,846.71	5,303,748.32	11,408,532.17	133,903,741.36
226 - Restoring forestry potential and introducing prevention ...	93,139.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898,794.74
227 - Non-productive investments	0.00	0.00	0.00	34,181.40	0.00	208,123.82
Total Axis 2 : Improving the environment and the countryside	10,479,517.11	557,112.55	1,250,841.69	5,337,268.71	11,408,532.17	200,355,829.28
311 - Diversification into non-agricultural activities	32,000.00	0.00	316,600.00	185,185.00	184,000.00	5,842,856.60
313 - Encouragement of tourism activities	441,000.57	0.00	0.00	495,706.36	73,103.12	1,329,906.66
321 - Basic services for the economy and rural population	349,800.00	370,300.02	151,200.00	746,212.91	460,000.00	13,653,173.18
323 - Conservation and upgrading of the rural heritage	232,160.92	0.00	0.00	250,403.07	0.00	942,167.94
Total Axis 3 : The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy	1,054,961.49	370,300.02	467,800.00	1,677,507.34	717,103.12	21,768,104.38
411 - Implementing local development strategies. Competitiveness	0.00	0.00	67,134.69	47,051.95	52,942.20	280,482.86
413 - Implementing local development strategies. Quality of life	619,229.25	262,440.00	406,680.00	1,050,639.59	617,273.10	5,810,108.97

V.1. (D): Risorse totali - Spesa pubblica dichiarata a partire dall'inizio della programmazione:

V. 1. Historic of public expenditure declared by measure Q4 2006 to Q4 2013									
Rural Development Programme CCI n° : 2007IT06RPO002									
Measure / Axis	Total all Types of region								
	Public expenditures declared (€) (1)								
	Q3 2007	Q4 2007	Q2 2008	Q3 2008	Q2 2009	Q3 2009	Q4 2009	Q1 2010	Q2 2010
431 - Running the local action group, acquiring skills and ...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Axis 4 : Leader	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	62,680.00
Total	31,578,704.27	2,936,715.35	11,540,765.13	20,479,740.92	27,373,907.40	14,340,009.09	27,419,907.41	2,563,631.20	3,371,216.12

(1) Public expenditure declared after recoveries/correction

V.1. (E): Risorse totali - Spesa pubblica dichiarata a partire dall'inizio della programmazione:

V. 1. Historic of public expenditure declared by measure Q4 2006 to Q4 2013									
Rural Development Programme CCI n° : 2007IT06RPO002									
Measure / Axis	Total all Types of region								
	Public expenditures declared (€) (1)								
	Q3 2010	Q4 2010	Q1 2011	Q2 2011	Q3 2011	Q4 2011	Q1 2012	Q2 2012	Q3 2012
431 - Running the local action group, acquiring skills and ...	216,200.00	32,490.00	94,600.00	0.00	145,360.00	100,000.00	99,800.00	96,700.00	0.00
Total Axis 4 : Leader	216,200.00	182,370.00	94,600.00	267,600.25	584,130.58	846,922.88	631,091.44	200,792.31	665,963.59
Total	26,246,997.16	21,750,228.03	6,890,323.08	9,301,378.24	6,543,118.28	17,982,186.63	5,424,424.28	11,655,862.23	3,145,264.98

V.1. (F): Risorse totali - Spesa pubblica dichiarata a partire dall'inizio della programmazione:

V. 1. Historic of public expenditure declared by measure Q4 2006 to Q4 2013						
Rural Development Programme CCI n° : 2007IT06RPO002						
Measure / Axis	Total all Types of region					
	Public expenditures declared (€) (1)					
	Q4 2012	Q1 2013	Q2 2013	Q3 2013	Q4 2013	Total
431 - Running the local action group, acquiring skills and ...	0.00	71,217.00	0.00	172,380.68	95,000.00	1,270,747.68
Total Axis 4 : Leader	619,229.25	333,657.00	473,814.69	1,270,072.22	765,215.30	7,361,339.51
Total	13,833,401.02	1,259,852.56	2,705,884.56	12,603,150.76	13,759,996.52	294,706,665.22

V.2. (A): Risorse totali - Spesa FEASR liquidata a partire dall'inizio della programmazione:

V. 2. Historic of EAFRD payments by measure Q4 2006 to Q4 2013									
Rural Development Programme CCI n° : 2007IT06RPO002									
Measure / Axis	EAFRD contribution paid (€)								
	Q3 2007	Q4 2007	Q2 2008	Q3 2008	Q2 2009	Q3 2009	Q4 2009	Q1 2010	Q2 2010
111 - Vocational training and information actions	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,802.23	8,787.25	0.00	0.00
112 - Setting up of young farmers	8,800.00	0.00	0.00	1,105,500.00	213,400.00	1,086,800.00	85,162.00	0.00	150,416.00
115 - Setting up of management, relief and advisory serv	0.00	0.00	0.00	0.00	38,126.00	0.00	0.00	0.00	39,528.44
121 - Modernisation of agricultural holdings	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,036.90	137,829.72	0.00	550,633.45
122 - Improvement of the economic value of forests	5,688.77	0.00	36,757.78	2,909.38	403,651.25	207,377.34	241,174.30	3,259.92	-81.81
123 - Adding value to agricultural and forestry products	670,513.22	0.00	0.00	418,704.00	526,850.21	0.00	911,603.91	26,544.00	530,880.00
124 - Cooperation for development of new products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125 - Infrastructure related to the development and adap	659,861.95	474,979.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 - Information and promotion activities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Axis 1 : Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	1,344,995.94	474,979.77	36,757.78	1,527,113.38	1,182,027.47	2,036,016.47	1,384,557.18	29,803.92	1,271,376.08
211 - Natural handicap payments to farmers in mountain	4,729,463.16	24,138.36	4,413,742.37	1,361,175.72	4,254,895.82	1,875,519.57	6,194,273.65	167,363.69	40,937.25
214 - Agri-environment payments	7,762,017.30	178,364.30	49,521.96	6,122,796.91	6,048,580.51	2,150,359.00	3,970,545.24	460,821.94	68,348.77
226 - Restoring forestry potential and introducing preven	0.00	0.00	577,914.55	0.00	0.00	0.00	0.00	32,698.39	0.00
227 - Non-productive investments	6,409.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,023.45	0.00
Total Axis 2 : Improving the environment and the countryside	12,497,889.94	202,502.66	5,041,178.87	7,483,972.63	10,303,476.33	4,025,878.57	10,164,818.89	682,907.47	109,286.02
311 - Diversification into non-agricultural activities	0.00	0.00	0.00	0.00	446,476.80	149,149.00	31,680.00	198,413.60	63,008.00
313 - Encouragement of tourism activities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330.92	0.00
321 - Basic services for the economy and rural population	51,744.00	0.00	0.00	0.00	112,538.80	33,880.00	491,243.89	212,674.00	19,008.00
323 - Conservation and upgrading of the rural heritage	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Axis 3 : The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy	51,744.00	0.00	0.00	0.00	559,015.60	183,029.00	522,923.89	415,418.52	82,016.00
411 - Implementing local development strategies. Compe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 - Implementing local development strategies. Quality	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,616.81
431 - Running the local action group, acquiring skills and	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,680.00	0.00	0.00	0.00
Total Axis 4 : Leader	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,680.00	0.00	0.00	27,616.81
Total	13,894,629.88	677,482.43	5,077,936.66	9,011,086.01	12,044,519.40	6,309,604.04	12,072,299.96	1,128,129.91	1,490,294.91

V.2. (B): Risorsse totali - Spesa FEASR liquidata a partire dall'inizio della programmazione:

V. 2. Historic of EAFRD payments by measure Q4 2006 to Q4 2013									
Rural Development Programme CCI n° : 2007IT06RPO002									
Measure / Axis	EAFRD contribution paid (€)								
	Q3 2010	Q4 2010	Q1 2011	Q2 2011	Q3 2011	Q4 2011	Q1 2012	Q2 2012	Q3 2012
111 - Vocational training and information actions	17,097.54	24,605.49	24,513.45	0.00	33,459.32	0.00	15,432.01	0.00	8,411.24
112 - Setting up of young farmers	0.00	1,155,000.00	501,600.00	31,900.00	20,900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
115 - Setting up of management, relief and advisory serv	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 - Modernisation of agricultural holdings	195,145.75	0.00	1,633,017.42	577,660.00	383,127.87	558,576.58	607,628.70	633,345.70	179,975.36
122 - Improvement of the economic value of forests	463,360.92	7,062.16	0.10	809.60	63,741.30	0.00	0.00	0.00	0.00
123 - Adding value to agricultural and forestry products	3,113,888.02	2,370,346.00	35,076.80	368,995.62	170,367.49	0.00	0.00	1,219,790.00	490,334.01
124 - Cooperation for development of new products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125 - Infrastructure related to the development and adap	366,041.30	0.00	-0.01	587,963.20	188,496.00	436,716.61	0.00	118,528.44	-3,264.26
133 - Information and promotion activities	32,358.02	0.00	0.00	0.00	0.00	45,134.32	0.00	0.00	0.00
Total Axis 1 : Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	4,187,891.55	3,567,573.65	2,194,207.76	1,567,328.42	860,091.97	1,041,527.51	623,060.71	1,971,664.14	675,456.35
211 - Natural handicap payments to farmers in mountai	2,494,270.49	1,145,369.07	184,439.89	43,858.21	482,837.21	2,238.44	23,457.16	-104.55	0.00
214 - Agri-environment payments	3,247,140.70	4,916,516.77	427,909.48	1,913,059.65	970,129.18	5,708,127.41	745,506.71	2,540,151.55	19,090.26
226 - Restoring forestry potential and introducing preven	179,191.83	0.00	0.01	0.00	0.00	332,859.38	0.00	0.00	-26,090.50
227 - Non-productive investments	18,004.71	0.00	-0.02	0.00	0.00	7,722.26	0.00	0.00	22,374.78
Total Axis 2 : Improving the environment and the countryside	5,938,607.73	6,061,885.84	612,349.36	1,956,917.86	1,452,966.39	6,050,947.49	768,963.88	2,540,047.00	15,374.54
311 - Diversification into non-agricultural activities	205,957.40	0.00	353,852.40	118,272.00	256,612.36	45,372.80	198,737.08	29,568.00	157,932.06
313 - Encouragement of tourism activities	26,628.76	0.00	0.00	20,292.80	-20,292.80	114,180.66	0.00	0.00	-4,297.84
321 - Basic services for the economy and rural populatio	1,001,510.06	251,450.16	88,000.01	340,067.20	273,486.40	639,896.40	625,772.40	679,712.00	272,307.20
323 - Conservation and upgrading of the rural heritage	115,625.51	0.00	-0.01	0.00	0.00	95,148.72	0.00	0.00	-8,548.50
Total Axis 3 : The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy	1,349,721.74	251,450.16	441,852.40	478,632.00	509,805.96	894,598.58	824,509.48	709,280.00	417,392.92
411 - Implementing local development strategies. Compe	0.00	0.00	0.00	12,168.64	25,181.46	0.00	12,525.67	0.00	0.00
413 - Implementing local development strategies. Quality	0.00	65,947.20	0.00	105,575.47	167,877.60	328,646.07	221,242.56	45,800.62	293,023.98
431 - Running the local action group, acquiring skills and	95,257.72	14,295.60	41,624.00	0.00	63,958.40	44,000.00	43,912.00	42,548.00	0.00
Total Axis 4 : Leader	95,257.72	80,242.80	41,624.00	117,744.11	257,017.46	372,646.07	277,680.23	88,348.62	293,023.98
Total	11,571,478.73	9,961,152.45	3,290,033.52	4,120,622.39	3,079,881.78	8,359,719.64	2,494,214.31	5,309,339.76	1,401,247.79

V.2. (C): Risorsse totali - Spesa FEASR liquidata a partire dall'inizio della programmazione:

V. 2. Historic of EAFRD payments by measure Q4 2006 to Q4 2013						
Rural Development Programme CCI n° : 2007IT06RPO002						
Measure / Axis	EAFRD contribution paid (€)					Total
	Q4 2012	Q1 2013	Q2 2013	Q3 2013	Q4 2013	
111 - Vocational training and information actions	1,885.48	0.00	54,221.05	0.00	43,847.89	294,194.95
112 - Setting up of young farmers	-4,660.48	-535.49	-5,821.66	0.00	0.00	4,349,560.37
115 - Setting up of management, relief and advisory serv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,214.44
121 - Modernisation of agricultural holdings	0.00	0.00	86,339.29	17,994.43	204,452.50	6,445,763.67
122 - Improvement of the economic value of forests	330,675.63	0.00	16,096.07	0.00	0.00	1,782,482.73
123 - Adding value to agricultural and forestry products	256,424.67	0.00	0.00	1,504,331.73	169,944.90	12,784,594.57
124 - Cooperation for development of new products	0.00	0.00	0.00	239,710.25	0.00	239,710.25
125 - Infrastructure related to the development and adap	113,164.70	0.00	85,375.88	140,178.40	0.00	3,168,041.97
133 - Information and promotion activities	41,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,061.34
Total Axis 1 : Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	739,059.00	-535.49	236,210.63	1,902,214.81	418,245.29	29,271,624.29
211 - Natural handicap payments to farmers in mountai	-1,486.74	-3,781.89	-442.22	-290.84	0.00	27,431,873.81
214 - Agri-environment payments	4,945,826.25	257,413.57	550,530.01	2,496,594.81	5,411,283.07	60,960,635.36
226 - Restoring forestry potential and introducing preven	40,981.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,555.15
227 - Non-productive investments	0.00	0.00	0.00	15,039.82	0.00	91,574.46
Total Axis 2 : Improving the environment and the countryside	4,985,320.99	253,631.68	550,087.79	2,511,343.78	5,411,283.07	89,621,638.78
311 - Diversification into non-agricultural activities	14,080.00	0.00	139,304.00	81,481.40	80,960.00	2,570,856.90
313 - Encouragement of tourism activities	194,040.25	0.00	0.00	218,110.80	32,165.37	585,158.93
321 - Basic services for the economy and rural populatio	153,912.00	162,932.01	66,528.00	328,333.68	202,400.00	6,007,396.21
323 - Conservation and upgrading of the rural heritage	102,150.80	0.00	0.00	110,177.35	0.00	414,553.88
Total Axis 3 : The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy	464,183.06	162,932.01	205,832.00	738,103.23	315,525.37	9,577,965.91
411 - Implementing local development strategies. Compe	0.00	0.00	29,539.26	20,702.86	23,294.57	123,412.46
413 - Implementing local development strategies. Quality	272,460.87	115,473.60	178,939.20	462,281.42	271,600.16	2,556,485.55
431 - Running the local action group, acquiring skills and	0.00	31,335.48	0.00	75,847.50	41,800.00	559,258.70
Total Axis 4 : Leader	272,460.87	146,809.08	208,478.46	558,831.78	336,694.73	3,239,156.71
Total	6,461,023.91	562,837.28	1,200,608.89	5,710,493.59	6,481,748.46	131,710,385.70

V.3 Historic of Clearance of accounts

Rural Development Programme CCI n° : 2007IT06RPO002

Measure / Axis	Clearance of accounts (€)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
111 - Vocational training and information actions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
112 - Setting up of young farmers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 - Setting up of management, relief and advisory services	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 - Modernisation of agricultural holdings	0.00	0.00	0.00	0.02	-0.05	-0.01
122 - Improvement of the economic value of forests	0.00	-0.01	0.03	0.10	0.00	0.00
123 - Adding value to agricultural and forestry products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124 - Cooperation for development of new products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125 - Infrastructure related to the development and adaptation ...	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
132 - Participation of farmers in food quality schemes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 - Information and promotion activities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Axis 1 : Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector	0.00	-0.01	0.03	0.11	-0.05	-0.02
211 - Natural handicap payments to farmers in mountain areas	0.00	-0.20	-0.54	-0.06	0.05	-0.01
214 - Agri-environment payments	0.00	0.35	0.21	48.90	0.21	-0.33
226 - Restoring forestry potential and introducing prevention ...	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
227 - Non-productive investments	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00
Total Axis 2 : Improving the environment and the countryside	0.00	0.15	-0.33	48.83	0.26	-0.34
311 - Diversification into non-agricultural activities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313 - Encouragement of tourism activities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

V.3 Historic of Clearance of accounts

Rural Development Programme CCI n° : 2007IT06RPO002

Measure / Axis	Clearance of accounts (€)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
321 - Basic services for the economy and rural population	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
323 - Conservation and upgrading of the rural heritage	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
Total Axis 3 : The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - Implementing local development strategies. Competitiveness	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 - Implementing local development strategies. Quality of life	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421 - Implementing cooperation projects	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431 - Running the local action group, acquiring skills and ...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Axis 4 : Leader	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.14	-0.30	48.94	0.21	-0.36

9.2. Verbale della sesta riunione del Comitato di Sorveglianza del 7 giugno 2013 [APPROVATO]

Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Bolzano 2007-2013, ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 - Verbale della settima riunione del Comitato di Sorveglianza del 7 giugno 2013 (Sala riunioni II piano della Ripartizione Agricoltura, Via Brennero 6, Bolzano).

Presenti:

Fanni Keresztes (Commissione Europea), Paola Lionetti e Davide Liberati (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali), Albert Wurzer (Ripartizione Agricoltura) Martin Pazeller (Direttore della Ripartizione Agricoltura), Stefan Walder (Direttore della Ripartizione Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica), Eva Thaler (Ripartizione Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica), Werner Hintner (Direttore dell'Ufficio Proprietà Coltivatrice), Nikolaus Brunner (Ufficio Proprietà Coltivatrice), Claudio Sordini (Direttore dell'Ufficio Edilizia Rurale), Andreas Werth (Direttore dell'Ufficio Servizi Agrari), Albert Felderer (Ufficio Servizi Agrari), Matthias Zöschg (Direttore dell'Ufficio Economia Montana), Paul Zipperle (Ripartizione Foreste), Erich Kofler (Ufficio Zootecnica), Martin Stuppner (Ufficio Meccanizzazione agricola), Marco Dalnodar (Direttore dell'Organismo Pagatore Provinciale), Danilo Merz (Direttore della Federazione Coldiretti di Bolzano), Barbara Bertossi (Autorità ambientale, Agenzia per l'ambiente), Siegfried Rinner (Direttore del Südtiroler Bauernbund), Simone Wasserer (Consigliera per le pari opportunità), Jutta Staffler (Bioland), Francesco Beldì e Hermann Atz (IZI - Apollis), Joachim Hofmann (GAL Wipptal), Josef Günther Mair (GAL Val Sarentino), Hubert Ungerer (GAL Val d'Ultimo / Alta Val di Non / Val Martello), Filippo Chiozzotto e Luca Cesaro (INEA/Rete Rurale Nazionale), Paolo Fox, Andreas Kompatscher, Florian Thaler e Emanuela Zieger (Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura).

Ordine del giorno:

1. Saluto di benvenuto ed apertura dei lavori
2. Approvazione del Rapporto Annuale di Esecuzione per l'anno 2012
3. Valutazione delle problematiche relative al completamento del Programma (2013 – 2015)
4. Tasso d'errore nella politica dello Sviluppo Rurale: problematiche emerse per il PSR della Provincia Autonoma di Bolzano ed attività svolte per la sua riduzione
5. La nuova programmazione dello Sviluppo Rurale per il periodo 2014 – 2020:
 - a. Attività in corso di svolgimento da parte dell'Autorità di Gestione, tempistica della presentazione del nuovo PSR;
 - b. Attività in corso di svolgimento da parte della Società incaricata per la Valutazione ex-ante e per la VAS;
 - c. Discussione sulle tematiche ritenute centrali dalla Commissione Europea e dalla Provincia Autonoma di Bolzano
6. Varie ed eventuali.

1. Saluto di benvenuto ed apertura dei lavori:

Il dott. Wurzer alle ore 9.30 saluta i presenti, li ringrazia per la partecipazione ed apre la riunione presentando il primo punto all'ordine del giorno.

2. Approvazione del Rapporto Annuale di Esecuzione per l'anno 2012

Dopo un breve cenno alle condizioni socioeconomiche che hanno caratterizzato l'anno 2012, viene presentata al comitato di sorveglianza dalla dott.ssa Zieger una sintesi dello stato d'avanzamento e dell'esecuzione finanziaria del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Bolzano.

La spesa pubblica complessiva sostenuta durante l'anno appena trascorso, comprendente sia le risorse ordinarie che le risorse Health Check, ammonta a circa 34,06 milioni di €. I versamenti cumulativi 2007 – 2012 raggiungono i 262.980.798 € e portano il tasso di realizzazione del programma al 79,64% delle previsioni. Si sottolinea come questi dati si riferiscano a spese effettivamente sostenute dall'Amministrazione provinciale e non tengano conto dell'anticipo comunitario pari a circa 9,6 milioni di €. Viene mostrata anche la spesa TOP-UP relativa alle misure 112, 211 e 214 – intervento 7: i fondi provinciali utilizzati rimangono entro il limite approvato nel Programma.

Viene illustrato per ciascun asse un dettaglio dell'avanzamento finanziario delle singole misure. Nell'ambito dell'asse 1 risultano in pratica già esaurite le risorse assegnate alle misure che sostengono l'insediamento dei giovani agricoltori (misura 112), l'avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza per le aziende agricole e forestali (misura 115) e l'accrescimento del valore economico delle foreste (misura 122). Le altre misure dell'asse evidenziano un tasso di realizzazione finanziaria più contenuto.

Nell'ambito dell'asse 2 non si rilevano particolari criticità per le misure relative all'indennità compensativa (tasso di realizzazione pari al 99,96%), ai premi agro-ambientali (tasso di realizzazione pari al 81,05%) e alla ricostituzione del potenziale forestale e agli interventi protettivi (tasso di realizzazione pari al 99,74%). La misura che prevede il finanziamento di progetti di rivitalizzazione e ripristino di castagneti degradati evidenzia una percentuale d'avanzamento pari al 33,39%.

Delle 4 misure (misura 311, misura 313, misura 321, misura 323) previste nell'ambito del terzo asse del programma solo quella relativa all'incentivazione delle attività turistiche mediante la valorizzazione della funzione ricreativa del bosco mostra un tasso di realizzazione inferiore al 50% delle previsioni.

L'asse LEADER, con una percentuale d'avanzamento pari solamente al 28,75%, accusa un notevole ritardo nell'attuazione. Nonostante siano stati rimodulati i piani di finanziamento dei Piani di Sviluppo Locale, al fine di rendere più efficace ed efficiente l'utilizzo delle risorse stanziare, siano stati approvati dai Gruppi d'Azione Locale 159 progetti, di cui 122 risultano in corso di realizzazione o terminati, per una spesa complessiva delegata pari a circa 14 milioni di Euro (89,16% dei fondi assegnati all'asse 4), la spesa non sembra evidenziare quell'accelerazione necessaria per completare il programma LEADER entro il 2015.

In seguito, viene presentato l'andamento del PSR rispetto alla regola del disimpegno automatico (n+2): anche nel corso del 2012, se si considera la spesa dichiarata nel quarto trimestre 2012, è stato possibile raggiungere l'obiettivo di una spesa pubblica uguale almeno alla quota comunitaria impegnata per l'anno in questione (22,132 milioni di €).

3. Valutazione delle problematiche relative al completamento del Programma (2013 – 2015)

Il dott. Fox illustra ai membri del comitato dettagliate elaborazioni inerenti la fase di chiusura del programma. Vengono mostrati per ciascuna misura un aggiornamento dell'avanzamento della spesa al 16 maggio 2013 e una stima dell'utilizzo della restante quota comunitaria nelle annualità 2013, 2014 e 2015.

Complessivamente la spesa pubblica da rendicontare entro il 2015 ammonta a 63.455.637,97 € (19,2% del totale delle risorse assegnate al PSR), corrispondente ad una quota comunitaria pari a 28.780.170,38 €.

Se si distinguono le misure strutturali dalle misure a superficie, la percentuale di spesa pubblica residua ammonta rispettivamente al 30,5% e al 12,3% dei fondi previsti. Nell'ambito delle risorse assegnate agli investimenti e non ancora utilizzate circa 31, 8 milioni di € sono riconducibili a misure "standard", per le quali non si ravvisano particolari difficoltà d'implementazione. I rimanenti 6,4 milioni di € si riferiscono a misure caratterizzate da un maggior grado di particolarità.

Stimando una spesa pari al 10% della dotazione complessiva del PSR nell'anno 2013, una spesa pari al 6,2% nel 2014 e del 4,2 % nel 2015, percentuali queste compatibili con il trend storico di spesa evidenziato fino ad oggi, si dovrebbe giungere ad un completo utilizzo delle risorse finanziarie.

Insieme ai responsabili delle misure vengono valutate eventuali problematiche relative al completamento del programma, in particolare per le misure per le quali si rileva un ridotto tasso d'esecuzione

Riguardo la misura 111, che evidenzia una spesa pubblica residua pari al 59,3% dei fondi assegnati, la dott.ssa Thaler riferisce che le risorse messe a bando sono state completamente impegnate: dei 24 progetti approvati, uno è stato ritirato, 12 risultano liquidati, 6 sono in fase di chiusura, 5 termineranno nel 2014.

I progetti LEADER inerenti questa misura risultano essere 10, di cui 7 già liquidati, 1 in corso di ultimazione, 2 chiuderanno alla fine del 2013. Il dott. Zipperle, responsabile dell'attuazione della misura in ambito forestale, informa che sono stati approvati 21 progetti, dei quali uno è stato ritirato. Entro la fine dell'anno saranno approvate altre 3 domande d'aiuto, in questo modo i fondi risulteranno interamente impegnati.

Le misure 112 e 115 hanno esaurito la dotazione finanziaria.

Il dott. Sordini conferma l'andamento molto positivo della misura 121, per la quale è rimasto solo un piccolo importo da impegnare: non si intravedono difficoltà relative alla chiusura. La misura 125 prevede la realizzazione di due progetti di grandi dimensioni inerenti il miglioramento e la creazione di infrastrutture irrigue a livello interaziendale. In seguito all'espletamento delle gare d'appalto per l'affidamento dei lavori si sono registrati dei ribassi

che consentiranno di liberare ulteriori risorse da destinare ad un terzo progetto. Anche in questo caso si prevede un completo utilizzo dei fondi entro il 2015.

Il dott. Zöschg non rileva particolari criticità in merito all'attuazione degli interventi forestali previsti dall'asse 1: le risorse risultano completamente utilizzate per le misure 122, 123 e 125. Sono in corso di realizzazione anche tre progetti relativi alla misura 124, per la quale non si registrano ancora pagamenti. È in fase di conclusione, inoltre, un progetto di competenza della Ripartizione Agricoltura relativo a tale misura.

Riguardo la misura 133 il dott. Kofler riferisce che, benché la percentuale d'avanzamento risulti bassa, sono state approvati tre progetti la cui realizzazione procede regolarmente; è prevista una conclusione positiva della misura entro il 2015.

Nell'ambito dell'asse 2 le misure 211 e 226 risultano terminate; con il pagamento del saldo della campagna 2012 dei premi agroambientali e della domande della campagna 2013 anche la misura 214 si dovrebbe concludere regolarmente. La misura 227, che promuove il finanziamento di progetti di ridotte dimensioni finanziarie volti alla rivitalizzazione dei castagneti, vede risorse disponibili per un importo di circa 340.000 €, che difficilmente potranno essere impegnate entro il 2013. A tal proposito, il dott. Fox segnala l'intenzione della Provincia di rifinanziare la misura 115, al fine di garantire il sostegno all'avvio di un nuovo servizio di consulenza per la montagna. Potrebbe rendersi pertanto necessaria un'ulteriore modifica finanziaria con cui assegnare nuove risorse alla misura 115 trasferendole da altre misure per le quali le attività si sono di fatto concluse.

Le misure dell'asse 3 non evidenziano particolari criticità: i fondi sono stati completamente impegnati ed i progetti risultano in corso di realizzazione. Il ridotto tasso d'esecuzione è riconducibile esclusivamente ad un ritardo nella fase di rendicontazione.

L'attuazione dell'asse LEADER viene commentata dai coordinatori dei Gruppi d'Azione Locale presenti, che illustrano l'andamento dei rispettivi Piani di Sviluppo Locale. Viene confermato che i fondi risultano quasi completamente impegnati e che entro il 2013 verranno delegati gli ultimi progetti in modo da utilizzare le risorse residuali ancora disponibili. Il tasso di esecuzione finanziaria dovrebbe subire un'importante accelerazione nei prossimi mesi: considerato il numero di progetti terminati o in fase di ultimazione e le domande di liquidazione che potranno essere presentate entro la fine dell'anno, viene stimato un incremento della spesa pubblica rendicontata fino al 60% dei fondi assegnati.

Da parte dei coordinatori del GAL Val d'Ultimo, Alta Val di Non e Martello e del GAL Wipptal viene sottolineato che parte del ritardo nell'avanzamento della spesa dell'asse LEADER è dovuto alle incertezze sorte in merito alla natura giuridica delle Cooperative per lo Sviluppo Regionale e dal conseguente blocco dei pagamenti a favore delle stesse. I coordinatori auspicano una rapida soluzione della problematica per poter consentire la necessaria accelerazione della spesa.

A conclusione della presentazione dell'avanzamento del Programma e della discussione relativa alla sua conclusione, su richiesta del dott. Wurzer i membri del Comitato approvano all'unanimità il Rapporto Annuale di Esecuzione 2012.

Il buon andamento del Programma viene confermato anche dal dott. Beldi: il PSR della Provincia di Bolzano risulta essere efficace ed efficiente nel perseguire i propri obiettivi, integrandosi con le altre misure di politica agricola provinciale, oltre che con le linee nazionali ed europee ed indirizzando verso un'agricoltura sostenibile. Vengono illustrati i risultati di alcuni casi di studio condotti, che possono essere considerati "buone prassi" e fungere da indirizzo nella definizione delle strategie da seguire per la programmazione dello sviluppo rurale nel periodo 2014 – 2020.

4. Tasso d'errore nella politica dello Sviluppo Rurale: problematiche emerse per il PSR della Provincia Autonoma di Bolzano ed attività svolte per la sua riduzione

Il dott. Fox ricorda brevemente che, nell'ambito dell'attività annuale di Audit relativa alle dichiarazioni di affidabilità per l'anno finanziario 2012 (spese FEASR), nel mese di settembre del 2012 l'Amministrazione provinciale è stata oggetto di controllo DAS da parte dei Servizi della Corte dei Conti Europea. Il controllo ha evidenziato alcune problematiche, che hanno richiesto da parte dell'Autorità di Gestione l'adozione di alcune misure correttive, ma soprattutto preventive, al fine di superare le criticità emerse, migliorando alcune procedure interne nella gestione delle misure del PSR.

Un ulteriore spunto di riflessione riguarda la fattibilità concreta del raggiungimento degli obiettivi di qualità comunitari prefissati per lo Sviluppo Rurale: un tasso di errore massimo del 2% potrebbe essere raggiunto solamente per misure informatizzate e relativamente semplici come la Domanda Unica del primo pilastro della PAC. Questo obiettivo appare estremamente difficile da raggiungere per le misure non a superficie del secondo pilastro.

La dott.ssa Keresztes presenta un contributo relativamente a questo punto all'ordine del giorno. Il tasso d'errore è un indicatore della qualità della programmazione, che incide sulla credibilità della PAC in generale e della politica per lo sviluppo rurale in particolare.

La Commissione Europea esprime preoccupazione in merito all'elevato tasso di errore, superiore al 2%, riscontrato dalla Corte dei Conti Europea. Tassi di errore elevati determinano una minore efficacia del programma. Viene sottolineato come esistano due tassi d'errore. Il primo è calcolato dalla DG AGRI sulla base dei dati trasmessi dagli Stati Membri relativi ai controlli effettuati a livello nazionale/regionale e pubblicato nella Relazione annuale di attività, il secondo è stimato dalla Corte dei Conti Europea sulla base delle DAS (nazionali/regionali) e divulgato nel Rapporto annuale.

Viene rilevato come la differenza tra i due tassi sia notevole: mentre il tasso di errore calcolato dalla DG AGRI rientra nel limite di tolleranza ritenuto accettabile del 2%, il tasso di errore calcolato dalla Corte dei Conti Europea risulta molto superiore a questo margine di tolleranza (7,7% per lo sviluppo rurale). Viene riportata una sintesi delle principali cause d'errore identificate e delle contromisure volte ad una sua riduzione, contromisure che devono essere esplicitate in specifici piani d'azione predisposti per ciascun PSR.

Il dott. Liberati riferisce che per lo sviluppo rurale a livello nazionale non sussistono rischi, in quanto complessivamente il tasso d'errore rilevato è inferiore al 2%. È stato, inoltre, implementato un database con i risultati di tutti i controlli e audit effettuati. Sono in corso di elaborazione linee guida nazionali in merito alle procedure dei controlli al fine di armonizzare il sistema. È stato anche istituito un gruppo di lavoro, che dovrà definire per la

prossima programmazione gli impegni relativi alle misure agroambientali sulla base dell'effettiva controllabilità.

5. La nuova programmazione dello Sviluppo Rurale per il periodo 2014 – 2020

Il dott. Kompatscher, dopo aver riferito sui tempi di approvazione e pubblicazione dei nuovi Regolamenti, riepiloga le attività in corso di svolgimento da parte dell'Autorità di Gestione e la tempistica prevista per la presentazione del nuovo Programma di Sviluppo Rurale della Provincia di Bolzano.

È stata predisposta e condivisa con il partenariato durante un primo incontro avvenuto il 22 marzo 2013 l'analisi SWOT, nella quale sono stati evidenziati i fabbisogni provinciali, declinati in seguito nelle diverse priorità e focus area stabilite dall'Unione Europea al fine di individuare una selezione delle possibili misure del nuovo programma. Il risultato finale di questo lavoro di analisi è una strategia territoriale in grado di soddisfare contemporaneamente i bisogni del territorio ed essere pienamente coerente con gli obiettivi comunitari. Tutta la documentazione utile è stata resa disponibile on-line sulla home-page della ripartizione Agricoltura.

Attualmente sono in corso di elaborazione le schede relative alle misure che si intendono attivare nel periodo 2014 – 2020, che verranno presentate il 25 giugno al secondo incontro del partenariato.

Le procedure ed il piano degli indicatori verranno definiti a partire dalla tarda estate, inizio autunno.

Nel periodo autunnale è previsto il terzo ed ultimo incontro con il partenariato, durante il quale verrà presentato il nuovo testo del Programma di Sviluppo Rurale, avendo cura di porre particolare attenzione agli aspetti procedurali ed organizzativi.

A fine dello scorso anno sono stati affidati gli incarichi esterni per l'elaborazione della valutazione ex-ante, della valutazione ambientale strategica e della giustificazione economica dei premi a superficie. Le attività sono in corso di svolgimento, termineranno entro novembre 2013 e i rispettivi documenti verranno presentati in occasione dell'ultimo incontro con il partenariato.

In merito alla giustificazione economica dei pagamenti nello sviluppo rurale, il dott. Cesaro (INEA) elenca i riferimenti normativi ed i documenti tecnici disponibili a livello comunitario e nazionale.

Vengono accennati i nuovi elementi che contraddistinguono la futura programmazione, come a titolo d'esempio l'introduzione del greening nella baseline. La metodologia di calcolo dovrà individuare gli impegni stringenti rispetto alla baseline che influenzano i costi ed i ricavi. Una criticità è rappresentata dalla mancata definizione allo stato attuale di alcune parti della baseline.

È in corso una prima ricognizione e valutazione delle fonti informative, in particolare in questo momento dei dati RICA relativi al periodo 2008 - 2011.

Per il PSR di Bolzano sono state acquisite anche le schede di misura in bozza relative a biologico, indennità compensativa e premi agro-climatico-ambientali, che sono in corso di valutazione. Nell'ambito delle colture foraggere si sta effettuando un confronto tra le aziende aderenti agli impegni a superficie e quelle non aderenti.

Il dott. Fox risponde ad una serie di quesiti di interesse della Commissione riguardo le attività in corso di svolgimento e previste da parte dell'Amministrazione provinciale per la programmazione 2014 – 2020.

In particolare, viene riferito che sussiste un pieno coinvolgimento della Provincia di Bolzano nelle attività preparatorie condotte a livello nazionale per la futura politica agricola, attuato mediante un regolare invio di documenti e puntuali riunioni organizzate dal Ministero.

Esiste, inoltre, uno scambio di informazioni tra Ripartizioni provinciali che si occupano di FESR e FSE e l'Autorità di Gestione responsabile del FEASR.

I punti riguardanti sia le modalità con le quali la Provincia sta assicurando il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei partners/stakeholders nelle attività di preparazione per il Programma di Sviluppo Rurale, sia lo stato d'avanzamento dell'analisi SWOT, della Valutazione ex ante e della Valutazione Ambientale Strategica sono stati trattati nei precedenti interventi.

In merito alla verifica del rispetto della condizionalità ex-ante, viene rilevato che per gran parte essa avviene a livello nazionale; alle Regioni finora sono state richieste specifiche verifiche in particolare sulla capacità di consulenza e sull'accesso agli aiuti in ambito FEASR.

La Provincia si sta preparando per assicurare un'adeguata capacità amministrativa per la gestione dei fondi ESI 2014-2020 prevedendo un accorpamento della gestione delle misure ed una riduzione del loro numero, ridefinendo le regole procedurali comuni per più ambiti di programma ora separati, collaborando maggiormente con l'Organismo Pagatore fin dalla verifica della controllabilità delle misure. Sarà prevista l'attivazione della misura di assistenza tecnica per supportare le attività dell'Autorità di Gestione.

In ambito informatico sono previsti:

- un nuovo sistema di gestione delle domande a superficie: ABACO;
- un nuovo sistema di gestione dei fascicoli aziendali e delle relative superfici;
- l'utilizzo del sistema di monitoraggio AGEA/IGRUE attualmente in fase di implementazione;
- la realizzazione di un nuovo rilievo delle superfici agricole da parte del Corpo Forestale provinciale.

La Provincia non intende inserire nella proposta di PSR 2014-2020 sottoprogrammi tematici, in quanto la dimensione provinciale è troppo ridotta per poter prevedere anche uno specifico sottoprogramma. In aggiunta, il territorio provinciale coincide quasi completamente con quello di montagna. Si sottolinea come gli aiuti FEASR siano da sempre erogati per circa il 95% in zone di montagna.

Riguardo la possibilità di proporre per il periodo 2014-2020 forme di sostegno pluri-fondo (FEASR + altri fondi ESI) allo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD - LEADER), la questione è in corso di analisi e la decisione sarà presa in funzione delle necessità che emergeranno in partenariato da parte dei Gruppi d'Azione Locale.

Non è intenzione della Provincia inserire gli strumenti finanziari nella proposta di PSR 2014-2020.

La presentazione alla Commissione Europea della prima bozza di PSR 2014-2020 dovrebbe avvenire entro il tardo autunno al più tardi entro la fine del 2013, a meno che non avvenga uno slittamento della pubblicazione del testo dei nuovi Regolamenti all'autunno 2013.

In riferimento agli interventi per le aree interne, si evidenzia come per la Provincia di Bolzano le aree interne siano rappresentate dalle aree rurali di tipo D. Su queste aree di montagna il sostegno viene garantito fin dal PSR 2000-2006 e prima ancora con i Programmi Operativi settoriali. Inoltre, per le zone interne più difficili dal 1991 sono state attivate le Iniziative Comunitarie LEADER 1, 2, LEADER + e dal 2007 l'asse 4 del PSR. Le tematiche delle aree interne potranno trovare una realizzazione nell'ambito dello sviluppo locale di tipo partecipativo (LEADER).

In conclusione, vengono trattati alcuni argomenti di interesse dell'Autorità di Gestione riguardo le regole per la transizione, la reale tempistica di approvazione dei nuovi Regolamenti, i tempi di implementazione di SFC 2014 necessario per l'inserimento in rete del nuovo PSR, la possibilità di utilizzo di una procedura a sportello aperto che includa anche la valutazione di criteri di selezione.

6. Varie ed eventuali:

Non vengono proposti ulteriori argomenti. Il Dr. Wurzer alle ore 13 conclude la seduta ringraziando i membri del Comitato di Sorveglianza per l'attiva partecipazione.

LA VERBALIZZANTE

Dr. Emanuela Zieger

Bolzano, 13 giugno 2013

9.2.a Approvazione della decima proposta di modifica del PSR da parte della Commissione Europea (revisione del piano finanziario per asse, distinzione per quanto riguarda il FEASR tra tasso di partecipazione medio indicativo e tasso applicabile per i pagamenti).

Ref. Ares(2013)3461330 - 12/11/2013



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE

Direttore generale

Bruxelles,
FK:cp (2013) 3701422

Oggetto: Programma di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Bolzano 2007-2013
Accettazione della proposta di modifica del 28.6.2013

Egregio dott. Pazeller,

Con la presente si fa seguito alla proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Bolzano per il periodo 2007-2013 che è stata comunicata via SFC il 28 giugno 2013. Tale proposta riguarda modifiche comunicate conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1974/2006, che saranno approvate con decisione della Commissione, e modifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1974/2006, oggetto della presente lettera.

Le modifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1974/2006 riguardano:

- La revisione del piano finanziario per asse;
- alcune integrazioni specifiche necessarie alla migliore applicazione del programma.

I servizi della Commissione hanno valutato le modifiche proposte, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1974/2006. A seguito di tale esame, i servizi della Commissione ritengono che la modifica notificata sia coerente con il Piano Strategico Nazionale e conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) 1698/2005 e del regolamento (CE) n. 1974/2006. Pertanto, la proposta di modifica è accettata.

E' gradita l'occasione per porgere distinti saluti.



Jerzy PLEWA

Dott. Martin Pazeller
Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione 31 Agricoltura
Via Brennero 6
39100 Bolzano
ITALIA

e, p.c. Dott. Giuseppe BLASI
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali
Direzione Generale delle Politiche Strutturali
Via XX Settembre, 20
I – 00187 Roma

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 28.10.2013

che approva la revisione del programma di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Bolzano per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione C(2007) 4153 recante approvazione del programma di sviluppo rurale

CCI 2007 IT 06 RPO 002

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)¹, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)², in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) In data 12 settembre 2007 la Commissione ha adottato la decisione C(2007) 4153 recante approvazione del programma di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Bolzano per il periodo di programmazione 2007-2013.
- (2) Il 28 giugno 2013 le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione una domanda di revisione del programma di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Bolzano a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1974/2006.
- (3) Detta revisione modifica i tassi di cofinanziamento comunitario di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1698/2005, fissati nel programma di sviluppo rurale approvato. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1974/2006, la Commissione deve adottare una decisione in merito a tale revisione.
- (4) Le autorità italiane hanno debitamente motivato la proposta di modifica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1974/2006.

- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la revisione del programma di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Bolzano, la cui versione definitiva è stata trasmessa alla Commissione il 9 luglio 2013.

Articolo 2

L'articolo 2 della decisione C(2007) 4153 è sostituito dal testo seguente: "La spesa pubblica stimata occasionata dall'attuazione del programma di sviluppo rurale ammonta a 330.192.026 EUR per l'insieme del periodo e il contributo massimo del FEASR è fissato a 148.205.000 EUR; il piano di finanziamento figura nell'allegato".

Articolo 3

L'allegato alla presente decisione sostituisce l'allegato 1 della decisione C(2007) 4153.

Articolo 4

Le nuove spese introdotte all'atto della revisione del programma sono ammissibili a decorrere dal 28 giugno 2013.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28.10.2013

Per la Commissione
Dacian CIOLOŞ
Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME
 Per la Segretaria generale,

Jordi AYET PUIGARNAU
 Direttore della cancelleria
 COMMISSIONE EUROPEA

ALLEGATO

"ALLEGATO I

Piano di finanziamento

Tabella I: Contributo annuo del FEASR (in EUR)

Totale FEASR Anno	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale 2007-2013
Tipi di regione								
Regioni fuori convergenza	20.170.000	20.051.000	19.533.000	19.843.000	19.675.000	19.587.000	18.532.000	137.391.000
Fondi addizionali di cui all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005 – per le regioni fuori convergenza	0	0	940.000	2.188.000	1.951.000	2.545.000	3.190.000	10.814.000
Totale	20.170.000	20.051.000	20.473.000	22.031.000	21.626.000	22.132.000	21.722.000	148.205.000

Tabella II: Piano finanziario per asse (in EUR per la totalità del periodo)

Provincia Autonoma di Bolzano: fuori convergenza				
Asse	Partecipazione pubblica			
	Totale stimato settore pubblico 2007-2013 (1)	Tasso di partecipazione FEASR (%)		Importo del FEASR 2007-2013
		Medio indicativo per l'insieme del periodo	Applicabile per il calcolo dei pagamenti FEASR (2)	
Asse 1	74.902.320	44,05	44,00	32.993.678
Asse 2	193.802.400	44,00	44,00	85.273.007
Asse 3	27.748.329	44,00	44,00	12.209.265
Asse 4	15.715.643	44,00	44,00	6.915.050
Assistenza tecnica	0	0	44,00	0
Totale	312.168.692	44,01	44,00	137.391.000
Stanzamenti supplementari in virtù dell'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005 – Regione non convergenza				
Asse	Partecipazione pubblica			
	Totale stimato settore pubblico 2007-2013 (1)	Tasso di partecipazione FEASR (%)		Importo del FEASR 2007-2013
		Medio indicativo per l'insieme del periodo	Applicabile per il calcolo dei pagamenti FEASR	
Asse 1	4.166.667	60,00	60,00	2.500.000
Asse 2	13.856.667	60,00	60,00	8.314.000
Asse 3	0	60,00	60,00	0
Asse 4	0	0	0	0
Assistenza tecnica	0	0	0	0
Totale	18.023.334	60,00		10.814.000

(1) Importi in euro stimati dallo Stato membro per l'insieme del periodo.

(2) Tassi di cofinanziamento conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005. "

9.3. Relazione annuale di valutazione in itinere

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

RIPARTIZIONE AGRICOLTURA

AUTONOME PROVINZ BOZEN – SÜDTIROL

ABTEILUNG LANDWIRTSCHAFT

**VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA PROVINCIALE DI SVILUPPO
RURALE 2007-2013**

**BEWERTUNG DES LÄNDLICHEN ENTWICKLUNGSPLANS 2007-
2013**

**RELAZIONE ANNUALE DI VALUTAZIONE IN ITINERE
JAHRESBERICHT ZUR ZWISCHENBEWERTUNG**

ANNO 2013

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE / AD-HOC UNTERNEHMENSKONSORTIUM

IZI METODI, ANALISI E VALUTAZIONI ECONOMICHE SPA, ROMA

APOLLIS RICERCHE SOCIALI E DEMOSCOPIA SNC, BOLZANO - INSTITUT FÜR SOZIALFORSCHUNG UND DEMOSKOPIE OHG, BOZEN

Indice

1	Introduzione.....	320
2	La strategia del Programma.....	321
2.1	Gli obiettivi del PSR	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.2	Le risorse programmate	Errore. Il segnalibro non è definito.
3	Attuazione del PSR al maggio 2013	325
3.1	Avanzamento finanziario	Errore. Il segnalibro non è definito.
3.2	Benchmark di attuazione finanziaria dei PSR a livello nazionale	
3.3	I risultati raggiunti dal Programma	Errore. Il segnalibro non è definito.
4	Nota sul sistema degli indicatori	332

1. Introduzione

Il presente rapporto costituisce la **Relazione annuale di valutazione in itinere** del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Bolzano ed è stato predisposto nell'ambito del servizio affidato dalla Provincia Autonoma di Bolzano alla Associazione Temporanea di Imprese (ATI) formata dalle società IZI Metodi, analisi e valutazioni economiche Spa di Roma e APOLLIS Ricerche Sociali e demoscopia di Bolzano.

L'obiettivo del rapporto è quello fornire all'AdG, e ai soggetti interessati dall'attuazione del Programma, informazioni e valutazioni in merito ai risultati ottenuti attraverso l'attuazione del Programma, la loro importanza e la loro coerenza con il documento di programmazione di sviluppo rurale, nonché la loro rispondenza agli obiettivi prefissati. Il documento costituisce anche l'occasione per presentare le attività valutative relative alla valutazione ex post che entrerà nel vivo a partire dal 2015.

La contemporaneità della definizione del nuovo Programma per il periodo 2014-2020 con le fasi finali del PSR 2007-2013, e la corrispondenza tra valutatore in itinere 2007-2013 e valutatore ex ante 2014-2020, ha fatto sì che, nel corso del 2013 e dei primi mesi del 2014, il valutatore mettesse a sistema la propria esperienza conoscitiva (che può considerarsi decennale) in modo da fornire all'AdG gli strumenti utili per indirizzare al meglio le nuove azioni del PSR e, nello stesso tempo, fornisse analisi e valutazioni in merito ai risultati raggiunti con l'attuale programma.

Contenuti del documento

Il rapporto è strutturato in 4 capitoli, compreso il presente capitolo di premessa.

- Nei capitoli 2 e 3 si riporta una breve analisi e descrizione della strategia del programma e dell'attuazione dello stesso.
- Nel capitolo 4 si riporta una nota predisposta per l'AdG sul sistema degli indicatori di programma con riferimento ad alcune misure.

2. La strategia del programma

Nel presente capitolo si riporta, per completezza di analisi, una sintesi della strategia del PSR 2007-2013 della Provincia Autonoma di Bolzano in termini di obiettivi fissati e risorse programmate.

L'analisi viene qui riproposta con un confronto diretto con il nuovo programma attualmente in fase di predisposizione.

2.1 Gli obiettivi del PSR

La Provincia Autonoma di Bolzano, in coerenza con le indicazioni comunitarie, la realtà economica e sociale delle zone rurali di riferimento, e in linea con la precedente programmazione, pone come obiettivo alla base del Programma di Sviluppo il **mantenimento della vitalità e della competitività dell'ambiente rurale** associato ad un secondo obiettivo relativo ad un **utilizzo sostenibile del territorio** al fine di ottimizzarne le potenzialità. I due obiettivi, in ultima analisi, sono finalizzati a **contrastare lo spopolamento delle zone rurali** anche attraverso la prevenzione dell'abbandono delle superfici.

Il PSR è articolato in tre Assi cui si aggiunge l'Asse IV - Leader, trasversale al programma:

- Asse I – Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale
- Asse II – Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale
- Asse III – Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale
- Asse IV - Leader

Nello schema seguente si riporta la struttura del Programma con l'individuazione degli obiettivi generali e specifici a livello di Asse.

Schema 2.1.1.I – Obiettivi generali e specifici a livello di Asse del PSR della Provincia Autonoma di Bolzano

Asse		Obiettivi generali		Obiettivi prioritari
Asse I –Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale	⇒	Accrescere la competitività del sistema agricolo - forestale e agroalimentare	⇒	Promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione delle imprese e dell'integrazione delle filiere
				Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale
				Potenziamento delle dotazioni infrastrutturali fisiche e telematiche
				Miglioramento della capacità imprenditoriale e professionale degli addetti al settore agricolo-forestale e sostegno del ricambio generazionale
Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale	⇒	Tutela dell'ambiente e della biodiversità, del paesaggio, del territorio montano e del suo equilibrio idrogeologico e riduzione dei gas serra	⇒	Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione dei sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico
				Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde
				Riduzione dei gas serra
				Tutela del territorio
Asse III – Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale	⇒	Contrasto allo spopolamento delle zone rurali	⇒	Miglioramento dell'attrattività dei territori rurali per le imprese e la popolazione
				Mantenimento e/o creazione di opportunità occupazionali e di reddito in aree rurali
Asse IV - Leader	⇒	Miglioramento della governance locale	⇒	Rafforzamento della capacità progettuale e gestionale locale
				Valorizzazione delle risorse endogene dei territori

Dallo schema è evidente come il raggiungimento dell'obiettivo generale del PSR, *mantenimento della vitalità e della competitività dell'ambiente rurale*, si consegue attraverso tre obiettivi specifici, che, seguendo l'articolazione del Programma, corrispondono agli obiettivi globali dei tre Assi principali, cui si aggiunge l'obiettivo trasversale di Leader:

- miglioramento della competitività nel settore agricolo e forestale;
- miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale;
- qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale.

In un'ottica di concentrazione delle risorse e con l'obiettivo di raggiungere una massa critica adeguata, soprattutto per quegli interventi attuati a livello locale, la Provincia Autonoma di Bolzano ha individuato le Misure da attuare tramite il PSR dando una priorità (peso finanziario) diversa agli interventi. Le Misure possono essere infatti suddivise in due gruppi:

- quelle **prioritarie** ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del PSR, e che comunque risultano molto appetibili a livello di potenziali beneficiari;
- misure **residuali** che, anche se non prioritarie e poco attraenti per i potenziali beneficiari, possono comunque generare effetti positivi sullo sviluppo rurale se associate ad altre misure prioritarie.

Rimane esclusa da tali gruppi la misura 214, agroambiente, che da sola assorbe circa il 42% delle risorse totali del Programma coerentemente con l'obiettivo generale del Piano di **mantenere una comunità rurale vitale** in un'ottica di sviluppo sostenibile.

PSR 2014 / 2020 – Elementi di valutazione ex ante

Il Piano di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Bolzano per il periodo 2014-2020, coerentemente con le priorità dello sviluppo rurale stabilite a livello comunitario e, pertanto, con gli obiettivi EU 2020, è costruito intorno a tre obiettivi prioritari:

- contribuire all'incremento della competitività dei settori agricolo, forestale e agroalimentare;
- contribuire allo sviluppo dei settori agricolo, forestale ed agroalimentare più equilibrato dal punto di vista della distribuzione territoriale e più sostenibile dal punto di vista ambientale e climatico;
- contribuire alla crescita economica e sociale delle zone rurali provinciali.

Gli obiettivi così individuati si pongono in continuità con l'attuale periodo di programmazione con particolare riferimento all'individuazione di una strategia volta a mantenere la vitalità e la competitività dell'ambiente rurale e ad un utilizzo sostenibile del territorio, al fine di ottimizzarne le potenzialità.

Inoltre, anche il nuovo programma individua misure "prioritarie" rispetto al raggiungimento della strategia e misure che possono definirsi "complementari", cui saranno assegnate risorse inferiori, ma che comunque concorrono al raggiungimento degli obiettivi di programma.

2.2 Le risorse programmate

Il PSR della Provincia Autonoma di Bolzano approvato originariamente prevedeva un investimento complessivo di 312,67 Meuro e l'attivazione di 19 misure a valere sui tre assi portanti, cui si aggiungono le misure attivate nell'ambito dell'asse quattro Leader.

Nei 7 anni di attuazione la Provincia ha effettuato diverse modifiche nella ripartizione finanziaria delle risorse fra le diverse misure, orientate a incrementare quelle misure che presentavano un numero di richieste superiori al previsto e riducendo nel contempo le risorse per quelle misure che non avevano trovato una piena risposta sul territorio.

Oltre a tali modifiche il PSR è stato interessato dalla rimodulazione dovuta all'**Health Check**¹ nel 2009 che ha visto l'utilizzo di risorse aggiuntive per tre misure: la 121 Ammodernamento delle aziende agricole, la 125 Infrastrutture e la 214 Pagamenti agro ambientali. In termini di strategia la scelta della Provincia è stata quella di andare a rafforzare la strategia di fondo del PSR, compatibilmente con i limiti imposti dalla programmazione comunitaria agli equilibri tra gli assi e con la destinazione delle risorse aggiuntive rispetto ad obiettivi ed azioni ben precise.

Pertanto, nell'ambito della **Misura 121** è stata incrementata la dotazione delle risorse destinate all'incentivazione della *stabulazione libera*, nell'ottica di fornire un maggior sostegno **al settore lattiero caseario**. Questo tipo di stabulazione sta iniziando a diffondersi da poco nelle zone montane e trova ragione nel contributo che offre per il miglioramento del benessere animale e nella riduzione delle ore di lavoro degli allevatori per la gestione della stalla (mungitura e pulizia).

Nell'ambito della **misura 125**, che aveva una dotazione finanziaria limitata, le risorse aggiuntive saranno destinate alla messa a punto di alcuni **impianti idrici** per l'utilizzo di acqua in casi di emergenza (siccità o comunque rischio per le colture) in zone a limitata piovosità (Val Venosta) ed andando ad attingere le risorse da bacini già esistenti (come ad esempio i bacini idrici destinati alla produzione di energia elettrica).

¹

Presentate alla CE il 15 luglio 2009 ed approvate il 17 dicembre 2009.

Infine, la **misura 214** è stata rafforzata nell'intervento 1 – Colture foraggere, attraverso l'incremento del premio base delle aziende zootecniche di montagna, per permettere una più ampia adesione di aziende e finalizzando l'intervento anche alla fissazione di anidride carbonica (da 30 a 50 g/m²*die nella stagione estiva) determinata dalla presenza di prati stabili e pascoli.

Di seguito si riporta il piano finanziario del PSR con il confronto diretto tra la ripartizione originaria delle risorse (di cui alla Decisione del 2007) e l'attuale ripartizione.

Tab. 2.2.1.I – Piano finanziario del PSR

Misure		Dec. C(2007) 4153 12-09-07	PSR 2013	Δ
Asse 1 - Competitività				
111	Formazione professionale, azioni di informazione, ...	2.400.000	1.398.444	-1.001.556
112	Insediamiento di giovani agricoltori	9.020.000	9.887.500	867.500
115	Avviamento servizi di assistenza, sostituzione e consulenza	320.000	400.065	80.065
121	Ammodernamento delle aziende agricole	10.575.000	14.729.918	4.154.918
122	Accrescimento del valore economico delle foreste	1.800.000	4.095.445	2.295.445
123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	30.168.182	35.104.606	4.936.424
124	Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo	800.000	559.377	-240.623
125	Infrastrutture	17.189.041	12.124.487	-5.064.554
132	Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare	500.000	19.978	-480.022
133	Sostegno alle associazioni di produttori per le attività di promozione e informazione	2.000.000	749.167	-1.250.833
Totale Asse 1 - Competitività		74.772.223	79.068.987	4.296.764
Asse 2 - Ambiente				
211	Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane	54.381.175	62.351.211	7.970.036
214	Pagamenti agroambientali	128.488.157	142.344.897	13.856.740
226	Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi	10.591.973	2.591.974	-7.999.999
227	Sostegno agli investimenti non produttivi nel settore forestale	520.984	370.985	-149.999
Totale Asse 2 - Ambiente		193.982.289	207.659.067	13.676.778
Asse 3 - Diversificazione				
311	Diversificazione in attività non agricole	6.785.200	6.785.200	0
313	Incentivazione delle attività turistiche	3.000.000	2.550.000	-450.000
321	Servizi essenziali per la popolazione rurale	17.137.220	17.137.220	0
322	Riqualificazione e sviluppo dei villaggi*	0	0	0
323	Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	1.360.000	1.275.909	-84.091
Totale Asse 3 - Diversificazione		28.282.420	27.748.329	-534.091
Asse 4 - Leader				
411	Competitività	2.760.000	585.236	-2.174.764
413	Qualità della vita/diversificazione	10.573.523	12.781.464	2.207.941
421	Cooperazione	300.000	348.991	48.991
431	Gestione del Gruppo di Azione Locale (GAL), acquisizione di competenze, animazione	2.000.000	1.999.952	-48
Totale Asse 4 - Leader		15.633.523	15.715.643	82.120
Misura 511 - Assistenza tecnica				
Totale programma		312.670.455	330.192.026	17.521.571

* Misura attuata solo in ambito Leader.

Le modifiche intervenute sul piano finanziario del Programma hanno spostato parzialmente gli equilibri fra le diverse misure, senza tuttavia incidere sulla strategia di fondo del PSR, ovvero il "mantenimento della vitalità e della competitività dell'ambiente rurale".

In linea generale le modifiche apportate hanno determinato la diminuzione delle risorse attribuite a misure che non incontravano l'interesse dei potenziali beneficiari. I motivi di questa mancanza di interesse sono stati individuati nella presenza di interventi analoghi finanziati attraverso leggi provinciali (Misura 132), oppure nelle

difficoltà di applicazione riscontrate sul territorio provinciale dovute alle condizioni strutturali del territorio stesso, ad esempio la difficoltà di individuare partner che operano in Provincia e che presentano le caratteristiche previste per l'applicazione della Misura 124.

Le risorse che si sono rese disponibili sono state ridistribuite verso Misure più appetite dai beneficiari e, di conseguenza, più efficaci ed efficienti nel perseguire gli obiettivi del PSR.

PSR 2014 / 2020 – Elementi di valutazione ex ante

Il nuovo programma nell'individuazione degli interventi, e nell'allocatione delle risorse finanziarie, ha tenuto conto dell'esperienza del PSR 2007-2013.

Di seguito si riportano le raccomandazioni avanzate nel corso del processo di valutazione e il livello di recepimento da parte dell'Amministrazione nel PSR 2014-2020.

Raccomandazioni	Recepimento AdG
Prevedere un numero limitato di interventi concentrandosi su quelli di provata efficacia nel raggiungimento degli obiettivi prioritari del Programma.	La raccomandazione è stata accolta nei limiti di quello che è stato possibile fare considerate le difficoltà a intervenire in contemporanea su altri fondi per ripartire diversamente le risorse.
Mantenere misure ed azioni con risorse limitate solo quando sono complementari e sinergiche con gli interventi prioritari.	La raccomandazione è stata accolta nei limiti di quello che è stato possibile fare considerate le difficoltà a intervenire in contemporanea su altri fondi per ripartire diversamente le risorse.
Semplificare gli interventi previsti attraverso la riduzione delle differenze fra premi simili ma afferenti ad un medesimo obiettivo; la selezione degli interventi da proporre, escludendo quelli che si sono dimostrati meno efficaci; la definizione univoca dei settori produttivi e delle installazioni che possono beneficiare degli interventi; la semplificazione del sistema di premialità;	Il sistema dei premi (ex 214) è stato semplificato e snellito; gli investimenti possibili sono stati sufficientemente circoscritti.
Individuare gli strumenti che consentano di rendere più snella la gestione del sistema di controlli e verifiche sui contributi erogati, in particolare sui premi a causa del numero elevato di domande presentate e degli importi unitari pagati.	Quello che era nelle possibilità dell'AdG è stato fatto, ad esempio con l'eliminazione di alcuni premi di difficile controllo (inerbimento vigneti ripidi), o evitando sistemi a premialità scalare poco chiari per i beneficiari, o rendendo più semplice il calcolo dei punti di svantaggio, ecc. Altri interventi (probabilmente anche più efficaci) non sono possibili se non con modifiche della legislazione nazionale e comunitaria.
Verificare l'opportunità di trasferire alcune azioni verso altre fonti di finanziamento quando tale trasferimento migliora, almeno potenzialmente, l'efficacia dell'intervento, perché lo colloca in un migliore quadro logico.	Nei fatti non recepisce soprattutto per la difficoltà di reperire fondi su altre fonti di finanziamento per tali azioni.
Verificare l'opportunità di concentrare il coordinamento della gestione delle misure "secondarie" presso un unico Ufficio per consentire una gestione più efficiente valutando, contemporaneamente, l'eventualità di un rafforzamento dell'Ufficio delegato alla gestione del PSR.	Pienamente accolta.

3. Attuazione del PSR a maggio 2013

3.1 Avanzamento finanziario

La tabella seguente riporta il quadro delle risorse impiegate a livello di Misura al 31 dicembre 2013. La capacità di spesa è elevata, e pari all'89% a livello di programma, con una differenziazione tra misure ed assi, anche in funzione della tipologia di Misura (premio o investimento) e della tipologia di intervento previsto.

Tab. 3.1.I – Attuazione finanziaria al 31-12-2013


Misure		Spesa pubblica programmata	Spesa pubblica erogata	Attuazione
Asse 1 – Competitività				
111	Formazione professionale, azioni di informazione, ...	1.398.444	668.053	48%
112	Insediamento di giovani agricoltori	9.887.500	9.882.474	100%
115	Avviamento servizi di assistenza, sostituzione e consulenza	400.065	200.000	50%
121	Ammodernamento delle aziende agricole	14.729.918	13.340.580	91%
122	Accrescimento del valore economico delle foreste	4.095.445	4.042.272	99%
123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	35.104.606	28.995.067	83%
124	Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo	559.377	544.178	97%
125	Infrastrutture	12.124.487	7.195.034	59%
132	Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare	19.978	0	0%
133	Sostegno alle associazioni di produttori per le attività di promozione e informazione	749.167	270.195	36%
Totale Asse 1 - Competitività		79.068.987	65.137.852	82%
Asse 2 - Ambiente				
211	Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane	62.351.211	62.345.169	100%
214	Pagamenti agroambientali	142.344.897	133.903.741	94%
226	Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi	2.591.974	2.585.353	100%
227	Sostegno agli investimenti non produttivi nel settore forestale	370.985	208.124	56%
Totale Asse 2 - Ambiente		207.659.067	199.042.387	96%
Asse 3 - Diversificazione				
311	Diversificazione in attività non agricole	6.785.200	5.842.857	86%
313	Incentivazione delle attività turistiche	2.550.000	1.329.907	52%
321	Servizi essenziali per la popolazione rurale	17.137.220	13.653.173	80%
322	Riqualificazione e sviluppo dei villaggi	0	-	-
323	Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	1.275.909	942.168	74%
Totale Asse 3 - Diversificazione		27.748.329	21.768.104	78%
Asse 4 - Leader				
411	Competitività	585.236	280.483	48%
413	Qualità della vita/diversificazione	12.781.464	5.810.109	45%
421	Cooperazione	348.991	0	0%
431	Gestione del Gruppo di Azione Locale (GAL), acquisizione di competenze, animazione	1.999.952	1.270.748	64%
Totale Asse 4 - Leader		15.715.643	7.361.340	47%
Misura 511 - Assistenza tecnica				
Totale programma		330.192.026	293.309.683	89%

Di seguito si riporta un breve quadro dell'attuazione finanziaria a livello di misura.

Misura 111: la misura presenta un livello di erogazioni e un avanzamento degli interventi mediamente basso rispetto al programma nonostante la riduzione delle risorse risentendo ancora del ritardo iniziale accumulato, dovuto principalmente ad una modifica nelle procedure attuative della misura rispetto alla precedente programmazione, non è stato ad oggi assorbito. Le realizzazioni fisiche, pari al 74,4%, evidenziano però un buon livello di attuazione degli interventi.

- Misura 112: La misura risultava chiusa, con un avanzamento della spesa al 99%, già al 31 dicembre 2011. Con il 2012 ed il 2013 si è provveduto ad erogare i premi tramite risorse top-up per assicurare il proseguimento della misura.
- Misura 115: nel corso del 2013 la misura è stata rifinanziata (attraverso risorse non utilizzate in altre misure) al fine di finanziare un ulteriore progetto finalizzato al sostegno all'avviamento di nuovi servizi di consulenza a favore delle aziende agricole provinciali.
- Misura 121: il livello di realizzazione è soddisfacente con un avanzamento della spesa del 91%, in media con il programma. Le procedure per il rilascio delle autorizzazioni a costruire e a ristrutturare, e la necessità di completare i lavori per richiedere i collaudi, hanno determinato negli anni precedenti un fisiologico rallentamento nella spesa, attualmente superato.
- Misura 122: come già indicato nelle precedenti relazioni la misura non presentava problemi di attuazione, anzi la forte domanda ed i risultati positivi raggiunti avevano indotto l'AdG ad incrementare la dotazione della misura nel corso del 2012.
- Misura 123: in modo analogo alla Misura 121 il tasso di realizzazione può essere considerato soddisfacente tenendo conto degli importi già impegnati per progetti avviati, ma non ancora portati a termine.
- Misura 124: la Misura è stata attivata, ma ad oggi sono state raccolte tre sole domande, di cui 2 in area Leader, a dimostrazione della scarsa appetibilità ed applicabilità della stessa (nel corso del 2012 l'AdG ha ridimensionato la misura in modo da destinare le risorse ad azioni che meglio rispondono alle esigenze locali). I progetti sono in fase di conclusione con erogazioni prossime al 100%.
- Misura 125: sconta in maniera ancora più pesante di altre Misure la tempistica necessaria al completamento delle opere. Si tratta infatti di opere di raccolta delle acque in bacini idrici che, nelle condizioni climatiche dell'Alto Adige, richiedono alcuni anni per essere portate a termine.
- Misura 132: La misura, non attivata fino al 2011, ha visto il totale spostamento delle risorse verso altre misure che presentano prospettive di spesa positive. La non attivazione della misura va ricondotta al fatto che gli agricoltori aderiscono comunque a sistemi di qualità indipendentemente dai contributi offerti dal Piano.
- Misura 133: la nuova demarcazione con i PO dell'OCM ortofrutta ha reso necessario un ridimensionamento della misura in funzione dell'effettivo fabbisogno, che presenta un livello di attuazione ancora limitato. Le previsioni sono comunque di assorbire le risorse entro il 2015.

Graf. 3.1.I – Capacità di spesa per l'asse 1 al 31-12-2013 (spesa pubblica, fonte AdG)

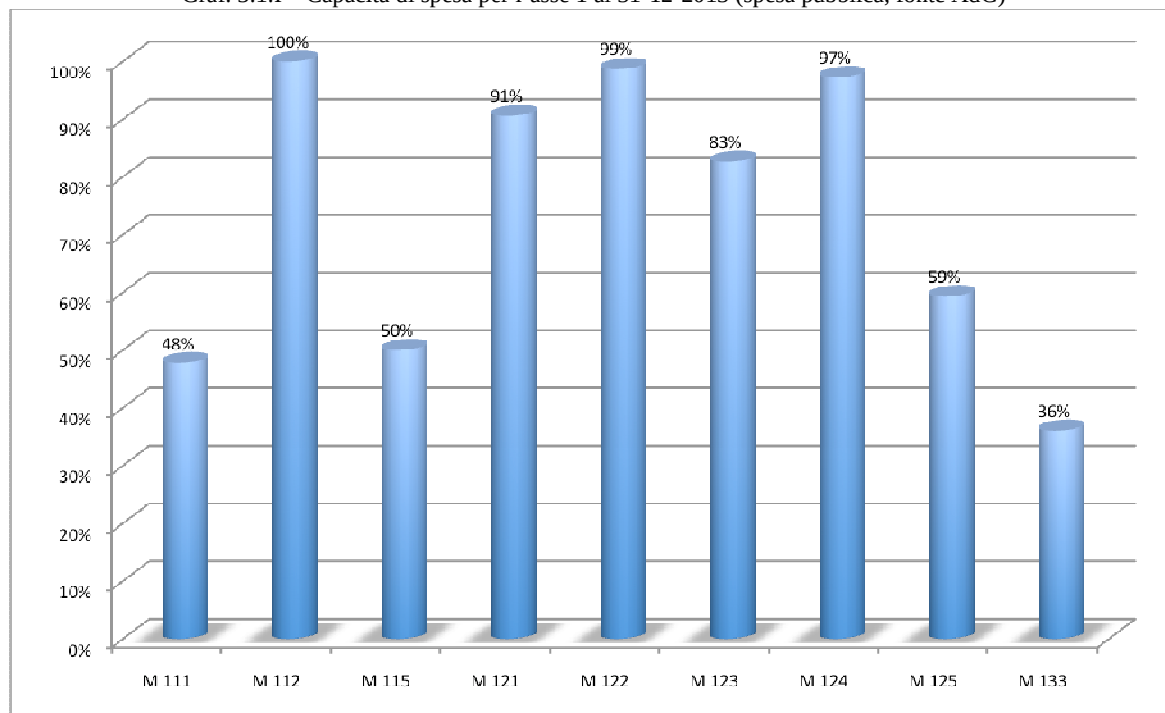

Per l'asse 2 il livello di attuazione è elevato e al di sopra della media del Programma.


- Misura 211: la misura, come previsto, aveva esaurito i fondi a disposizione già nel 2011 e la Provincia è ricorsa a fondi top-up per coprire il restante periodo della programmazione data l'importanza che le indennità rivestono a livello provinciale per le aree interne di montagna.

Misura 214: la Misura è in linea con le previsioni di spesa.

Misura 226: la misura ha visto erogazioni pari alla spesa programmata.

Misura 227: gli interventi da realizzare per la Misura prevedono tempi medio - lunghi anche in considerazione del periodo breve a disposizione per la realizzazione degli stessi (pulizia del sottobosco, potature selettive, trapianti). Considerando gli interventi già approvati, e in corso di realizzazione, si ritiene che saranno raggiunti gli obiettivi prefissati.

Graf. 3.1.II – Capacità di spesa per l'asse 2 al 31-12-2013 (spesa pubblica, fonte AdG)

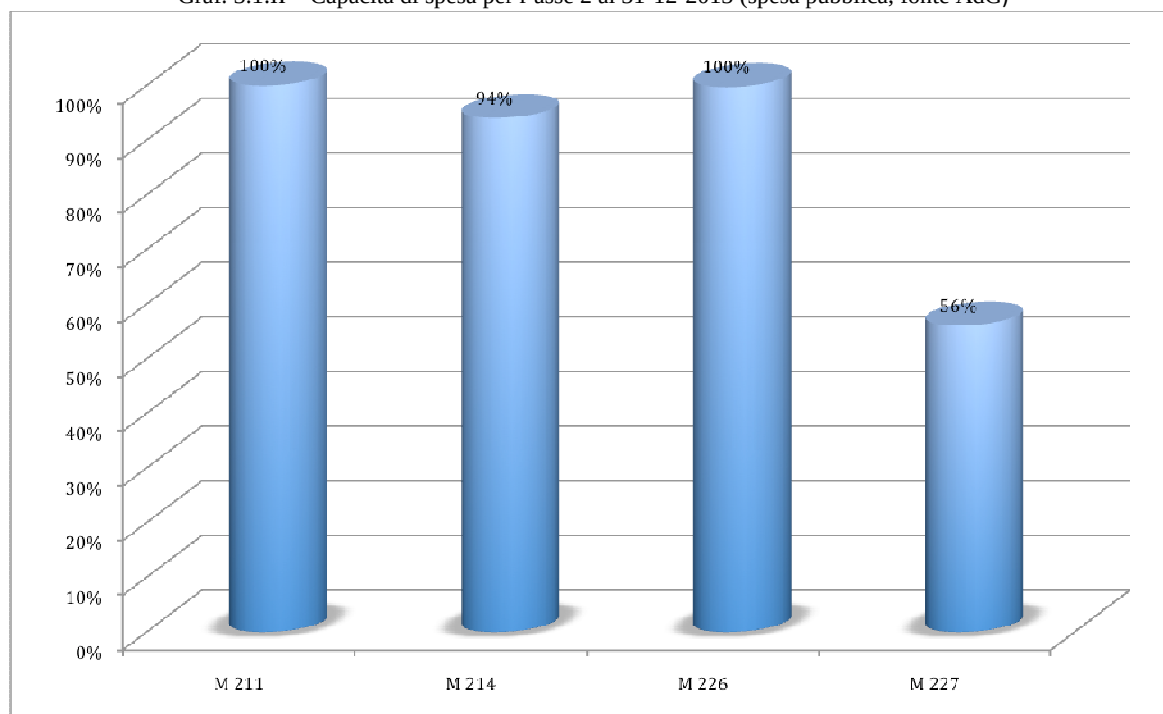

L'asse 3 rimane indietro rispetto agli assi 1 e 2 anche perché molti degli interventi previsti sono localizzate in zone di montagna fattore che ne rallenta, di fatto, la realizzazione nei mesi invernali. Nè bisogna dimenticare che alcuni interventi sono finanziati attraverso i PSL e quindi si sono avviati con un certo ritardo rispetto alle altre Misure del Piano.

Misura 311: la Misura ha raggiunto un tasso di attuazione soddisfacente. Bisogna considerare, in questo campo, il grande interesse delle aziende beneficiarie a realizzare gli interventi previsti dalla misura.


Misura 313: gli interventi previsti sono strettamente collegati ai PSL, sono partiti in ritardo, ma stanno anche procedendo con una certa lentezza. Sarà necessario, al fine di esaurire le risorse assegnate alla misura, velocizzare la spesa degli interventi.

Misura 321: la Misura è partita lentamente in quanto i beneficiari sono Enti Pubblici che hanno tempi di approvazione delle spese relativamente lunghi rispetto ai privati, e perché è stato necessario attendere che venissero chiarite le norme in merito alla rendicontabilità dell'IVA in presenza di beneficiari per i quali la stessa rappresenta un costo. Non bisogna poi dimenticare che sia i lavori per le strade che per gli acquedotti montani possono essere svolti solo in un breve periodo dell'anno, con la conseguenza di protrarsi per due o più stagioni. L'avanzamento della misura è comunque positivo e in media con il programma.

Misura 322: la misura è attuata solo in ambito Leader.

Misura 323: I progetti avviati sulla misura sono diversi ed il tasso di attuazione ha un trend positivo con un incremento nella spesa sostanziale nell'ultimo anno (2013). Si tratta però, in genere, di progetti che devono essere realizzati in alta montagna dove la stagione operativa è molto breve. Sulla base di queste considerazioni si ritiene che gli obiettivi di spesa saranno raggiunti.


Graf. 3.1.III – Capacità di spesa per l'asse 3 al 31-12-2013 (spesa pubblica, fonte AdG)

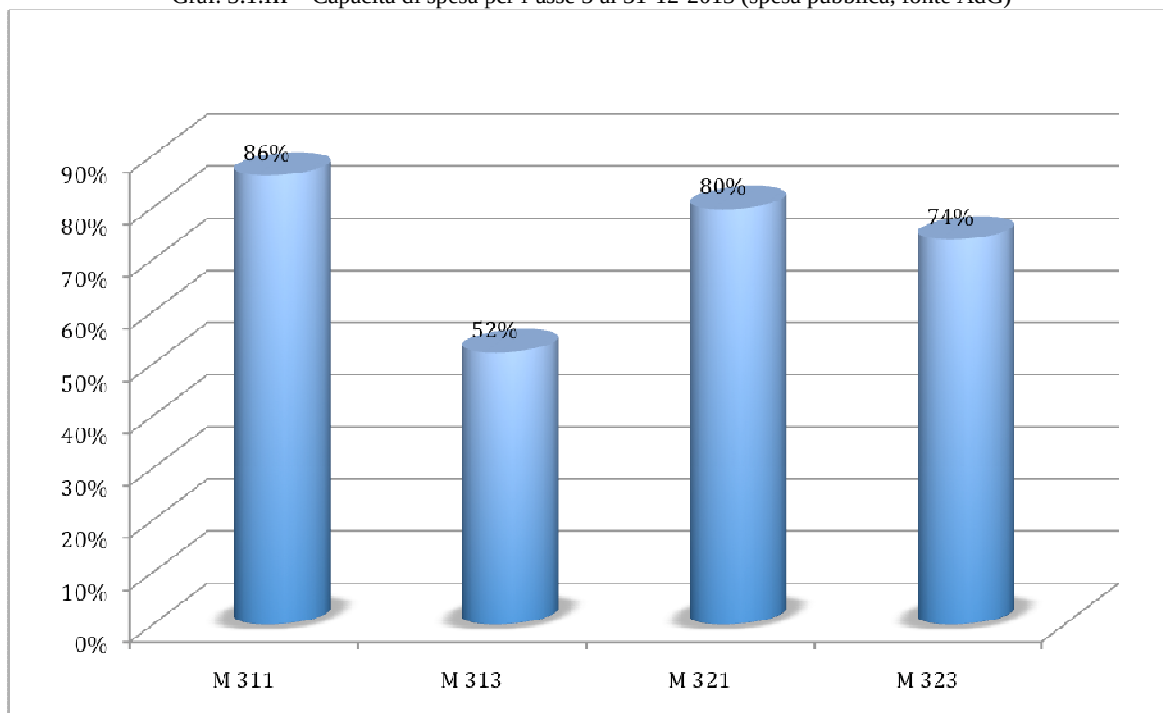

L'asse 4 Leader presenta il livello di attuazione inferiore alla media del programma scontando il ritardato avvio dei GAL rispetto alle altre misure. L'avvio dei PSL è avvenuto, infatti, solo nel 2009 ed i primi progetti hanno un'attuazione solo a partire dal 2011.

Le misure 411 e 413 mostrano un avanzamento medio prossimo al 50%, lasciando prevedere un esaurimento delle risorse. La misura cooperazione (421), pur non registrando erogazioni è presumibile che esaurirà le risorse assegnate in quanto i progetti sono stati avviati.

Graf. 3.1.IV – Capacità di spesa per l'asse 4 al 31-12-2013 (spesa pubblica, fonte AdG)

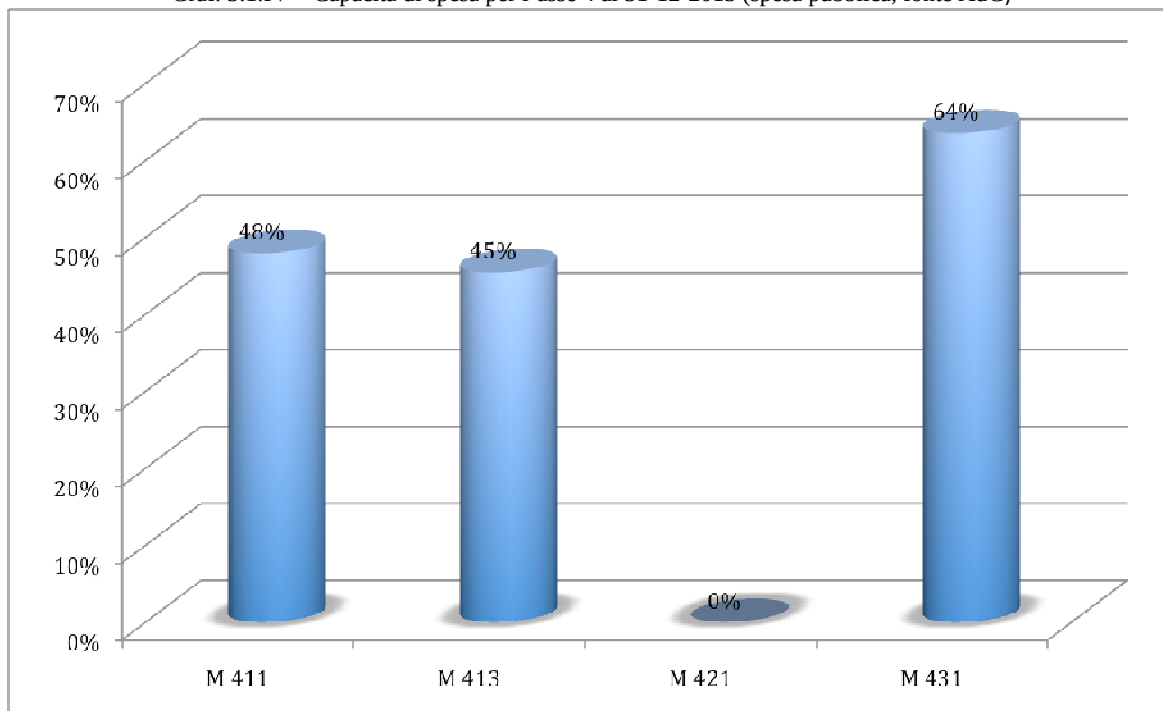

3.2 Benchmark di attuazione finanziaria dei PSR a livello nazionale

Da una analisi comparata dello stato di attuazione dei PSR a livello nazionale si può osservare che il programma della PAB al 28 febbraio 2014 presenta la migliore performance di spesa in Italia, con un indice pari al 90%, contro un valore medio nazionale del 67% e delle regioni competitività del 69%.

Tale dato evidenzia un andamento ottimale del programma, non solo in termini di avanzamento finanziario, più che evidente dalla comparazione della spesa a livello nazionale, ma anche a livello di raggiungimento degli obiettivi strategici, dato peraltro già evidenziato in sede di valutazione intermedia.

La performance in termini di capacità di spesa (una delle migliori in tutta Europa) indica anche che il PSR risponde pienamente alle reali esigenze del mondo rurale provinciale e dimostra la capacità dell'Amministrazione di "far funzionare" il programma favorendo l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili.

Tab. 3.2.I – PSR Italiani: attuazione finanziaria al 28-02-2014

	Regioni	Spesa pubblica programmata	Spesa pubblica erogata	Avanzamento
Competitività	Abruzzo	426.327.617	256.580.857	60%
	Bolzano	330.192.224	297.450.198	90%
	Emilia Romagna	1.157.893.833	790.285.794	68%
	Friuli Venezia Giulia	265.683.479	178.767.829	67%
	Lazio	700.434.557	459.126.845	66%
	Liguria	290.140.047	190.807.122	66%
	Lombardia	1.026.027.304	824.989.786	80%
	Marche	482.282.568	313.947.071	65%
	Molise	206.582.326	135.278.088	65%
	Piemonte	974.087.993	674.365.365	69%
	Sardegna	1.284.746.987	835.763.260	65%
	Toscana	870.527.329	572.000.861	66%
	Trento	278.764.791	222.531.163	80%
	Umbria	785.813.348	532.506.096	68%
	Valle d'Aosta	123.649.759	89.202.763	72%
	Veneto	1.042.158.575	726.251.986	70%
	Totale Competitività	10.245.312.737	7.099.855.086	69%
Convergenza	Basilicata	667.928.664	423.533.720	63%
	Calabria	1.087.508.918	717.532.676	66%
	Campania	1.809.983.083	1.086.183.611	60%
	Puglia	1.595.085.914	1.040.559.271	65%
	Sicilia	2.172.958.855	1.392.247.439	64%
	Totale Convergenza	7.333.465.434	4.660.056.717	64%
	Totale nazionale	17.578.778.171	11.759.911.803	67%

3.3 I risultati raggiunti dal Programma

Nel presente paragrafo si riporta una sintesi dei risultati raggiunti dal Programma. Il giudizio valutativo si discosta di poco da quanto già riportato nelle precedenti valutazioni e nel documento di valutazione intermedia, in quanto già a quella data era possibile valutare positivamente i risultati raggiunti con l'attuazione degli interventi ed il perseguimento degli obiettivi di programmazione a livello di misura e asse.

Per gli assi 3 e 4, il progredire della spesa nel corso del 2013 ed il livello di impegni (ovvero di progetti approvati ed in via di realizzazione), permette di valutare in maniera positiva l'evolversi delle misure anche in presenza di una capacità di spesa non elevata.

3.3.1 Asse 1 - Miglioramento della competitività dei settori agricolo e forestale

Gli indicatori di risultato mostrano chiaramente l'andamento delle misure dell'asse, ed il conseguente raggiungimento degli obiettivi prefissati. Gli indicatori legati alle misure finalizzate ad investimenti nelle aziende agricole, R2 ed R3, presentano un avanzamento prossimo all'80% a dimostrazione della buona performance di tali interventi e del raggiungimento degli obiettivi posti.

L'indicatore R1, direttamente collegato alle azioni di formazione, risente del ridimensionamento della misura nel corso dell'attuazione del programma a fronte di una domanda non elevata. Va evidenziato, comunque, che l'indicatore di realizzazione fisica legato alla misura relativo al "numero di giornate di formazione impartite"

presenta un livello di avanzamento prossimo all'80% a dimostrazione dell'interesse da parte del mondo agricolo e di quello forestale.

Infine, con riferimento l'indicatore R4 relativo al valore della produzione agricola soggetta a marchi/norme di qualità riconosciuti, già nelle relazioni precedenti era stato evidenziato il basso livello di attuazione a conferma dell'effetto limitato che il PSR ha generato in questa direzione. Tuttavia la quasi totalità della produzione frutticola e viticola e una quota importante della produzione lattiero-casearia provinciale vanta marchi di qualità riconosciuti. Tali marchi sono già sostenuti attraverso interventi diretti della Provincia e non hanno bisogno del sostegno del PSR per crescere.

Asse 1 - Miglioramento della competitività dei settori agricolo e forestale

Indicatori di risultato	Valore atteso	Valore realizzato (al 31-12-2013)	% realizzato
(R1) Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una 869 formazione in materia agricola e/o forestale	4.151	2.447	59%
(R2) Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie ('000 EUR)	12.506	9.867	79%
(R3) Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche	34	27	79%
(R4) Valore della produzione agricola soggetta a marchi/norme di qualità riconosciuti ('000 EUR)	28.000	10.260	37%

Gli obiettivi prioritari di asse sono completamente raggiunti, così come quelli di misura, con l'eccezione del "Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale" per i motivi spiegati prima.

Obiettivi prioritari di asse	Obiettivi di misura	Rating di valutazione	Misura attivata
Promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione delle imprese e dell'integrazione delle filiere	Promuovere l'ammodernamento delle aziende agricole	A	121
	Promuovere il miglioramento del valore economico delle foreste	A	122
	Promuovere l'incremento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale	B	123
Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale	Promuovere uno sviluppo innovativo nello sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie	n.v.	124
	Promuovere la partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità alimentare	n.v.	-
	Promuovere il sostegno alle associazioni di produttori nelle attività di informazione e promozione di prodotti che rientrano in sistemi di qualità alimentare	n.v.	133
Potenziamento delle dotazioni infrastrutturali fisiche	Promuovere il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture nel settore agricolo e forestale	n.v. (agricoltura) A (foreste)	125
Miglioramento della capacità imprenditoriale e professionale degli addetti al settore agricolo e forestale e sostegno al ricambio generazionale	Incrementare la professionalità delle persone attive nei settori agricolo e forestale, la diffusione dell'informazione su temi di politica agraria, sugli effetti pratici della riforma della politica agricola comune e della politica di sviluppo rurale	A	111
	Favorire il ricambio generazionale degli addetti in agricoltura, sostituendo gli imprenditori anziani con giovani che possiedano un'adeguata competenza e una solida formazione professionale	A	112
	Favorire la nascita e il consolidamento di servizi di sostituzione per le aziende agricole	A	115

3.3.2 Asse 2 – Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale

I valori medi per anno indicati dai dati di monitoraggio mostrano che gli obiettivi fissati sono stati raggiunti (completamente o in gran parte) nella fase iniziale del programma (già in sede di valutazione intermedia il dato rilevato era positivo). E’ ovvio che il raggiungimento degli obiettivi è stato possibile per il fatto che i valori utilizzati per la definizione dell'indicatore sono quelli medi annuali, tuttavia non si può evitare di sottolineare che il programma ha dato i suoi frutti già nella sua fase di avvio. Questi dati confermano la capacità dell'AdG di individuare correttamente le esigenze dei beneficiari sia come qualità degli interventi proposti, che come quantità delle risorse da mettere a disposizione.

Asse 2 - Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale

Indicatori di risultato	Valore atteso (medio per anno)	Totale 2007- 2013	Totale media per anno (al 31-12-2013)	% realizzato
Superficie media annua soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo (ha/anno):				
Biodiversità	6.800	43.133	8.627	127%
Qualità dell'acqua	60.000	375.233	75.047	125%
Cambiamento climatico	65.357	309.441	61.888	95%
Qualità del suolo	78.571	639.175	127.835	163%
Riduzione marginalizzazione	40.000	332.545	66.509	166%

Per quello che riguarda gli obiettivi prioritari di Asse si conferma quanto già rilevato in sede di valutazione intermedia, ovvero il raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede di programmazione.

Gli obiettivi fissati sono stati sostanzialmente raggiunti, anche se in alcune aree si deve registrare una certa resistenza degli agricoltori a scegliere la strada della estensivizzazione delle coltivazioni e degli allevamenti.

Obiettivi prioritari di asse	Obiettivi di misura	Rating di valutazione	Misura attivata
Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturale	Promuovere l’adesione volontaria da parte degli agricoltori a impegni pluriennali volti all’adozione di pratiche agricole sostenibili ed eco-compatibili finalizzate al rispetto della risorsa paesaggistica, alla tutela e alla valorizzazione della biodiversità, alla tutela qualitativa delle risorse idriche	A	214
Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde			
Riduzione dei gas serra	Garantire la funzione protettiva dei boschi di montagna quale fattore essenziale per la sicurezza delle zone urbane e delle infrastrutture in ambiente rurale	A	226
	Garantire la funzione di assorbimento del carbonio da parte delle formazioni erbose permanenti favorita da pratiche agronomiche tradizionali e da un'estensivizzazione dell'allevamento	B	214
	Sostenere investimenti non produttivi volti a valorizzare in termini di pubblica utilità le foreste e i boschi, al fine di stabilizzare i sistemi forestali con elevato valore naturalistico, accrescendone la funzione di tutela del sistema idrogeologico	A	227
Tutela del territorio	Compensare gli imprenditori agricoli per gli svantaggi naturali presenti nelle zone di montagna, garantendo il mantenimento dell'attività primaria quale fattore di tutela del suolo e del sistema idrogeologico	A	211

3.3.3 Asse 3 – Qualità della vita e diversificazione dell'economia rurale

Il quadro di attuazione per l'Asse 3 risulta positivo, soprattutto se paragonato a quanto rilevato in sede di valutazione intermedia. L'entrata a regime delle misure e l'avanzamento dei progetti senza particolari problematiche, ha determinato un risultato al 31 dicembre 2013 positivo e in continua progressione.

Totale Asse 3 - Qualità della vita e diversificazione dell'economia rurale

Indicatori di risultato	Valore atteso	Valore realizzato (al 31-12-2011)	% realizzato
Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie (000 euro)	3.500,00	2.525,41	72%
Numero lordo di posti di lavoro creati	45,00	32,59	72%
Numero di turisti in più	2.500,00	1.980,00	79%
Popolazione rurale utente di servizi migliorati	7.050,00	4.746,67	67%

Il grado di raggiungimento degli obiettivi di Misura e prioritari di asse conferma quanto emerge dall'analisi degli indicatori di risultato: gli obiettivi fissati vengono raggiunti.

Obiettivi prioritari di asse	Obiettivi di misura	Rating di valutazione	Misura attivata
Miglioramento dell'attrattività dei territori rurali per le imprese e la popolazione	Creare e migliorare i servizi essenziali per la popolazione rurale, creando più adeguate condizioni di vita nelle zone rurali	A	321
	Riqualficazione e sviluppo dei villaggi	B	322
	Promuovere e valorizzare il patrimonio rurale	B	323
Mantenimento e/o creazione di opportunità occupazionali e di reddito in aree rurali	Diversificare l'attività degli imprenditori agricoli, introducendo accanto a quella agricola anche attività non agricole in grado di rappresentare opportunità occupazionali alternative	A	311
	Promuovere le attività turistiche a livello rurale	B	313

3.3.4 Asse 4 – Leader

Nel corso del 2013 l'Asse Leader ha avuto un'accelerazione nell'attuazione degli interventi.

Rimane però basso il livello di spesa rispetto alla media del programma: ad un'approvazione di un numero consistente di progetti corrisponde un'evoluzione della spesa piuttosto contenuta.

Alcune criticità hanno determinato un rallentamento nell'avanzamento, quali ad esempio le procedure di affidamento lavori da parte dei comuni molto complesso, o la non rendicontabilità dell'IVA per gli enti pubblici e l'approvazione dei PSL solo nel 2009.

Dato il livello di attuazione non ancora elevato la valutazione dei risultati del PSL e del raggiungimento degli obiettivi previsti non è attualmente possibile, se non con riferimento all'avanzamento finanziario.

4. Nota sul sistema degli indicatori

In alcune Misure del PSR 2007-2013 della Provincia di Bolzano si sono verificati degli scostamenti significativi fra i valori obiettivo degli indicatori di prodotto ed i valori effettivamente raggiunti.

Di seguito si riporta un'analisi delle misure interessate da tali scostamenti al fine di individuarne le motivazioni.

Misura 122

A fronte di una realizzazione finanziaria che nel 2012 era prossima al 98% e che nel 2013 ha raggiunto il 100%, si sono manifestate alcune differenze nel numero di aziende beneficiarie previste (89%) e nel volume totale degli investimenti (140% nel 2012 e 142% nel 2013).

Lo scostamento nel **numero dei beneficiari** rimane nel range di un errore di stima accettabile, tuttavia un'analisi più attenta evidenzia che il numero di domande presentate (1.593 al 2013) è in linea con il valore obiettivo riferito al numero di aziende beneficiarie previsto (1.600, con una realizzazione pari al 99,6%). La differenza viene dunque spiegata dal fatto che, probabilmente, il valore obiettivo è stato stimato non sul

“numero di beneficiari” ma sul “numero di domande previste”. D'altra parte il fatto che 166 aziende (cioè poco più del 10% dei beneficiari) presentassero più di una domanda era un fatto difficilmente prevedibile. Quanto rilevato in questa sede potrà permettere una più precisa definizione dei valori obiettivi per il prossimo periodo di programmazione.

Lo scostamento nel **volume degli investimenti previsti** viene spiegato in sede di RAE con il fatto che la stima prudenziale condotta al momento della definizione del valore obiettivo aveva tenuto conto del tasso di finanziamento più alto erogabile e tale corrispondenza è evidente.

Questa spiegazione sembra dunque sufficiente, anche perché un volume di investimenti maggiore a carico delle aziende non fa altro che confermare l'efficacia e l'efficienza della Misura.

E' bene però mettere in evidenza che i due indicatori non sono coerenti fra di loro in quanto applicando il criterio del massimo finanziamento il numero di domande finanziabili avrebbe dovuto essere pari a 1.124 e non a 1.600.

Se il fatto di non essere riusciti a centrare gli obiettivi non rappresenta un problema in termini di valutazione del programma, in quanto comunque i risultati raggiunti dalla misura sono positivi, è comunque opportuno fare tesoro dell'esperienza e prevedere una maggiore coerenza nella definizione degli indicatori per il futuro.

Misura 123

La Misura 123 era suddivisa in due sottomisure: una rivolta al settore agroalimentare, l'altra al settore forestale.

Se i valori attesi per il settore agroalimentari sono stati raggiunti in termini di numero di beneficiari e stanno per essere raggiunti in termini finanziari, così non è accaduto per il settore forestale dove i finanziamenti erogati sono pari alle previsioni, ma il numero dei beneficiari è inferiore al previsto (75 contro 280, pari ad un tasso di realizzazione del 27%).

Il motivo di tale differenza, secondo il responsabile di Misura, è da ricercare in due fatti concomitanti:

- la forte richiesta di meccanizzazione delle imprese forestali che ha permesso di utilizzare tutte le risorse disponibili indirizzandole in modo da favorire la produttività e migliorare la sicurezza dei lavoratori;
- lo stralcio dalla Misura, in sede di contrattazione con la CE nel 2007, degli interventi di realizzazione di viabilità aziendale. Tali interventi sono stati spostati sulla Misura 122 e, di fatto, non realizzati, anche perché prevedono la realizzazione di ulteriori tracciati forestali privati. Sempre secondo il responsabile dopo lo stralcio di questo intervento non è stato ridefinito il valore obiettivo.

Giunti ormai quasi alla conclusione del programma non sembra opportuno chiedere una variazione per ridefinire l'obiettivo visto l'errore materiale che sembra viziare il risultato, ma, anche in questo caso, è utile fare tesoro dell'esperienza e rammentarsi di operare le modifiche anche agli indicatori in caso di modifiche sul programma.

Misura 313

Il numero di progetti previsti per questa Misura (sia nelle zone normali, che in quelle Leader) è di gran lunga inferiore al numero di progetti realizzati.

Ad una prima lettura potrebbe sembrare che i progetti presentati siano stati molto più piccoli di quelli che erano attesi.

Ma questa è una lettura che attiene solo agli aspetti formali della realizzazione.

Nella realtà i progetti presentati a finanziamento sono stati, nella maggior parte dei casi, stralciati da progetti più ampi.

La via del castagno in Valle Isarco e il circuito dei Waalwege nel Burgraviato sono progetti ideati a livello sovramunicipale, ma poi realizzati localmente con l'intervento economico diretto delle municipalità.

Ai fini di ottenere uno snellimento burocratico, un'accelerazione nell'erogazione dei fondi e di operare in modo consono alla brevità della stagione utile per la esecuzione dei lavori, quindi, i progetti complessivi sono stati realizzati per lotti, che fanno riferimento comunque ad un'unica regia.

Sarebbe quindi opportuno ricalcolare l'indicatore basandosi non sul numero delle domande, ma sul numero di progetti complessivi che vengono realizzati.

9.4. LEADER

ELER		FEASR	AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL		PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE	
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete			EG – Ver. 1698/2005		Reg. (CE) 1698/2005	L'Europa investe nelle zone rurali

Lokale Aktionsgruppe Wipptal Gruppo d'Azione Locale Alta Valle Isarco

Jahresbericht 2013 Relazione annuale 2013

1. Umsetzung des Lokalen Aktionsplans Wipptal entsprechend den gesteckten Ziele

1.1 Aktivierte Maßnahmen

Bis zum **31.12.2008** wurden in folgenden Maßnahmen des Programms Projekte eingereicht und umgesetzt:

Maßnahme 123

Erhöhung der Wertschöpfung der land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnisse

Maßnahme 313/A

Förderung von touristischen Aktivitäten durch den Ausbau entsprechender Infrastrukturen

Maßnahme 431

Kompetenzentwicklung und Sensibilisierung – LAG-Management

Bis zum **31.12.2009** wurden in folgenden Maßnahmen Projekte eingereicht und umgesetzt:

Maßnahme 111

Berufsbildungs- und Informationsmaßnahmen

Maßnahme 313/A

Verbesserung des Wegenetzes und der Erholungsinfrastrukturen

Maßnahme 313/C

Aufwertung und Förderung der Vermarktung des touristischen Angebotes

Maßnahme 322

Neubelebung und Entwicklung der Dörfer

Maßnahme 431

Kompetenzentwicklung und Sensibilisierung – LAG-Management

Bis zum **31.12.2010** wurden in keinen weiteren Maßnahmen Projekte eingereicht und umgesetzt. Demnach wurden bis zum 31.12.2010 folgende Maßnahmen noch nicht aktiviert:

Maßnahme 124

Kooperation für die Entwicklung von neuen Produkten, Verfahren und Technologien in den Sektoren Landwirtschaft, Forstwirtschaft und im Lebensmittelsektor

Maßnahme 313/B

Alm- und Weidesanierungen für Almwirtschaft und Tourismus

Maßnahme 421

Transnationale und überregionale Zusammenarbeit

Bis zum **31.12.2011** wurden in keinen weiteren Maßnahmen Projekte eingereicht und umgesetzt. Demnach wurden bis zum 31.12.2011 folgende Maßnahmen noch nicht aktiviert:

1. Andamento del Piano di Sviluppo Locale Alta Valle Isarco rispetto agli obiettivi fissati

1.1 Misure attivate

Fino al **31.12.2008** sono stati presentati e attivati progetti nelle seguenti misure del programma:

Misura 123

Accrescimento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria

Misura 313/A

Miglioramento della viabilità rurale e delle strutture ricreative

Misura 431

Gestione dei Gruppi d'Azione Locali, acquisizione di competenze e animazione

Fino al **31.12.2009** sono stati presentati ed attuati progetti nelle seguenti misure del programma:

Misura 111

Azioni di formazione professionale e d'informazione

Misura 313/A

Miglioramento della viabilità rurale e delle strutture ricreative

Misura 313/C

Valorizzazione e promozione dell'offerta turistica

Misura 322

Riquilificazione e sviluppo dei villaggi

Misura 431

Gestione dei Gruppi d'Azione Locali, acquisizione di competenze e animazione

Fino al **31.12.2010** non sono stati presentati e svolti progetti in altre misure. Quindi fino al 31.12.2010 non sono ancora state attivate le seguenti misure:

Misura 124

Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, forestale ed in quello alimentare

Misura 313/B

Risanamento di alpeggi e pascoli in vista dell'alpicoltura e del turismo

Misura 421

Cooperazione interterritoriale e transnazionale

Fino al **31.12.2011** non sono stati presentati e svolti progetti in altre misure. Quindi fino al 31.12.2011 non sono ancora state attivate le seguenti misure:

Maßnahme 124

Kooperation für die Entwicklung von neuen Produkten, Verfahren und Technologien in den Sektoren Landwirtschaft, Forstwirtschaft und im Lebensmittelsektor

Maßnahme 313/B

Alm- und Weidesanierungen für Almwirtschaft und Tourismus

Maßnahme 421

Transnationale und überregionale Zusammenarbeit

Bis zum **31.12.2012** wurde die **Maßnahme 421** durch die Umsetzung von zwei Förderprojekten aktiviert. Demnach wurden bisher in folgenden Maßnahmen des Programms Projekte eingereicht und umgesetzt:

Maßnahme 111

Berufsbildungs- und Informationsmaßnahmen

Maßnahme 123

Erhöhung der Wertschöpfung der land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnisse

Maßnahme 313/A

Förderung von touristischen Aktivitäten durch den Ausbau entsprechender Infrastrukturen

Maßnahme 313/C

Aufwertung und Förderung der Vermarktung des touristischen Angebotes

Maßnahme 322

Neubelebung und Entwicklung der Dörfer

Maßnahme 421

Transnationale und überregionale Zusammenarbeit

Maßnahme 431

Kompetenzentwicklung und Sensibilisierung – LAG-Management

Demnach wurden **alle Maßnahmen** entsprechend der Programmplanung der LAG-Wipptal aktiviert.

Für die **Maßnahmen 124 und 313/B** hat die LAG Wipptal entsprechend der erfolgten Änderungen des Finanzplans **kein Budget vorgesehen**, weshalb diese Maßnahmen im laufenden Programmzeitraum auch nicht aktiviert werden.

Bereits im Jahr 2012 wurden **alle Maßnahmen** entsprechend der Programmplanung der LAG-Wipptal aktiviert und im Jahr 2013 weiter umgesetzt.

Für die **Maßnahmen 124 und 313/B** hat die LAG Wipptal entsprechend der erfolgten Änderungen des Finanzplans **kein Budget vorgesehen**, weshalb diese Maßnahmen im laufenden Programmzeitraum auch nicht mehr aktiviert werden

Misura 124

Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, forestale ed in quello alimentare

Misura 313/B

Risanamento di alpeggi e pascoli in vista dell'alpicoltura e del turismo

Misura 421

Cooperazione interterritoriale e transnazionale

Fino al **31.12.2012** la **misura 421** è stata attivata attraverso la realizzazione di due progetti. Quindi sono stati presentati e realizzati progetti nelle seguenti misure del programma:

Misura 111

Azioni di formazione professionale e d'informazione

Misura 123

Accrescimento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria

Misura 313/A

Miglioramento della viabilità rurale e delle strutture ricreative

Misura 313/C

Valorizzazione e promozione dell'offerta turistica

Misura 322

Riqualificazione e sviluppo dei villaggi

Misura 421

Cooperazione interterritoriale e transnazionale

Misura 431

Gestione dei Gruppi d'Azione Locali, acquisizione di competenze e animazione

Quindi sono state attivate **tutte le misure** secondo la programmazione del GAL Alta Valle Isarco.

Per le **misure 124 e 313/B** il GAL Alta Valle Isarco in sintonia con le avvenute variazioni del piano finanziario **non ha provveduto fondi** e quindi queste misure non verranno attivate nel corrente periodo di programmazione.

Già nell'anno 2012 sono state attivate **tutte le misure** secondo la programmazione del GAL Alta Valle Isarco, la loro realizzazione è proseguita anche nell'anno 2013.

Per le **misure 124 e 313/B** il GAL Alta Valle Isarco in sintonia con le avvenute variazioni del piano finanziario **non ha provveduto fondi** e quindi queste misure non verranno più attivate nel corrente periodo di programmazione.

1.2 Anzahl der der LAG vorgelegten und genehmigten Projektanträge in den Jahren 2008 bis 2013

Im Jahr **2008** wurden der LAG drei Projektanträge vorgelegt:

- 001 LAG-Management – LAG Wipptal 2007-2013 Teilprojekt Jahr 2008
- 002 Ratschingser Almweg
- 003 Aufwertung/Ausbau Holzlagerplatz Pflersch

Alle 2008 vorgelegten Anträge wurden von der LAG genehmigt.

Im Jahr **2009** wurden der LAG folgende Projektanträge vorgelegt:

- 004 LAG-Management – LAG Wipptal 2007-2013 Teilprojekt Jahr 2009
- 005 Erholungspark Gasteig
- 006 Errichtung eines naturkundlichen Wanderweges Ried
- 007 Dorfgestaltung Thuins
- 008 Urlaub auf dem Bauernhof Sterzing und seine Ferientäler – Marketing 2010-2011
- 009 Arbeitskreis QualitätsRINDfleisch Wippta - Aufbau 2009-2010
- 010 Außerordentliche Instandsetzung Kellergasse Mauls
- 011 Außengestaltung der Kapelle Mariahilf in Niederflans
- 012 Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten Wanderweg Maiern-Burkhardklamm
- 013 Errichtung eines naturkundlichen Wanderweges am Rosskopf
- 014 Landschaftspflegearbeiten „Lahnergasse“
- 015 Errichtung eines Wandersteiges Lochen-St. Anton
- 016 Ausbau Zufahrtsstraße St. Anton (Brenner)

Alle 2009 vorgelegten Anträge wurden von der LAG positiv bewertet und genehmigt.

Im Jahr **2010** wurden der LAG folgende Projektanträge vorgelegt:

- 017 LAG-Management - LAG Wipptal 2007-2013 - Teilprojekt Jahr 2010
- 018 Errichtung eines Parkplatzes und Außengestaltung beim Sporthaus in der Sportzone "Grube" in Pfitsch
- 019 Neuerrichtung Wandersteig Vallerjöchhl
- 020 Außerordentliche Instandsetzung Wandersteig Kreuzweg Silbergasse/Moosgasse
- 021 Arbeitskreis WippSCHAF
- 022 Ratschingser Almweg - 2. Baulos
- 023 Neugestaltung des Bahnhofplatzes in Franzensfeste
- 024 Ausbau der Zufahrtsstraße St. Anton - 2. Baulos
- 025 Dorfplatz Wiesen (Pfitsch)
- 026 Sanierung historischer Gassen in Kematen (Pfitsch)
- 027 LAG-Management - LAG Wipptal 2007-2013 - Teilprojekt Jahr 2011

Alle 2010 vorgelegten Anträge wurden von der LAG positiv bewertet und genehmigt.

Im Jahr **2011** wurden der LAG folgende

1.2 Numero complessivo delle domande d'aiuto presentate al GAL e da questo approvate dal 2008 al 2013

Nell'anno **2008** sono state presentate al GAL le seguenti tre domande d'aiuto:

- 001 GAL-Management – GAL Alta Valle Isarco 2007-2013 Progetto parziale anno 2008
- 002 Sentiero delle malghe Racines
- 003 Valorizzazione/ampliamento piazzale del legno Fleres

Tutte le domande presentate nel 2008 sono state approvate dal GAL.

Nell'anno **2009** sono state presentate al GAL le seguenti domande d'aiuto:

- 004 GAL-Management – GAL Alta Valle Isarco 2007-2013 Progetto parziale anno 2009
- 005 Parco ricreativo Casateia
- 006 Realizzazione di un sentiero naturalistico Novale
- 007 Valorizzazione del paese Tunes
- 008 Agriturismo Vipiteno e le sue vallate Marketing 2010-2011
- 009 Gruppo di lavoro Carne di manzo di Qualità Wipptal - Lancio 2009-2010
- 010 Manutenzione straordinaria sentiero Kellergasse Mules
- 011 Valorizzazione della cappella Mariahilf a Flans di sotto
- 012 Manutenzione straordinaria sentiero Masseria-Burkhardklamm
- 013 Realizzazione di un sentiero naturalistico al Monte Cavallo
- 014 Attività di tutela del paesaggio "Lahnergasse"
- 015 Realizzazione di un sentiero Lochen-S. Antonio
- 016 Ampliamento via di accesso S. Antonio (Brennero)

Tutte le domande presentate nel 2009 sono state approvate dal GAL.

Nell'anno **2010** sono state presentate al GAL le seguenti domande d'aiuto:

- 017 GAL-Management – GAL Alta Valle Isarco 2007-2013 Progetto parziale anno 2010
- 018 Realizzazione di un parcheggio e valorizzazione delle strutture esterne della Casa dello sport nella zona sportiva "Fossa" in Val di Vizze
- 019 Rifacimento del sentiero Giogo di Valles
- 020 Risanamento straordinario del sentiero Kreuzweg Silbergasse/Moosgasse
- 021 Gruppo di lavoro WippSCHAF
- 022 Sentiero delle malghe Racines – 2° lotto
- 023 Valorizzazione del piazzale della stazione a Fortezza
- 024 Ampliamento della strada d'accesso S. Antonio – 2° lotto
- 025 Piazza del paese di Prati (Val di Vizze)
- 026 Risanamento di sentieri storici a Caminata (Val di Vizze)
- 027 GAL-Management – GAL Alta Valle Isarco 2007-2013 - Progetto parziale anno 2011

Tutte le domande presentate nel 2010 sono state approvate dal GAL.

Nell'anno **2011** sono state presentate al GAL le

Projektanträge vorgelegt:

- 028 Errichtung eines Bienenlehrpfades auf bestehenden Wegen zwischen Trens und Valgenäun
- 029 Errichtung einer naturnahen Erholungszone „Öttl“ (Gemeinde Brenner - Pflersch)
- 030 Errichtung eines naturkundlichen Wandersteiges Egg-Penserjoch (Gemeinde Freienfeld)
- 031 Erlebnisweg Wasser am Roskopf (Gemeinde Sterzing)

Alle 2011 vorgelegten Anträge wurden von der LAG positiv bewertet und genehmigt.

seguinti domande d'aiuto:

- 028 Realizzazione di un sentiero didattico sull'apicoltura su sentieri esistenti fra Campo di Trens e Valgenauna
- 029 Realizzazione di una zona ricreativa "Öttl" (Comune di Brennero - Val di Fleres)
- 030 Realizzazione di un sentiero naturalistico Dosso-Passo Pennes (Comune di Campo di Trens)
- 031 Sentiero naturalistico sull'acqua sul Monte Cavallo (Comune di Vipiteno)

Tutte le domande presentate nel 2011 sono state approvate dal GAL.

Im Jahr 2012 wurden der LAG folgende Projektanträge vorgelegt:

- 032 LAG-Management - LAG Wipptal 2007-2013 - Teilprojekt Jahr 2012
- 033 Dorfplatzgestaltung Gasteig (Gemeinde Ratschings)
- 034 Programma territoriale Bandiere Arancioni Alto Adige
- 035 Sarntaler Hufeisentour - Ganzheitliche Vermarktung der Sarntaler Alpen
- 036 Qualitätsprodukte & ländlicher Tourismus - Professionalisierung der Vermarktung lokaler Qualitätsprodukte - Kräutergärten Wipptal & Biohof Waldförster
- 037 Gemeinschaftsprojekt Tourismus & Landwirtschaft im Wipptal 2012-2013 - Teilprojekt Tourismusverein Sterzing
- 038 Gemeinschaftsprojekt Tourismus & Landwirtschaft im Wipptal 2012-2013 - Teilprojekt Tourismusverein Ratschings
- 039 Gemeinschaftsprojekt Tourismus & Landwirtschaft im Wipptal 2012-2013 - Teilprojekt Tourismusverein Gossensass
- 040 Aufwertung/Gestaltung Festplatz Gossensass
- 041 Dorfplatzgestaltung Stilfes
- 042 Außerordentliche Instandhaltung Wandersteig „Strassberg - Platzhof“
- 043 Außerordentliche Instandhaltung Wandersteig „Oberried - Larchhof“
- 044 Außerordentliche Instandhaltung Wandersteig „Thuner Kirchsteig“
- 045 Gestaltung eines naturnahen Parks mit Kinderspielplatz in Ried
- 046 Ausbau der Zufahrtsstraße St. Anton - 3. Baulos
- 047 Errichtung eines Holzlagers mit Flugdach in Ratschings

Alle 2012 vorgelegten Anträge wurden von der LAG positiv bewertet und genehmigt.

Nell'anno 2012 sono state presentate al GAL le seguenti domande d'aiuto:

- 032 GAL-Management - GAL Alta Valle Isarco 2007-2013 - Progetto parziale anno 2012
- 033 Sistemazione della piazza del paese Casateia (Racines)
- 034 Programma territoriale Bandiere Arancioni Alto Adige
- 035 Tour Ferro di Cavallo - Promozione complessiva delle Alpi Sarentine
- 036 Prodotti di qualità & turismo rurale - professionalizzazione della commercializzazione di prodotti locali di qualità - Kräutergärten Wipptal & Biohof Waldförster
- 037 Progetto comune Turismo & Agricoltura nell'Alta Valle Isarco 2012-2013 - Progetto parziale Associazione turistica Vipiteno
- 038 Progetto comune Turismo & Agricoltura nell'Alta Valle Isarco 2012-2013 - Progetto parziale Associazione turistica Racines
- 039 Progetto comune Turismo & Agricoltura nell'Alta Valle Isarco 2012-2013 - Progetto parziale Associazione turistica Colle Isarco
- 040 Valorizzazione/Sistemazione piazza per sagre Colle Isarco
- 041 Sistemazione della piazza del paese a Stilves
- 042 Risanamento straordinario sentiero "Strassberg - Platzhof"
- 043 Risanamento straordinario sentiero "Oberried - Larchhof"
- 044 Risanamento straordinario sentiero "Thuner Kirchsteig"
- 045 Realizzazione di un parco naturalistico con campo giochi a Novale
- 046 Ampliamento della strada d'accesso S. Antonio - 3° lotto
- 047 Realizzazione di un stabilimento per legno a Racines

Tutte le domande presentate nel 2012 sono state approvate dal GAL.

Im Jahr 2013 wurden der LAG folgende Projektanträge vorgelegt:

- 048 LAG-Management - LAG Wipptal 2007-2013 Teilprojekt Jahr 2013
- 049 Sterzinger Bauernmarkt - Aufbau 2013
- 050 Gemeinschaftsprojekt Tourismus & Landwirtschaft im Wipptal 2013 - Teilprojekt Tourismusverein Ratschings
- 051 Gemeinschaftsprojekt Tourismus & Landwirtschaft im Wipptal 2013 - Teilprojekt Tourismusverein Sterzing
- 052 Errichtung eines Bienenlehrpfades auf bestehenden Wegen zwischen Trens und Valgenäun - 3. Baulos
- 053 Errichtung eines naturkundlichen Wanderweges am Roskopf - Variante

Nell'anno 2013 sono state presentate al GAL le seguenti domande d'aiuto:

- 048 GAL-Management - GAL Alta Valle Isarco 2007-2013 - Progetto parziale anno 2013
- 049 Mercato dei contadini Vipiteno - creazione/assetto 2013
- 050 Progetto comune Turismo & Agricoltura nell'Alta Valle Isarco 2013 - Progetto parziale Associazione turistica Racines
- 051 Progetto comune Turismo & Agricoltura nell'Alta Valle Isarco 2013 - Progetto parziale Associazione turistica Vipiteno
- 052 Realizzazione di un sentiero didattico sull'apicoltura su sentieri esistenti fra Campo di Trens e Valgenauna - 3° lotto
- 053 Realizzazione di un sentiero naturalistico al Monte Cavallo - Variante

- 014 Landschaftspflegearbeiten „Lahnergasse“ - Variante
- 031 Erlebnisweg Wasser am Rosskopf - Variante
- 053 Renaturierung Mühlbachl und Sanierung einer historischen Mühle in Wiesen
- 054 Errichtung Dorfpark Mareit - 1. Baulos: Pavillon
- 055 LAG-Management - LAG Wipptal 2007-2013 Teilprojekt Jahre 2014-2015
- 056 Gemeinschaftsprojekt Tourismus & Landwirtschaft im Wipptal - Erste Wipptaler Genuss-Tage 2014

Alle 2013 vorgelegten Anträge wurden von der LAG positiv bewertet und genehmigt.

- 014 Attività di tutela del paesaggio “Lahnergasse” - Variante
- 031 Sentiero naturalistico sull’acqua sul Monte Cavallo - Variante
- 053 Rinaturalizzazione Rio Mulini e risanamento di un mulino storico a Prati
- 054 Realizzazione del parco del paese di Mareta – 1° lotto: padiglione
- 055 GAL-Management – GAL Alta Valle Isarco 2007-2013 - Progetto parziale anni 2014-2015
- 056 Progetto comune Turismo & Agricoltura nell’Alta Valle Isarco - Prime Giornate del Gusto dell’Alta Valle Isarco 2014

Tutte le domande presentate nel 2013 sono state approvate dal GAL.

1.3 Anzahl der Projekte, die sich 2008 bis 2013 in Umsetzung befinden bzw. abgeschlossen sind

Mit **31.12.2008** befanden sich folgende Projekte in Umsetzung:

- 001 LAG-Management – LAG Wipptal 2007-2013 Teilprojekt Jahr 2008
- 002 Ratschinger Almweg
- 003 Aufwertung/Ausbau Holzlagerplatz Pflersch

Bis zum 31.12.2008 konnten keine Projekte vollständig abgeschlossen und abgerechnet werden.

Mit **31.12.2009** befanden sich folgende Projekte in Umsetzung:

- 002 Ratschinger Almweg
- 003 Aufwertung/Ausbau Holzlagerplatz Pflersch
- 004 LAG-Management – LAG Wipptal 2007-2013 Teilprojekt Jahr 2009
- 005 Erholungspark Gasteig
- 006 Errichtung eines naturkundlichen Wanderweges Ried
- 007 Dorfgestaltung Thuins
- 008 Urlaub auf dem Bauernhof Sterzing und seine Ferientäler – Marketing 2010-2011
- 009 Arbeitskreis QualitätsRINDfleisch Wippta - Aufbau 2009-2010
- 010 Außerordentliche Instandsetzung Kellergasse Mauls
- 011 Außengestaltung der Kapelle Mariahilf in Niederflans

Bis zum 31.12.2009 konnten folgende Projekte vollständig abgeschlossen und abgerechnet werden:

- 001 LAG-Management – LAG Wipptal 2007-2013 Teilprojekt Jahr 2008

Mit **31.12.2010** befanden sich folgende Projekte in Umsetzung:

- 002 Ratschinger Almweg
- 003 Aufwertung/Ausbau Holzlagerplatz Pflersch
- 005 Erholungspark Gasteig
- 006 Errichtung eines naturkundlichen Wanderweges Ried
- 008 Urlaub auf dem Bauernhof Sterzing und seine Ferientäler – Marketing 2010-2011
- 010 Außerordentliche Instandsetzung Kellergasse Mauls

1.3 Numero dei progetti in corso di effettiva esecuzione/terminati dal 2008 fino al 2013

Al **31.12.2008** i seguenti progetti erano in corso di effettiva esecuzione:

- 001 GAL-Management – GAL Alta Valle Isarco 2007-2013 Progetto parziale anno 2008
- 002 Sentiero delle malghe Racines
- 003 Valorizzazione/ampliamento piazzale del legno Fleres

Fino al 31.12.2008 nessun progetto è stato concluso e rendicontato completamente.

Al **31.12.2009** i seguenti progetti erano in corso di effettiva esecuzione:

- 002 Sentiero delle malghe Racines
- 003 Valorizzazione/ampliamento piazzale del legno Fleres
- 004 GAL-Management – GAL Alta Valle Isarco 2007-2013 Progetto parziale anno 2008
- 005 Parco ricreativo Casateia
- 006 Realizzazione di un sentiero naturalistico Novale
- 007 Valorizzazione del paese Tunes
- 008 Agriturismo Vipiteno e le sue vallate Marketing 2010-2011
- 009 Gruppo di lavoro Carne di manzo di Qualità Wippta - Lancio 2009-2010
- 010 Manutenzione straordinaria Kellergasse Mules
- 011 Valorizzazione della cappella Mariahilf a Flans di sotto

Fino al 31.12.2009 i seguenti progetti sono stati conclusi e rendicontati completamente.

- 001 GAL-Management – GAL Alta Valle Isarco 2007-2013 Progetto parziale anno 2008

Al **31.12.2010** i seguenti progetti erano in corso di effettiva esecuzione:

- 002 Sentiero delle malghe Racines
- 003 Valorizzazione/ampliamento piazzale del legno Fleres
- 005 Parco ricreativo Casateia
- 006 Realizzazione di un sentiero naturalistico Novale
- 008 Agriturismo Vipiteno e le sue vallate Marketing 2010-2011
- 010 Manutenzione straordinaria Kellergasse Mules

012	Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten Wanderweg Maiern-Burkhardklamm	012	Manutenzione straordinaria sentiero Masseria-Burkhardklamm
013	Errichtung eines naturkundlichen Wanderweges am Rosskopf	013	Realizzazione di un sentiero naturalistico al Monte Cavallo
014	Landschaftspflegearbeiten „Lahnergasse“	014	Attività di tutela del paesaggio „Lahnergasse“
015	Errichtung eines Wandersteiges Lochen-St. Anton	015	Realizzazione di un sentiero Lochen-S. Antonio
016	Ausbau Zufahrtsstraße St. Anton (Brenner)	016	Ampliamento via di accesso S. Antonio (Brennero)
017	LAG-Management - LAG Wipptal 2007-2013 - Teilprojekt Jahr 2010	017	GAL-Management – GAL Alta Valle Isarco 2007-2013 Progetto parziale anno 2010
018	Errichtung eines Parkplatzes und Außengestaltung beim Sporthaus in der Sportzone "Grube" in Pfitsch	018	Realizzazione di un parcheggio e valorizzazione delle strutture esterne della Casa dello sport nella zona sportiva "Fossa" in Val di Vizze
019	Neuerrichtung Wandersteig Vallerjöch	019	Rifacimento del sentiero Giogo di Valles
020	Außerordentliche Instandsetzung Wandersteig Kreuzweg Silbergassee/Moosgasse	020	Risanamento straordinario del sentiero Kreuzweg Silbergassee/Moosgasse
021	Arbeitskreis WippSCHAF	021	Gruppo di lavoro WippSCHAF
022	Ratschinger Almweg - 2. Baulos	022	Sentiero delle malghe Racines – 2° lotto
023	Neugestaltung des Bahnhofplatzes in Franzensfeste	023	Valorizzazione del piazzale della stazione a Fortezza
024	Ausbau der Zufahrtsstraße St. Anton - 2. Baulos	024	Ampliamento della strada d'accesso S. Antonio – 2° lotto
025	Dorfplatz Wiesen	025	Piazza del paese di Prati (Val di Vizze)
026	Sanierung historischer Gassen in Kematen	026	Risanamento di sentieri storici a Caminata (Val di Vizze)

Bis zum 31.12.2010 konnten folgende Projekte vollständig abgeschlossen und abgerechnet werden:

- 004 LAG-Management – LAG Wipptal 2007-2013 Teilprojekt Jahr 2009
- 007 Dorfgestaltung Thuins
- 009 Arbeitskreis QualitätsRINDfleisch Wipptal - Aufbau 2009-2010
- 011 Außengestaltung der Kapelle Mariahilf in Niederflans

Fino al 31.12.2010 i seguenti progetti sono stati conclusi e rendicontati completamente.

- 004 GAL-Management – GAL Alta Valle Isarco 2007-2013 Progetto parziale anno 2008
- 007 Valorizzazione del paese Tunes
- 009 Gruppo di lavoro Carne di manzo di Qualità Wipptal - Lancio 2009-2010
- 011 Valorizzazione della cappella Mariahilf a Flans di sotto

Mit 31.12.2011 befanden sich folgende Projekte in Umsetzung:

- 012 Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten Wanderweg Maiern-Burkhardklamm
- 013 Errichtung eines naturkundlichen Wanderweges am Rosskopf
- 014 Landschaftspflegearbeiten „Lahnergasse“
- 015 Errichtung eines Wandersteiges Lochen-St. Anton
- 016 Ausbau Zufahrtsstraße St. Anton (Brenner)
- 018 Errichtung eines Parkplatzes und Außengestaltung beim Sporthaus in der Sportzone "Grube" in Pfitsch
- 019 Neuerrichtung Wandersteig Vallerjöch
- 020 Außerordentliche Instandsetzung Wandersteig Kreuzweg Silbergassee/Moosgasse
- 021 Arbeitskreis WippSCHAF
- 022 Ratschinger Almweg - 2. Baulos
- 023 Neugestaltung des Bahnhofplatzes in Franzensfeste
- 024 Ausbau der Zufahrtsstraße St. Anton - 2. Baulos
- 025 Dorfplatz Wiesen
- 026 Sanierung historischer Gassen in Kematen
- 027 LAG-Management - LAG Wipptal 2007-2013 - Teilprojekt Jahr 2011
- 028 Errichtung eines Bienenlehrpfades auf bestehenden Wegen zwischen Trens und Valgenäun
- 029 Errichtung einer naturnahen Erholungszone „Öttl“ (Gemeinde Brenner - Pferssch)
- 030 Errichtung eines naturkundlichen Wandersteiges Egg-Penserjoch (Gemeinde Freienfeld)
- 031 Erlebnisweg Wasser am Rosskopf (Gemeinde Sterzing)

Al 31.12.2011 i seguenti progetti erano in corso di effettiva esecuzione:

- 012 Manutenzione straordinaria sentiero Masseria-Burkhardklamm
- 013 Realizzazione di un sentiero naturalistico al Monte Cavallo
- 014 Attività di tutela del paesaggio „Lahnergasse“
- 015 Realizzazione di un sentiero Lochen-S. Antonio
- 016 Ampliamento via di accesso S. Antonio (Brennero)
- 018 Realizzazione di un parcheggio e valorizzazione delle strutture esterne della Casa dello sport nella zona sportiva "Fossa" in Val di Vizze
- 019 Rifacimento del sentiero Giogo di Valles
- 020 Risanamento straordinario del sentiero Kreuzweg Silbergassee/Moosgasse
- 021 Gruppo di lavoro WippSCHAF
- 022 Sentiero delle malghe Racines – 2° lotto
- 023 Valorizzazione del piazzale della stazione a Fortezza
- 024 Ampliamento della strada d'accesso S. Antonio – 2° lotto
- 025 Piazza del paese di Prati (Val di Vizze)
- 026 Risanamento di sentieri storici a Caminata (Val di Vizze)
- 027 GAL-Management – GAL Alta Valle Isarco 2007-2013 - Progetto parziale anno 2011
- 028 Realizzazione di un sentiero didattico sull'apicoltura su sentieri esistenti fra Campo di Trens e Valgenäuna
- 029 Realizzazione di una zona ricreativa "Öttl" (Comune di Brennero – Val di Fleres)
- 030 Realizzazione di un sentiero naturalistico Dosso-Passo Pennes (Comune di Campo di Trens)
- 031 Sentiero naturalistico sull'acqua sul Monte Cavallo (Comune di Vipiteno)

Bis zum 31.12.2011 konnten folgende Projekte vollständig abgeschlossen und abgerechnet werden:

- 002 Ratschinger Almweg
- 003 Aufwertung/Ausbau Holzlagerplatz Pflersch
- 005 Erholungspark Gasteig
- 006 Errichtung eines naturkundlichen Wanderweges Ried
- 008 Urlaub auf dem Bauernhof Sterzing und seine Ferientäler – Marketing 2010-2011
- 010 Außerordentliche Instandsetzung Kellergasse Mauls
- 017 LAG-Management - LAG Wipptal 2007-2013 - Teilprojekt Jahr 2010

Fino al 31.12.2011 i seguenti progetti sono stati conclusi e rendicontati completamente.

- 002 Sentiero delle malghe Racines
- 003 Valorizzazione/ampliamento piazzale del legno Fleres
- 005 Parco ricreativo Casateia
- 006 Realizzazione di un sentiero naturalistico Novale
- 008 Agriturismo Vipiteno e le sue vallate Marketing 2010-2011
- 010 Manutenzione straordinaria Kellergasse Mules
- 017 GAL-Management – GAL Alta Valle Isarco 2007-2013 Progetto parziale anno 2010

Mit 31.12.2012 befanden sich folgende Projekte in Umsetzung:

- 012 Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten Wanderweg Maiern-Burkhardklamm
- 013 Errichtung eines naturkundlichen Wanderweges am Roskopf
- 014 Landschaftspflegearbeiten „Lahnergasse“
- 028 Errichtung eines Bienenlehrpfades auf bestehenden Wegen zwischen Trens und Valgenäun
- 029 Errichtung einer naturnahen Erholungszone „Öttl“ (Gemeinde Brennero - Pflersch)
- 030 Errichtung eines naturkundlichen Wandersteiges Egg-Penserjoch (Gemeinde Freienfeld)
- 031 Erlebnisweg Wasser am Roskopf (Gemeinde Sterzing)
- 032 LAG-Management - LAG Wipptal 2007-2013 - Teilprojekt Jahr 2012
- 033 Dorfplatzgestaltung Gasteig (Gemeinde Ratschings)
- 034 Programma territoriale Bandiere Arancioni Alto Adige
- 035 Sarntaler Hufeisentour – Ganzheitliche Vermarktung der Sarntaler Alpen
- 036 Qualitätsprodukte & ländlicher Tourismus - Professionalisierung der Vermarktung lokaler Qualitätsprodukte - Kräutergärten Wipptal & Biohof Waldförster
- 037 Gemeinschaftsprojekt Tourismus & Landwirtschaft im Wipptal 2012-2013 - Teilprojekt Tourismusverein Sterzing
- 038 Gemeinschaftsprojekt Tourismus & Landwirtschaft im Wipptal 2012-2013 - Teilprojekt Tourismusverein Ratschings
- 039 Gemeinschaftsprojekt Tourismus & Landwirtschaft im Wipptal 2012-2013 - Teilprojekt Tourismusverein Gossensass
- 040 Aufwertung/Gestaltung Festplatz Gossensass
- 041 Dorfplatzgestaltung Stilfes
- 042 Außerordentliche Instandhaltung Wandersteig „Strassberg – Platzhof“
- 043 Außerordentliche Instandhaltung Wandersteig „Oberried – Larchhof“
- 044 Außerordentliche Instandhaltung Wandersteig „Thuiner Kirchsteig“
- 045 Gestaltung eines naturnahen Parks mit Kinderspielplatz in Ried
- 046 Ausbau der Zufahrtsstraße St. Anton – 3. Baulos
- 047 Errichtung eines Holzlagers mit Flugdach in Ratschings

Al 31.12.2012 i seguenti progetti erano in corso di effettiva esecuzione:

- 012 Manutenzione straordinaria sentiero Masseria-Burkhardklamm
- 013 Realizzazione di un sentiero naturalistico al Monte Cavallo
- 014 Attività di tutela del paesaggio „Lahnergasse“
- 028 Realizzazione di un sentiero didattico sull'apicoltura su sentieri esistenti fra Campo di Trens e Valgenäuna
- 029 Realizzazione di una zona ricreativa „Öttl“ (Comune di Brennero – Val di Fleres)
- 030 Realizzazione di un sentiero naturalistico Dosso-Passo Pennes (Comune di Campo di Trens)
- 031 Sentiero naturalistico sull'acqua sul Monte Cavallo (Comune di Vipiteno)
- 032 GAL-Management – GAL Alta Valle Isarco 2007-2013 - Progetto parziale anno 2012
- 033 Sistemazione della piazza del paese Casateia (Racines)
- 034 Programma territoriale Bandiere Arancioni Alto Adige
- 035 Tour Ferro di Cavallo – Promozione complessiva delle Alpi Sarentine
- 036 Prodotti di qualità & turismo rurale – professionalizzazione della commercializzazione di prodotti locali di qualità – Kräutergärten Wipptal & Biohof Waldförster
- 037 Progetto comune Turismo & Agricoltura nell'Alta Valle Isarco 2012-2013 - Progetto parziale Associazione turistica Vipiteno
- 038 Progetto comune Turismo & Agricoltura nell'Alta Valle Isarco 2012-2013 - Progetto parziale Associazione turistica Racines
- 039 Progetto comune Turismo & Agricoltura nell'Alta Valle Isarco 2012-2013 - Progetto parziale Associazione turistica Collo Isarco
- 040 Valorizzazione/Sistemazione piazza per sagre Colle Isarco
- 041 Sistemazione della piazza del paese a Stilves
- 042 Risanamento straordinario sentiero „Strassberg – Platzhof“
- 043 Risanamento straordinario sentiero „Oberried – Larchhof“
- 044 Risanamento straordinario sentiero „Thuiner Kirchsteig“
- 045 Realizzazione di un parco naturalistico con campo giochi a Novale
- 046 Ampliamento della strada d'accesso S. Antonio – 3° lotto
- 047 Realizzazione di un stabilimento per legno a Racines

Bis zum 31.12.2012 konnten folgende Projekte vollständig abgeschlossen und abgerechnet werden:

- 015 Errichtung eines Wandersteiges Lochen-St. Anton
- 016 Ausbau Zufahrtsstraße St. Anton (Brenner)
- 018 Errichtung eines Parkplatzes und Außengestaltung beim Sporthaus in der Sportzone "Grube" in Pfitsch
- 019 Neuerrichtung Wandersteig Vallerjöch
- 020 Außerordentliche Instandsetzung Wandersteig Kreuzweg Silbergasse/Moosgasse
- 021 Arbeitskreis WippSCHAF
- 022 Ratschingser Almweg - 2. Baulos
- 023 Neugestaltung des Bahnhofplatzes in Franzensfeste
- 024 Ausbau der Zufahrtsstraße St. Anton - 2. Baulos
- 025 Dorfplatz Wiesen
- 026 Sanierung historischer Gassen in Kematen
- 027 LAG-Management - LAG Wipptal 2007-2013 - Teilprojekt Jahr 2011

Fino al 31.12.2012 i seguenti progetti sono stati conclusi e rendicontati completamente.

- 015 Realizzazione di un sentiero Lochen-S. Antonio
- 016 Ampliamento via di accesso S. Antonio (Brennero)
- 018 Realizzazione di un parcheggio e valorizzazione delle strutture esterne della Casa dello sport nella zona sportiva "Fossa" in Val di Vizze
- 019 Rifacimento del sentiero Giogo di Valles
- 020 Risanamento straordinario del sentiero Kreuzweg Silbergasse/Moosgasse
- 021 Gruppo di lavoro WippSCHAF
- 022 Sentiero delle malghe Racines - 2° lotto
- 023 Valorizzazione del piazzale della stazione a Fortezza
- 024 Ampliamento della strada d'accesso S. Antonio - 2° lotto
- 025 Piazza del paese di Prati (Val di Vizze)
- 026 Risanamento di sentieri storici a Caminata (Val di Vizze)
- 027 GAL-Management - GAL Alta Valle Isarco 2007-2013 - Progetto parziale anno 2011

Mit 31.12.2013 befanden sich folgende Projekte in Umsetzung:

- 013 Errichtung eines naturkundlichen Wanderweges am Rosskopf
- 014 Landschaftspflegearbeiten „Lahnergasse“
- 029 Errichtung einer naturnahen Erholungszone „Öttl“ (Gemeinde Brenner - Pflersch)
- 030 Errichtung eines naturkundlichen Wandersteiges Egg-Penserjoch (Gemeinde Freienfeld)
- 031 Erlebnisweg Wasser am Rosskopf (Gemeinde Sterzing)
- 032 LAG-Management - LAG Wipptal 2007-2013 - Teilprojekt Jahr 2012
- 034 Programma territoriale Bandiere Arancioni Alto Adige
- 035 Sarntaler Hufeisentour - Ganzheitliche Vermarktung der Sarntaler Alpen
- 036 Qualitätsprodukte & ländlicher Tourismus - Professionalisierung der Vermarktung lokaler Qualitätsprodukte - Kräutergärten Wipptal & Biohof Waldförster
- 037 Gemeinschaftsprojekt Tourismus & Landwirtschaft im Wipptal 2012-2013 - Teilprojekt Tourismusverein Sterzing
- 039 Gemeinschaftsprojekt Tourismus & Landwirtschaft im Wipptal 2012-2013 - Teilprojekt Tourismusverein Gossensass
- 040 Aufwertung/Gestaltung Festplatz Gossensass
- 041 Dorfplatzgestaltung Stilfes
- 042 Außerordentliche Instandhaltung Wandersteig „Strassberg - Platzhof“
- 043 Außerordentliche Instandhaltung Wandersteig „Oberried - Larchhof“
- 044 Außerordentliche Instandhaltung Wandersteig „Thuiner Kirchsteig“
- 045 Gestaltung eines naturnahen Parks mit Kinderspielplatz in Ried
- 046 Ausbau der Zufahrtsstraße St. Anton - 3. Baulos
- 048 LAG-Management - LAG Wipptal 2007-2013 Teilprojekt Jahr 2013
- 049 Sterzinger Bauernmarkt - Aufbau 2013
- 050 Gemeinschaftsprojekt Tourismus & Landwirtschaft im Wipptal 2013 - Teilprojekt Tourismusverein Ratschings
- 051 Gemeinschaftsprojekt Tourismus & Landwirtschaft im Wipptal 2013 - Teilprojekt Tourismusverein Sterzing
- 052 Errichtung eines Bienenlehrpfades auf bestehenden Wegen

Al 31.12.2013 i seguenti progetti erano in corso di effettiva esecuzione:

- 013 Realizzazione di un sentiero naturalistico al Monte Cavallo
- 014 Attività di tutela del paesaggio "Lahnergasse"
- 029 Realizzazione di una zona ricreativa "Öttl" (Comune di Brennero - Val di Fleres)
- 030 Realizzazione di un sentiero naturalistico Dosso-Passo Pennes (Comune di Campo di Trens)
- 031 Sentiero naturalistico sull'acqua sul Monte Cavallo (Comune di Vipiteno)
- 032 GAL-Management - GAL Alta Valle Isarco 2007-2013 - Progetto parziale anno 2012
- 034 Programma territoriale Bandiere Arancioni Alto Adige
- 035 Tour Ferro di Cavallo - Promozione complessiva delle Alpi Sarentine
- 036 Prodotti di qualità & turismo rurale - professionalizzazione della commercializzazione di prodotti locali di qualità - Kräutergärten Wipptal & Biohof Waldförster
- 037 Progetto comune Turismo & Agricoltura nell'Alta Valle Isarco 2012-2013 - Progetto parziale Associazione turistica Vipiteno
- 039 Progetto comune Turismo & Agricoltura nell'Alta Valle Isarco 2012-2013 - Progetto parziale Associazione turistica Colle Isarco
- 040 Valorizzazione/Sistemazione piazza per sagre Colle Isarco
- 041 Sistemazione della piazza del paese a Stilves
- 042 Risanamento straordinario sentiero "Strassberg - Platzhof"
- 043 Risanamento straordinario sentiero "Oberried - Larchhof"
- 044 Risanamento straordinario sentiero "Thuiner Kirchsteig"
- 045 Realizzazione di un parco naturalistico con campo giochi a Novale
- 046 Ampliamento della strada d'accesso S. Antonio - 3° lotto
- 048 GAL-Management - GAL Alta Valle Isarco 2007-2013 - Progetto parziale anno 2013
- 049 Mercato dei contadini Vipiteno - creazione/assetto 2013
- 050 Progetto comune Turismo & Agricoltura nell'Alta Valle Isarco 2013 - Progetto parziale Associazione turistica Racines
- 051 Progetto comune Turismo & Agricoltura nell'Alta Valle Isarco 2013 - Progetto parziale Associazione turistica Vipiteno

zwischen Trens und Valgenäun - 3. Baulos 013 Errichtung eines naturkundlichen Wanderweges am Rosskopf - Variante 014 Landschaftspflegearbeiten „Lahnergasse“ - Variante 031 Erlebnisweg Wasser am Rosskopf - Variante 053 Renaturierung Mühlbachl und Sanierung einer historischen Mühle in Wiesen 054 Errichtung Dorfpark Mareit - 1. Baulos: Pavillon 055 LAG-Management - LAG Wipptal 2007-2013 Teilprojekt Jahre 2014-2015 056 Gemeinschaftsprojekt Tourismus & Landwirtschaft im Wipptal - Erste Wipptaler Genuss-Tage 2014	052 Realizzazione di un sentiero didattico sull'apicoltura su sentieri esistenti fra Campo di Trens e Valgenauna – 3° lotto 013 Realizzazione di un sentiero naturalistico al Monte Cavallo - Variante 014 Attività di tutela del paesaggio “Lahnergasse” - Variante 031 Sentiero naturalistico sull'acqua sul Monte Cavallo - Variante 053 Rinaturalizzazione Rio Mulini e risanamento di un mulino storico a Prati 054 Realizzazione del parco del paese di Mareta – 1° lotto: padiglione 055 GAL-Management – GAL Alta Valle Isarco 2007-2013 - Progetto parziale anni 2014-2015 056 Progetto comune Turismo & Agricoltura nell'Alta Valle Isarco - Prime Giornate del Gusto dell'Alta Valle Isarco 2014

Bis zum 31.12.2013 konnten folgende Projekte vollständig abgeschlossen und abgerechnet werden:

- 012 Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten Wanderweg Maiern-Burkhardklamm
- 028 Errichtung eines Bienenlehrpfades auf bestehenden Wegen zwischen Trens und Valgenäun
- 033 Dorfplatzgestaltung Gasteig (Gemeinde Ratschings)
- 038 Gemeinschaftsprojekt Tourismus & Landwirtschaft im Wipptal 2012-2013 - Teilprojekt Tourismusverein Ratschings
- 047 Errichtung eines Holzlagars mit Flugdach in Ratschings

Fino al 31.12.2013 i seguenti progetti sono stati conclusi e rendicontati completamente.

- 012 Manutenzione straordinaria sentiero Masseria-Burkhardklamm
- 028 Realizzazione di un sentiero didattico sull'apicoltura su sentieri esistenti fra Campo di Trens e Valgenauna
- 033 Sistemazione della piazza del paese Casateia (Racines)
- 038 Progetto comune Turismo & Agricoltura nell'Alta Valle Isarco 2012-2013 - Progetto parziale Associazione turistica Racines
- 047 Realizzazione di un stabilimento per legno a Racines

2. Finanzielle Umsetzung des Lokalen Aktionsplans Wipptal

2.1 Vom Lokalen Aktionsplan vorgesehene öffentliche Beiträge

Insgesamt sieht der Lokale Aktionsplan Wipptal öffentliche Beiträge in Höhe von **3.763.487,00 €** vor.

Für das **Jahr 2008** sah der Lokale Aktionsplan Wipptal öffentliche Beiträge in Höhe von **70.000,00 €** vor.

Für das **Jahr 2009** sah der Lokale Aktionsplan Wipptal öffentliche Beiträge in Höhe von **195.000,00 €** vor.

Für das **Jahr 2010** sah der Lokale Aktionsplan Wipptal öffentliche Beiträge in Höhe von **462.656,00 €** vor.

Für das **Jahr 2011** sah der Lokale Aktionsplan Wipptal öffentliche Beiträge in Höhe von **508.570,58 €** vor.

Für das **Jahr 2012** sah der Lokale Aktionsplan Wipptal öffentliche Beiträge in Höhe von **1.401.389,20 €** vor.

Für das **Jahr 2013** sah der Lokale Aktionsplan Wipptal öffentliche Beiträge in Höhe von **1.125.871,22 €** vor.

Bis zum 31.12.2013 sah der Lokale Aktionsplan Wipptal öffentliche Beiträge in Höhe von **3.763.487,00 €** vor.

2. Esecuzione finanziaria del Piano di Sviluppo Locale Wipptal

2.1 Spesa pubblica prevista dal Piano di Sviluppo Locale

Complessivamente il Piano di Sviluppo Locale Wipptal prevede una spesa pubblica di **3.763.487,00 €**.

Per l'**anno 2008** il Piano di Sviluppo Locale Wipptal prevede una spesa pubblica di **70.000,00 €**.

Per l'**anno 2009** il Piano di Sviluppo Locale Wipptal prevede una spesa pubblica di **195.000,00 €**.

Per l'**anno 2010** il Piano di Sviluppo Locale Wipptal prevede una spesa pubblica di **462.656,00 €**.

Per l'**anno 2011** il Piano di Sviluppo Locale Wipptal prevede una spesa pubblica di **508.570,58 €**.

Per l'**anno 2012** il Piano di Sviluppo Locale Wipptal prevede una spesa pubblica di **1.401.389,20 €**.

Per l'**anno 2013** il Piano di Sviluppo Locale Wipptal prevede una spesa pubblica di **1.125.871,22 €**.

Fino al 31.12.2013 il Piano di Sviluppo Locale Wipptal prevede una spesa pubblica di **3.763.487,00 €**.

2.2 Von der LAG genehmigte öffentliche Beiträge

Im **Jahr 2008** wurden von der LAG Wipptal öffentliche Beiträge in Höhe von **190.000,00 €** genehmigt.

Im **Jahr 2009** wurden von der LAG Wipptal öffentliche Beiträge in Höhe von **946.284,30 €** genehmigt.

Im **Jahr 2010** wurden von der LAG Wipptal öffentliche Beiträge in Höhe von **1.161.140,00 €** genehmigt.

Im **Jahr 2011** wurden von der LAG Wipptal öffentliche Beiträge in Höhe von **128.000,00 €** genehmigt.

Im **Jahr 2012** wurden von der LAG Wipptal öffentliche Beiträge in Höhe von **1.109.987,00 €** genehmigt.

Im **Jahr 2013** wurden von der LAG Wipptal öffentliche Beiträge in Höhe von **789.558,17 €** genehmigt.

Insgesamt wurden von der LAG Wipptal somit **bis zum 31.12.2013** öffentliche Beiträge in Höhe von **4.324.969,48 €** genehmigt. Hierbei sind auch jene Beiträge berücksichtigt, die im Hinblick auf effektiv erfolgte bzw. zu erwartende Einsparungen wieder verfügbar wurden bzw. werden.

2.2 Spesa pubblica ammessa dal GAL

Nell'anno **2008** sono state approvate spese pubbliche di **190.000,00 €** dal GAL Alta Valle Isarco.

Nell'anno **2009** sono state approvate spese pubbliche di **946.284,30 €** dal GAL Alta Valle Isarco.

Nell'anno **2010** sono state approvate spese pubbliche di **1.161.140,00 €** dal GAL Alta Valle Isarco.

Nell'anno **2011** sono state approvate spese pubbliche di **128.000,00 €** dal GAL Alta Valle Isarco.

Nell'anno **2012** sono state approvate spese pubbliche di **1.109.987,00 €** dal GAL Alta Valle Isarco.

Nell'anno **2013** sono state approvate spese pubbliche di **789.558,17 €** dal GAL Alta Valle Isarco.

Complessivamente **fino al 31.12.2013** il GAL Alta Valle Isarco ha quindi ammesso spese pubbliche di **4.324.969,48 €**. In queste sono anche considerate le spese pubbliche che effettivamente sono andate in economia o andranno in economia nell'ambito di future rendicontazioni.

2.3 Prozentueller Fortschritt im Hinblick auf die vorgesehenen und genehmigten öffentlichen Beiträge 2008 bis 2013

Auf der Basis der Annahme, dass der Start der Umsetzung des Programms zögerlicher erfolgen wird, wurden für 2008 nur begrenzte Finanzmittel vorgesehen.

Entgegen dieser Annahme konnten die im Lokalen Aktionsplan für das **Jahr 2008** eingeplanten öffentlichen Beiträge **um +171% überschritten** werden.

Für das **Jahr 2009** konnten die im Lokalen Aktionsplan eingeplanten öffentlichen Beiträge **um +104% überschritten** werden.

Für das **Jahr 2010** wurden die im Lokalen Aktionsplan eingeplanten öffentlichen Beiträge **um -2% nicht erreicht**.

Für das **Jahr 2011** wurden die im Lokalen Aktionsplan eingeplanten öffentlichen Beiträge **um -82% nicht erreicht**.

Für das **Jahr 2012** wurden die im Lokalen Aktionsplan eingeplanten öffentlichen Beiträge **um -20% nicht erreicht**.

Für das **Jahr 2013** wurden die im Lokalen

2.3 Percentuale di avanzamento in riferimento alle spese pubbliche previste e ammesse dal 2008 al 2013

Sulla base dell'ipotesi che l'avviamento del programma possa avvenire più lentamente, per l'anno 2008 sono state previste spese pubbliche limitate.

Contrariamente a questa ipotesi le spese pubbliche previste nel Piano di Sviluppo Locale per l'anno **2008** sono state **superate del +171%**.

Per l'anno **2009** le spese pubbliche previste nel Piano di Sviluppo Locale sono state **superate del +104%**.

Per l'anno **2010** le spese pubbliche previste nel Piano di Sviluppo Locale **non sono state raggiunte del -2%**.

Per l'anno **2011** le spese pubbliche previste nel Piano di Sviluppo Locale **non sono state raggiunte del -82%**.

Per l'anno **2012** le spese pubbliche previste nel Piano di Sviluppo Locale **non sono state raggiunte del -20%**.

Aktionsplan eingeplanten öffentlichen Beiträge **um - 29% nicht erreicht**.

Insgesamt konnten die **bis 31.12.2013** im Lokalen Aktionsplan eingeplanten öffentlichen Beiträge jedoch **um +14,9% überschritten** werden.

Damit hat die LAG Wipptal **bis zum 31.12.2013** insgesamt **114,9%** der im Lokalen Aktionsplan verfügbaren öffentlichen Beiträge genehmigt.

Die **Überbuchung in Höhe von 14,9%** berücksichtigt jene Beiträge, die im Hinblick auf effektiv erfolgte bzw. zu erwartende Einsparungen wieder verfügbar wurden bzw. werden.

Bis zum 31.12.2013 ergibt sich daraus in den einzelnen Maßnahmen folgender Umsetzungsstand in Bezug auf die verfügbaren öffentlichen Beiträge:

M111

genehmigter Beitrag **75.245,20€**
entspricht **100%** des verfügbaren Beitrages in Höhe von **75.245,20 €**

M123

genehmigter Beitrag **72.579,30€**
entspricht **103,7%** des verfügbaren Beitrages in Höhe von **70.000,00 €**
Aufgrund von Minderausgaben in abgerechneten Projekten konnte diese Überbuchung abgedeckt werden.

M124

Maßnahme wurde im Zuge der Änderung des Finanzplans deaktiviert.

M313/A

genehmigter Beitrag **1.038.233,17€**
entspricht **111,0%** des verfügbaren Beitrages in Höhe von **935.000,00 €**
Aufgrund von erwarteten Minderausgaben in abgerechneten oder in Umsetzung befindlichen Projekten konnte diese Überbuchung abgedeckt werden.

M313/B

Maßnahme wurde im Zuge der Änderung des Finanzplans deaktiviert.

M313/C

genehmigter Beitrag **352.503,00€**
entspricht **117,5%** des verfügbaren Beitrages in Höhe von **300.000,00 €**
Aufgrund von erwarteten Minderausgaben in abgerechneten oder in Umsetzung befindlichen Projekten konnte diese Überbuchung abgedeckt werden.

M322

genehmigter Beitrag **2.206.504,00€**
entspricht **120,7%** des verfügbaren Beitrages in Höhe von **1.828.241,80€**
Aufgrund von erwarteten Minderausgaben in abgerechneten oder in Umsetzung befindlichen

Per **l'anno 2013** le spese pubbliche previste nel Piano di Sviluppo Locale **non sono state raggiunte del - 29%**.

Complessivamente però le spese pubbliche previste nel Piano di Sviluppo Locale **fino al 31.12.2013 sono state superate del +14,9%**.

Con ciò il GAL Alta Valle Isarco **fino al 31.12.2013** ha ammesso **114,9%** delle spese pubbliche previste complessivamente nel Piano di Sviluppo Locale.

L'**overbooking del 14,9%** considera anche le spese pubbliche che effettivamente sono andate in economia o andranno in economia nell'ambito di future rendicontazioni.

Fino al 31.12.2013 nelle singole misure risulta quindi il seguente stato di avanzamento in riferimento alle spese pubbliche disponibili:

M111

contributo ammesso **75.245,20 €**
corrisponde al **100%** delle spese pubbliche disponibili **di € 75.245,20**

M123

contributo ammesso **72.579,30€**
corrisponde al **103,7%** delle spese pubbliche disponibili **di € 70.000,00**
Sulla base di risparmi su progetti rendicontati era possibile recuperare il sovraccarico della misura.

M124

misura disattivata nell'ambito della variazione del piano finanziario del PAL

M313/A

contributo ammesso **1.038.233,17€**
corrisponde al **111,0%** delle spese pubbliche disponibili **di € 935.000,00**
Sulla base di risparmi aspettati su progetti rendicontati o in fase di realizzazione era possibile recuperare il sovraccarico della misura.

M313/B

misura disattivata nell'ambito della variazione del piano finanziario del PAL

M313/C

contributo ammesso **352.503,00 €**
corrisponde al **117,5%** delle spese pubbliche disponibili **di € 300.000,00**
Sulla base di risparmi aspettati su progetti rendicontati o in fase di realizzazione era possibile recuperare il sovraccarico della misura.

M322

contributo ammesso **2.206.504,00€**
corrisponde al **120,7%** delle spese pubbliche disponibili **di € 1.828.241,80**

Projekten konnte diese Überbuchung abgedeckt werden.

M421

genehmigter Beitrag **55.000,00€**

entspricht **100,0%** des verfügbaren Beitrages in Höhe von **55.000,00 €**

M431

genehmigter Beitrag **525.000,00€**

entspricht **105,0%** des verfügbaren Beitrages in Höhe von **500.000,00 €**.

Aufgrund von erwarteten Minderausgaben in abgerechneten oder in Umsetzung befindlichen Projekten konnte diese Überbuchung abgedeckt werden.

Sulla base di risparmi aspettati su progetti rendicontati o in fase di realizzazione era possibile recuperare il sovraccarico della misura.

M421

contributo ammesso **55.000,00€**

corrisponde allo **100,0%** delle spese pubbliche disponibili **di € 55.000,00**

M431

contributo ammesso **525.000,00 €**

corrisponde al **105,0%** delle spese pubbliche disponibili **di € 500.000,00**

Sulla base di risparmi aspettati su progetti rendicontati o in fase di realizzazione era possibile recuperare il sovraccarico della misura.

3. Von der LAG getroffene Vorkehrungen, um eine entspr. Qualität und Effizienz in der Umsetzung zu gewährleisten

3.1 Im Rahmen der Umsetzung des LAP festgestellte Problemstellungen

Entgegen der Annahme im Zuge der Finanzplanung im Lokalen Aktionsplan hat die Umsetzung des Programms wesentlich schneller angezogen als erwartet.

Probleme in der Umsetzung haben sich im Rahmen der Maßnahme 124 ergeben, zumal es sehr schwer ist, in ländlich geprägten Gebieten Projekte zu finden, die dem Anspruch an Innovation der Maßnahme entsprechen. Aus diesem Grund und auch auf Anregung der verantwortlichen Stellen der Autonomen Provinz Bozen wurde deshalb auch das Budget in dieser Maßnahme 124 im Zuge der letzten Änderung des Finanzplans am 31.01.2012 zugunsten anderer Maßnahmen gänzlich gestrichen.

Probleme in der Umsetzung haben sich auch durch die Unsicherheiten im Bezug auf die Finanzierung der MwSt. für öffentliche Träger ergeben, zumal dies einen wesentlich höheren Finanzierungsaufwand bedeutet als ursprünglich angenommen. Diese Unsicherheit konnte aber durch einen entsprechenden Beschluss der Landesregierung und die Einführung eines eigenen Fonds beseitigt werden. Hierbei wurde jedoch verabsäumt, auch private Träger, welche die MwSt. nicht absetzen können, in den Genuss des Zusatzfonds für die MwSt. kommen zu lassen.

Auch im Hinblick auf die Umsetzung von Inhalten in der Maßnahme 313/A wurde bereits zu Beginn des Programms festgestellt, dass diese Maßnahme keine Projekte von privaten Trägern im öffentlichen Interesse vorsieht. Wird das Programm restriktiv interpretiert, so wäre ausschließlich die Abteilung Forstwirtschaft befugt, Projekte umzusetzen und sogar Gemeinden wären von einer Förderung

3. Disposizioni prese dal GAL per assicurare la qualità e l'efficienza dell'esecuzione

3.1 Difficoltà riscontrate nella gestione del Piano di Sviluppo Locale

Contrariamente all'ipotesi nell'ambito della pianificazione finanziaria del Piano di Sviluppo Locale l'attuazione del programma è cominciata più rapidamente del previsto.

Sono state riscontrate delle difficoltà nella gestione della misura 124 siccome è molto difficile trovare progetti nelle zone rurali che corrispondano al carattere innovativo della misura. Per questo motivo e seguendo il consiglio degli enti responsabili della Provincia Autonoma di Bolzano è stato tolto completamente il budget di questa misura 124 a favore di altre misure del programma.

Difficoltà nella gestione del Piano di Sviluppo Locale sono anche state riscontrate a causa delle incertezze relative al finanziamento dell'IVA per soggetti pubblici. Questo comporterebbe spese di finanziamento molto più alte del previsto. Questa incertezza però è stata risolta attraverso una delibera della giunta provinciale in merito e l'allestimento di un apposito fondo. In questo riferimento non sono però stati considerati titolari privati di progetto, che non hanno la possibilità di dedurre l'IVA e che a tutt'oggi non hanno accesso al fondo aggiuntivo per l'IVA.

Anche in riguardo alla realizzazione di contenuti nella misura 313/A già all'inizio del programma è stato constatato, che la misura non prevede progetti da parte di soggetti privati che operano nell'interesse pubblico. Se il programma viene interpretato in modo restrittivo solo la Ripartizione Foreste sarebbe autorizzata a svolgere progetti e che addirittura comuni non

ausgeschlossen. Insbesondere im Bereich der Schaffung von Strukturen für einen besseren Zugang zum Naturraum und von Naherholungsstrukturen für Einheimische und Gäste sollte auch die Möglichkeit von Trägerschaften durch private Organisationen (z.B. Tourismusorganisationen) berücksichtigt werden, sofern diese Aktivitäten im öffentlichen Interesse durchführen. Dies würde zudem bewirken, dass die Forstverwaltung und auch Gemeinden finanziell, administrativ und personell entlastet würden.

In allen aktiven Maßnahmen des Lokalen Aktionsplans wurde mit 2013 das Gesamtbudget der jeweiligen Maßnahme erreicht bzw. überschritten. Aufgrund von erwarteten Einsparungen im Rahmen von bereits abgerechneten bzw. Projekten in Umsetzung konnte diese Überbuchung aufgefangen werden. Im Zuge der weiteren Umsetzung des Lokalen Aktionsplans kann dies jedoch gegen Programmende hin zu einem Problem werden, da die Einsparungen aus laufenden Projekten nicht bekannt sind und die LAG gleichzeitig faktisch vorliegende aber auf dem Papier nicht nachweisbare Mittel nicht vorab delegieren kann. Es kann also erwartet werden, dass es der LAG aufgrund dieser Tatsache nicht gelingen wird, die gesamten Fördermittel vollständig auszuschöpfen.

Im Zuge der Umsetzung des Lokalen Aktionsplans konnte festgestellt werden, dass insbesondere die Umsetzung kleiner Projekteinheiten in den Maßnahmen 111 sowie 313/C vonseiten privater Träger und Organisationen aufgrund der einschlägigen Regelungen zur Vergabe von Aufträgen einem erheblichen Verwaltungsaufwand unterliegen: Die Tatsache, dass für die Vergabe von Aufträgen jeweils mindestens drei Vergleichsangebote eingeholt werden müssen und dass die Auswahl im Zuge der Abrechnung entsprechend zu begründen ist (insb. in jenen Fällen, wo eine Auswahl auf der Basis von drei Angeboten nicht möglich ist), lässt den Verwaltungsaufwand zur Abwicklung der Projekte im Vergleich zu deren finanziellen Umfang unverhältnismäßig hoch anwachsen. Dies wird dadurch verstärkt, dass die einschlägigen Regelungen zur Vergabe von Aufträgen kein unteres Limit für die Pflicht der Vergleichsangebote zur Auftragsvergabe vorsehen.

Vor allem private Organisationen, die normalerweise keinen offiziellen Vergabebestimmungen unterliegen, können mit diesen Vorgaben nur schwer umgehen, obwohl sie in der Umsetzung ihrer Projekte – auch im eigenen Interesse – stets die Prinzipien der Wirtschaftlichkeit und Transparenz verfolgen. Vonseiten der lokalen Akteure wird deshalb vehement gefordert, den Verwaltungsaufwand für die Umsetzung der Projekte in Relation zu den umgesetzten Summen zu stellen und insbesondere bei kleinen Projekten, die jedoch für die lokale Entwicklung oft einen hohen Wert haben, zu reduzieren. Die Einführung einer unteren Schwelle, ab welcher erst mehrere Angebote eingeholt und die Auswahl entsprechend begründet werden muss, könnte ein erster Schritt hierzu sein.

potrebbero essere beneficiari della misura. Soprattutto nell'ambito della creazione di strutture per un accesso migliorato alla natura e di strutture ricreative per residenti ed ospiti sarebbe opportuno di prendere in considerazione anche la possibilità di titolari del settore privato, sempre se svolgono delle attività nel pubblico interesse. Questo inoltre sortirebbe uno sgravio dell'amministrazione forestale e anche dei comuni dal punto di vista finanziario, amministrativo e personale.

In tutte le misure attive del Piano di Sviluppo Locale nel 2013 è stata raggiunta/superata la somma complessiva della rispettiva misura. Sulla base di economie aspettate nell'ambito di progetti già rendicontati o in fase di realizzazione era possibile recuperare i fondi necessari per la copertura totale delle attività approvate. Nell'ambito dello svolgimento futuro del Piano d'Azione Locale questa questione può però creare dei problemi, siccome i risparmi da progetti in corso non sono ancora noti ed il GAL non può approvare in anticipo fondi di fatto disponibili ma non dimostrati in forma cartacea. C'è quindi da aspettarsi che al GAL non sarà possibile sfruttare l'ammontare intero dei fondi disponibili.

Nell'ambito dell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale si è potuto constatare, che soprattutto la realizzazione di progetti di piccole dimensioni nelle misure 111 nonché 313/C da parte di titolari ed organizzazioni private – sulla base dei regolamenti vigenti in merito all'assegnazione di incarichi – comporta notevoli sforzi burocratici: il fatto che l'affidamento di lavori o servizi necessari almeno di tre offerte e che la scelta fatta debba essere esplicitamente motivata nell'ambito della rendicontazione (soprattutto nei casi, dove la scelta sulla base di tre offerte non era possibile) fa crescere lo sforzo amministrativo in modo sproporzionato in relazione alla dimensione finanziaria dei progetti stessi. Questo effetto viene intensificato dal fatto che le linee guida per l'ammissibilità della spesa nell'ambito dello sviluppo rurale non prevedono un limite minimo per la richiesta di più preventivi.

In particolare le organizzazioni private, che di solito non sono soggette alla normativa sugli appalti, incontrano delle difficoltà nell'applicare queste regole, anche se nell'ambito della realizzazione dei progetti – anche per interessi propri – rispettano sempre i principi dell'economicità e della trasparenza. Da parte degli attori locali viene perciò decisamente richiesto di orientare le necessità amministrative all'entità delle spese realizzate e con ciò di ridurre la burocrazia soprattutto per progetti di piccole dimensioni, che dall'altra parte hanno spesso un grande valore di sviluppo. L'introduzione di una soglia minima, a partire dalla quale devono essere richieste più offerte e deve essere motivata la scelta, potrebbe essere un primo passo in questa direzione.

3.2 Informationsmaßnahmen für eine angemessene Öffentlichkeitsarbeit und Information potentieller Begünstigter

Zur Information potentieller Begünstigter hat die LAG Wipptal folgende Maßnahmen ergriffen:

- Abhaltung einer Auftaktveranstaltung zum LEADER-Programm am 05.05.2009 in Sterzing
- Abhaltung des Lokalaugenscheins für den Begleitausschuss zum ELR am 04.06.2010
- Abhaltung verschiedenster Informationstreffen bzw. direkte Auskunft an Begünstigte durch die GRW Wipptal m.b.H.
- Veröffentlichung von Artikeln zu Projekten in der lokale Presse
- Animation der Projektträger zu einer aktiveren Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Umsetzung und nach Abschluss der Projekte
- Einrichtung/Ausweitung von eigenen Inhalten zum LEADER-Programm 2007-2013 im Wipptal im Internet – seit September 2013 auch in italienischer Sprache

3.2 Informazioni volte al dare adeguata pubblicità al PSL ed informare potenziali beneficiari

Per l'informazione di potenziali beneficiari il GAL ha intrapreso seguenti provvedimenti:

- Organizzazione di una manifestazione di lancio per il programma LEADER il 05.05.2009 a Vipiteno
- Organizzazione di un sopralluogo per il Comitato di sorveglianza per PSR il 04.06.2010
- Organizzazione di diversi incontri informativi risp. informazioni dirette a beneficiari da parte della GRW Wipptal a r.l.
- Pubblicazione di articoli su progetti nella stampa locale
- Animazione dei titolari dei progetti per una informazione e divulgazione più attiva nell'ambito dello svolgimento e dopo la conclusione dei progetti
- Allestimento/allargamento di contenuti specifici per il programma LEADER 2007-2013 nell'Alta Valle Isarco su internet – da settembre 2013 anche in lingua italiana

4. Analyse der Ergebnisse in der Umsetzung des Lokalen Aktionsplans

Entgegen den ursprünglichen Annahmen im Rahmen der Planung des Lokalen Aktionsplans 2007-2013 konnten die verschiedenen Initiativen wesentlich schneller gestartet werden. Insgesamt wurden bis Ende 2009 doppelt so viele Mittel verpflichtet und Projekte delegiert als im Lokalen Aktionsplan ursprünglich veranschlagt.

Dieser Trend hat sich im Jahr 2010 fortgesetzt, ist jedoch etwas abgeflacht. Im Jahr 2011 waren die Delegierungen vonseiten der LAG im Vergleich zum Geplanten stark rückläufig. Mit der Delegierung von 16 weiteren Förderprojekten mit einer Gesamtsumme an Beiträgen von 1.108.763,00€ konnte der Rückstand aus dem Jahr 2011 wieder wett gemacht werden.

Damit lag die LAG Wipptal mit 2011 in der Umsetzung des Lokalen Aktionsplans 2007-2013 mit einem entsprechenden Vorsprung in den Verpflichtung der öffentlichen Beiträge von rund 30% wieder auf Kurs.

Aufgrund der rückläufigen und z.T. aufwändigen Abrechnungen der laufenden Förderprojekte, insb. von öffentlichen Trägern, ist es letztendlich nicht gelungen, das gesamte Programm bereits mit 2013 abzuschließen und vollständig abzurechnen.

Dies bekräftigt nach wie vor, dass es weiterhin zu

4. Analisi degli esiti nell'ambito dell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale

Contrariamente alle ipotesi originarie nell'ambito della pianificazione del Piano d'Azione Locale 2007-2013 le diverse iniziative sono state avviate prima del previsto. Complessivamente fino alla fine del 2009 è stato impegnato il doppio dei fondi previsti e sono stati avviati il doppio dei progetti previsti nel Piano d'Azione Locale.

Questa tendenza è proseguita anche nell'anno 2010 dove però si è ridotta. Nell'anno 2011 le approvazioni da parte del GAL erano molto ridotte in confronto a quanto pianificato. Con l'approvazione di ulteriori 16 progetti con una somma complessiva di contributi di 1.108.763,00€ questo ritardo dell'anno 2011 è stato recuperato completamente.

Con ciò il GAL Alta Valle Isarco con l'anno 2011 era di nuovo sulla rotta giusta nello svolgimento del Piano d'azione locale con un rispettivo anticipo nell'approvazione di contributi pubblici del 30%.

A causa delle rendicontazioni in regresso e in parte anche laboriose dei progetti in fase di realizzazione, soprattutto progetti di titolari pubblici, alla fine non era possibile concludere e rendicontare l'intero programma entro il 2013.

Questo conferma come prima che è da prendere in considerazione che lo stato dei fondi impegnati non è

beachten gilt, dass der alleinige Stand der Delegierungen noch keine Garantie einer raschen Umsetzung ist. Im Hinblick auf die Realisierung der einzelnen geplanten Vorhaben gilt es nach dem relativ guten Start des Programms insbesondere die Umsetzung und Abrechnung der einzelnen Maßnahmen zu forcieren. Dementsprechend hat die LAG Wipptal in den Jahren 2010 bis 2013 deshalb neben der weiteren Anbahnung und Delegierung von Projekten verstärkt auch den zügigen Abschluss bereits laufender Projekte bei den Projektträgern angemahnt und überwacht. 2013 konnten 5 weitere und damit insgesamt 29 Projekte abgeschlossen und abgerechnet werden, wodurch ein effektiver Realisierungsgrad des Programms wie von der LAG Wipptal beabsichtigt von über 50% erreicht werden konnte. Zurzeit befinden sich jedoch noch 27 Projekte in Umsetzung, weshalb im Jahr 2014 der wesentliche Schwerpunkt auf die Anmahnung der Projektträger zu einer zügigen Umsetzung und Abrechnung der Projekte gelegt werden wird.

In Bezug auf die Genehmigungen der von der LAG delegierten Vorhaben vonseiten der Autonomen Provinz Bozen konnte bis auf einige wenige Unklarheiten in den ersten Monaten der Programmlaufzeit keinerlei Probleme oder Verzögerungen festgestellt werden. Es kann sogar festgestellt werden, dass die Genehmigungen von Projekten im Vergleich zum Planungszeitraum 2000-2006 wesentlich schneller ablaufen. Dies kann zum einen auf den direkten Kontakt und die enge Abstimmungsarbeit zwischen der GRW Wipptal, den Projektträgern und den programmverantwortlichen Ämtern zurückgeführt werden, wodurch die Förderfähigkeit und die Vollständigkeit der Gesuchunterlagen bereits a priori sichergestellt werden kann. Die rasche Genehmigung der Projekte ist aber auch maßgeblich von einer professionellen und ausgesprochen engagierten Arbeit der zuständigen Ämter und Verwaltungsbeamten geprägt. In den letzten Monaten mussten jedoch vermehrt Verzögerungen in der Abrechnung und Liquidierung von Beiträgen insbesondere in den Maßnahmen 313/C und 431 festgestellt werden.

Im Rahmen der Umsetzung des LEADER-Programms im Wipptal konnten zudem einige „Problem-Maßnahmen“ identifiziert werden. In Bezug auf eine vollständige Umsetzung des Lokalen Aktionsplans gilt es insbesondere diesen Maßnahmen ein besonderes Augenmerk zu schenken:

Maßnahme 124

Die Anforderungen im Hinblick auf den innovativen Charakter der Maßnahmen und die geforderte Kooperation mit Forschungseinrichtungen ist für stark ländlich geprägte Gebiete, wie es das Wipptal beispielsweise ist, etwas zu hoch gesteckt. Nichts desto trotz bildet die Maßnahme auch einen Anreiz, in ländlichen Gebieten das Thema der Innovation verstärkt aufzugreifen. Deshalb wurde weiterhin versucht, zusammen mit lokalen Akteuren nach

una garanzia per uno svolgimento rapido. In riguardo alla realizzazione delle singole attività previste e sulla base della buona partenza del programma è quindi da accelerare lo svolgimento e la rendicontazione delle singole attività. Per questo motivo a partire dall'anno 2010 fino al 2013 il GAL Alta Valle Isarco, accanto all'ulteriore avviamento di progetti di sviluppo, in confronto ai titolari dei progetti ha raccomandato e controllato soprattutto la conclusione rapida dei progetti in corso. Nel 2013 era possibile concludere ulteriori 5 progetti e quindi sono stati conclusi e rendicontati 29 progetti che portano ad un grado di realizzazione oltre il 50% come previsto dal GAL Alta Valle Isarco. Al momento sono in fase di realizzazione ancora 27 progetti e quindi anche nel 2014 il GAL si concentrerà sulla raccomandazione dei titolari dei progetti in merito ad una realizzazione ed una rendicontazione accelerata dei progetti.

In riferimento all'approvazione dei progetti approvati dal GAL da parte della Provincia Autonoma di Bolzano non possono essere constatati problemi o rallentamenti, tranne qualche incertezza nei primi mesi del programma. Può addirittura essere constatato che l'approvazione dei progetti è notevolmente più rapida in confronto al periodo di programmazione 2000-2006. Questo da una parte può essere ricondotto al contatto diretto e il lavoro di sintonizzazione fra la GRW Wipptal, i titolari dei progetti e gli uffici responsabili, attraverso il quale la finanziabilità degli interventi e la completezza delle domande di finanziamento può essere assicurata in anticipo. L'approvazione rapida dei progetti è però decisamente caratterizzata dal lavoro professionale e impegnato degli uffici ed il personale competente. Negli ultimi mesi si sono però potute constatare delle protrazioni nella rendicontazione e liquidazione di contributi soprattutto nelle misure 313/C e 431.

Nell'ambito dell'attuazione del programma LEADER si sono però potute evidenziare alcune "misure problema". In riferimento allo svolgimento completo del Piano d'Azione Locale è da rivolgere l'attenzione soprattutto a queste misure:

Misura 124

Le pretese in riguardo al carattere innovativo della misura e la cooperazione con strutture di ricerca richieste per territori con forte carattere rurale come l'Alta Valle Isarco sono molto alte. Tuttavia la misura rappresenta uno stimolo per prendere in considerazione il tema dell'innovazione anche in territori rurali. Perciò, assieme ad attori locali anche in seguito si è cercato rispettive idee di progetto però senza il rispettivo successo. Per questo motivo il GAL Alta Valle Isarco nell'ambito dell'ultima variazione del

entsprechenden Projektideen zu suchen, jedoch ohne entsprechendem Erfolg. Die LAG Wipptal hat deshalb im Rahmen einer weiteren Änderung des Finanzplans die gesamten Mittel aus dieser Maßnahme abgezogen.

Maßnahme 313/A

Wie bereits unter Punkt 3.1 festgestellt wurde die LAG Wipptal bereits mehrfach von privaten Organisationen angesprochen, die im Rahmen des LEADER-Programms Projekte zur Realisierung von Naherholungsstrukturen im öffentlichen Interesse realisieren wollten. Aufgrund der Tatsache, dass in dieser Maßnahme private Träger jedoch nicht vorgesehen sind, mussten diese entweder abgelehnt werden oder es wurde nach anderen Möglichkeiten gesucht, um die Trägerschaft zu verändern. Dies hat jedoch meist dazu geführt, dass sich die privaten Initiatoren enttäuscht vom Programm abgewendet und das Interesse an den Initiativen verloren haben. Mit einer Ausweitung der möglichen Trägerschaft von Projekten in dieser Maßnahme würde mit Sicherheit mehr Vielfalt und Dynamik in der Maßnahme erzielt.

Maßnahme 322

Auch in der Maßnahme zur Neubelebung und Entwicklung von Dörfern hat die Umsetzung konkreter Vorhaben relativ spät begonnen. Dies hing entschieden mit den aufwändigen Verwaltungsabläufen bei öffentlichen Bauvorhaben zusammen und wird auch von der Nicht-Finanzierbarkeit der MwSt. negativ beeinflusst. Die Lösung der letzteren Problemstellung hat die Last der Vor- und Restfinanzierung der Vorhaben durch die einzelnen Gemeinden verringert. Bereits in der zweiten Hälfte 2009 konnte auch in dieser Maßnahme ein klarer Aufwärtstrend festgestellt werden, der sich in den Jahren 2010 bis 2013 massiv fortgesetzt hat, sodass bis Ende 2013 alle verfügbaren öffentlichen Mittel in dieser Maßnahme von der LAG verpflichtet werden konnten.

Maßnahme 421

Insbesondere zu Programmbeginn ist es verständlich, dass sich die LEADER-Gebiete verstärkt mit der Anbahnung der eigenen Projekte beschäftigen. Aus diesem Grund stehen interterritoriale Kooperationsprojekte zu Beginn der Planungsperiode eher im Hintergrund. Nichts desto trotz sollte der Ansatz des Austausches und des Know-how-Transfers durch Kooperationsprojekte nicht vernachlässigt werden.

In enger Zusammenarbeit mit den anderen LEADER-Gebieten des Landes wurde insbesondere 2011 und 2012 an einer Serie von Kooperationsprojekten gearbeitet, die Anfang des Jahres 2012 einer Umsetzung zugeführt werden konnten und sich zurzeit noch in Umsetzung befinden.

Öffentlichkeitsarbeit

Durch die schrittweise Fertigstellung der laufenden Projekte entstehen genügend Chancen zur Information und Einbeziehung einer breiten Öffentlichkeit. Dazu sind jedoch auch die einzelnen Projektträger dezidiert aufzufordern, zumal es auch ihre Kompetenz ist, die

piano finanziario ha tolto tutti i fondi da questa misura.

Maßnahme 313/A

Come già menzionato nel punto 3.1 il GAL in passato più volte è stato contattato da organizzazioni private che hanno segnalato la loro volontà di realizzare strutture ricreative nell'interesse pubblico nell'ambito del programma LEADER. A causa del fatto che questa misura non prevede beneficiari privati, le idee di progetto dovevano essere rifiutate o sono state cercate altre possibilità per modificare il titolare. Questo in gran parte ha però provocato che i promotori privati hanno voltato le spalle al programma e hanno perso l'interesse all'iniziativa. Con un allargamento dei beneficiari dei progetti nell'ambito di questa misura si riuscirebbe sicuramente a creare più varietà e dinamica nella misura.

Misura 322

Anche l'attuazione di interventi concreti nella misura per la riqualificazione e lo sviluppo dei villaggi è iniziata piuttosto tardi. Questo è decisamente riconducibile agli iter amministrativi complicati per lavori pubblici e viene influenzato in modo negativo anche dalla non-finanziabilità dell'IVA. La soluzione dell'ultima problematica ha in un certo modo tolto gran parte del peso del prefinanziamento e il finanziamento dei fondi residui dei singoli comuni. Già nella seconda metà del 2009 in questa misura si poteva constatare una chiara tendenza al rialzo che è proseguita in modo deciso anche dal 2010 al 2013. In questo modo fino alla fine del 2013 il GAL ha potuto impegnare tutti i fondi pubblici in questa misura.

Misura 421

Soprattutto all'inizio del programma è comprensibile che i singoli GAL si concentrino maggiormente sull'avviamento dei propri progetti. Per questo motivo progetti di cooperazione interterritoriale all'inizio del periodo di programmazione si tengono in secondo piano. Ciononostante l'approccio dello scambio e del transfer di conoscenze attraverso progetti di cooperazione non deve essere trascurato.

In stretta collaborazione con gli altri territori LEADER della provincia il GAL Alta Valle Isarco ha elaborato una serie di progetti di cooperazione che sono stati portati ad una realizzazione nel corso dell'anno 2012 che attualmente sono ancora in fase di realizzazione.

Pubbliche relazioni

Attraverso il graduale completamento dei progetti in corso nascono abbastanza possibilità per coinvolgere un grande pubblico. Per questo motivo, a fronte della loro competenza, sono da invitare i singoli titolari di progetto a pubblicizzare i propri progetti. Accanto a ciò con la creazione del nuovo sito internet già iniziata nel

Welt der Bienen wandernd entdecken

NATUR: Bienenweg von Trens nach Valgenäun eröffnet – Schautafeln und Imkerstand – Startschuss für das Trens Dorfpest mit 14 Vereinen

TRENS (mf). Die faszinierende Welt der Bienen vermittelt ein neuer Themenweg, der von Trens nach Valgenäun führt. Neben Schautafeln zeigt auch ein Schauraum den Weg von der Blütenpolle bis zum Honig. Der Bienenweg wurde gestern Abend feierlich eröffnet, gleichzeitig fiel der Startschuss für das Trens Dorfpest.

Der Bienenweg wurde auf dem Wanderweg angelegt, der vom Dorfkern Trens in den Weiher Valgenäun führt. Die Mitarbeiter des Forstinspektors Sterzing haben diesen Weg instand gesetzt, auch einige sanierungsbedürftige Trockenmauern wurden wieder hergerichtet. Entlang des rund 1700 Meter langen Weges wurden zwölf Schautafeln aufgestellt, die in übersichtlicher Weise in Wort und Bild über die Welt der Bienen informieren, so etwa über das Bienenvolk, -königin, -haltung und Bienenprodukte.

Am Anfang des Weges wurde ein Schaustand errichtet, in dem die Imkerei im Mittelpunkt steht. Zu sehen sind dort u.a. alle Gerätschaften, die notwendig sind,



Laut Bürgermeister Armin Holzer (ganz rechts) ist der neue Bienenweg eine zusätzliche Attraktion für Trens. Er eröffnete den Weg gemeinsam mit Senator Hans Berger (von rechts), Honigkönigin Lisa Zöschg und dem Obmann des Imkerbezirks Wipptal, Michael Wild.

damit der Honig von der Wabe ins Glas kommt. Nach vorheriger Anmeldung beim Tourismusverein Sterzing bieten der Obmann des Imkerbezirks Wipptal, Michael Wild, und andere Imker Führungen an. „Der Weg ist landschaftlich

schön gelegen und weist nur einen geringen Höhenunterschied auf. So ist er für jeden leicht begehbar. Auch für Kinderwagen ist er geeignet“, sagt Wild. Entlang des Themenweges wurden Bänke und Tische aufgestellt, die zum Verweilen einladen.

Das Vorhaben wurde im Rahmen des europäischen Förderprogrammes Leader umgesetzt. 80 Prozent der Kosten von rund 50.000 Euro wurden über das Leader-Programm abgedeckt, für die übrigen 20 Prozent kamen die Gemeinde Freienfeld

und Sponsoren auf. Bei der gestrigen Eröffnung brachte Wild seine Freude über den neuen Bienenweg zum Ausdruck und dankte allen, die mitgearbeitet haben, den Sponsoren und den Grundbesitzern.

Auch die Ehrengäste, unter ihnen Senator Hans Berger, Bürgermeister Armin Holzer, der stellvertretende Obmann des Südtiroler Imkerbundes, Erich Larcher, HGV-Gebietsobmann Hermann Gögl und Forstinspektor Franz Sigmund lobten den schönen neuen Themenweg, der wertvolles Wissen rund um die Biene vermittelt.

Im Zuge der Feier erfolgte die offizielle Eröffnung des dritten Trens Dorfpests mit dem Fassanstich. 14 Trens Vereine mit dem Präsidenten des Dorfpestkomitees Martin Rainer an der Spitze hatten sich wochenlang darauf vorbereitet, sodass nun am heutigen Samstag und am morgigen Sonntag an zahlreichen Ständen im Dorf allerhand Kulinarisches, Unterhaltsames und Musikalisches geboten wird.

Anschließend ging es vom Dorfplatz zum Imkerstand, wo der Pfarrer von Trens, Paul Neumair, den Bienenweg segnete.

© Alle Rechte vorbehalten

Auf neuem Weg von Alm zu Alm

NATUR: Der zehn Kilometer lange Almenweg in Ratschings wurde gesegnet – Verbindet sieben Almen – In Tagestour leicht zu bewältigen

RATSCHINGS (mf). Auf einem neu angelegten bzw. sanierten Wandersteig von Alm zu Alm: Der neue Almenweg in Ratschings verbindet sieben Almen. Er ist in einer Tagestour leicht zu schaffen und auch für Familien geeignet. Am Samstag segnete Dekan Josef Knapp den Weg.

Ausgangspunkt für den neuen Weg von Alm zu Alm ist die Jauernpassstraße, von wo aus man zunächst die Kalcher Alm erreicht. Von dort geht es weiter zur Rinneralm und zur Wasserfalleralm. Entlang des bestehenden Wanderweges verläuft er weiter zur Saxnerhütte. Die nächsten Almen sind die Äußere und die Innere Wumbalsalm. Der Weg endet schließlich bei der Klamalm auf 1925 Metern Meereshöhe. Von dort gelangt man auf dem markierten Weg Nummer zwölf hinunter nach Flading.

Weitere mögliche Ausgangspunkte für die Begehung des Wegs sind die Bergstation der Bergbahn Ratschings-Jaufen und die Klamalm.

Der Weg weist keine besonderen Schwierigkeiten auf, der Höhenunterschied beträgt 290 Meter, und so bietet sich der Weg auch für Familien an. Die Gehzeit auf dem gesamten Weg beträgt rund vier bis fünf Stunden.




Dekan Josef Knapp segnete beim Wetterkreuz den neuen Almenweg. Tourismusverein Ratschings

Im Zuge eines EU-geförderten Leader-Projektes haben Mitarbeiter des Forstinspektors Sterzing in den Jahren 2010 bis 2012 rund 3000 Meter des Almenwegs ganz neu angelegt. Die bereits bestehenden Abschnitte des Wandersteigs wur-

den saniert. „Bei der Inneren Wumbalsalm zum Beispiel überquert man ein größeres Moos. Hier haben wir Holzstege errichtet, damit man nicht einsinkt“, berichtet Forstinspektor Franz Sigmund.

Insgesamt hat der Weg eine

Der Verlauf des Almenwegs Ratschings

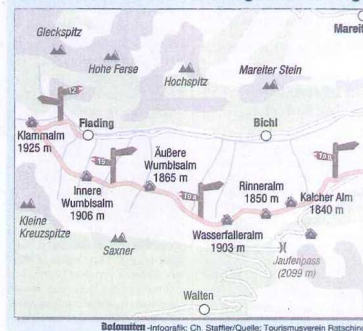

Länge von rund zehn Kilometern und eine Breite von etwa 1,10 Metern. „Er führt durch eine herrliche Landschaft und an mehreren schönen Aussichtspunkten vorbei“, sagt Sigmund. Auf allen Almen mit Ausnahme der Inneren Wumbalsalm gibt es Aufschlag.

Die Kosten für die Neuanlegung und die Sanierung des Wanderwegs betrugen rund 212.000 Euro. Davon wurden 80 Prozent vom Förderprogramm Leader bereitgestellt, für die ü-

brigen 20 Prozent kam der Tourismusverein von Ratschings auf. Am Samstag wurde der Almenweg nun offiziell seiner Bestimmung übergeben. Vertreter des Tourismusvereins, der Gemeindeverwaltung, der Forst, der Hüttenbesitzer und Hoteliers sowie der Interessensschaften gingen gemeinsam ein Stück des Weges bis zum Wetterkreuz beim Seitstein. Dort segnete Dekan Josef Knapp nach den Grußworten der Ehrengäste den neuen Weg.

© Alle Rechte vorbehalten

Fescht! in der Erl

8.9.2013 | 10-17 UHR in Innerpflersch

Bergmarsch
um die Erikönig-Medaille


- » Streckenlänge ca. 8 km
- » Höhendifferenz 500 m
- » Nenngeld 5€

Start: 9 bis 11 Uhr Richtung Furt-alm über den Dolomieu-Weg zur Allrießalm und zurück zum Ausgangspunkt

Wipptaler Handwerk
Bäuerinnen, Honig-Imker, Holzschnitzer, Schafswollverarbeitung, Wipptaler Kräutergarten

Kulinarisch
Wipplamm, traditionelle Köstlichkeiten, Kuchen und Krapfen, Brot, vegetarische Gerichte und Pizza



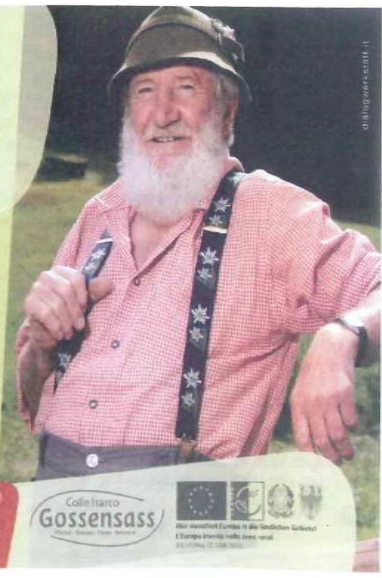

Das Fest findet bei jeder Witterung statt.

- » Glückstopf
- » Heuhüpfen für die Kinder
- » Musikalische Unterhaltung




Von Gipfel zu Gipfel

LEADERPROJEKT: Hufeisentour in den Sarntaler Alpen stärker bekannt machen

SARNTAL. Sie genießt unter Eingeweihten einen exzellenten Ruf: die Hufeisentour in der Bergwelt der Sarntaler Alpen.

Sie führt die Bergsteiger in sieben Tagen von Gipfel zu Gipfel, und von Hütte zu Hütte. Nun soll der Bekanntheitsgrad der Hufeisentour in der Bergsteigerszene erweitert werden. Das haben sich die Genossenschaft für Regionalentwicklung und Weiterbildung (GRW) Sarntal und jene des Wipptals im Rahmen eines gemeinsamen, vom EU-Förderprogramm finanzierten Projektes zum Ziel gesetzt.

In sieben Tagesetappen wandert man auf der Hufeisentour durch die Sarntaler Alpen. Für die Bergsteiger geht es durch eine zum Großteil naturbelassene Ge-

gend. Auf einzelnen Etappen kann es durchaus vorkommen, dass der Wanderer keiner Menschenseele begegnet. Der Bergsteiger ist also in Einklang mit sich und der Natur.

Hufeisentour bewerben

Wer bei den Hütten entlang der Strecke alle Stempel auf einer eigenen Karte sammelt, bekommt am Ende der Hufeisentour eine Plakette.

Die Hufeisentour soll noch stärker beworben werden, haben sich die die Genossenschaft für Regionalentwicklung und Weiterbildung Sarntal in Zusammenarbeit mit der Genossenschaft Wipptal, der Südtirol Markteing Gesellschaft (SMG), den Ge-

meinden und den Tourismusverbänden und den Tourismusvereinen im Gebiet zum Ziel gesetzt.

Derzeit wird als einer der ersten Schritte bei der Umsetzung des Projektes, umfassendes Kartenmaterial zur Hufeisentour ausgearbeitet. Zum einen wird es eine große Karte mit der gesamten Hufeisentour geben. Außerdem wird das Gebiet in fünf Teilgebiete unterteilt, von denen ebenfalls detaillierte Karten erstellt werden. „So hat der Urlauber oder der Wanderer eine Gesamtübersicht, kann in den einzelnen Gebieten aber ins Detail gehen und bekommt Informationen zu Sehenswürdigkeiten“, sagt Günther Mair von der Genossenschaft für Regionalentwicklung Sarntal.

© Alle Rechte vorbehalten

Sterzing trägt jetzt die „Orange Flagge“

TOURISMUS: Vier Wipptaler Gemeinden von Touring Club Italiano bewertet – Sterzing erhält begehrte Auszeichnung

WIPPTAL/BOZEN. Die Gemeinden Sterzing, Pfitsch, Gossensaß und Freienfeld haben sich im Rahmen eines LEADER-Projekts um die Auszeichnung „Bandiera Arancione“ des Touring Club Italiano beworben. Die Gemeinde Sterzing hat die strengen Kriterien dafür erfüllt und am Mittwoch in Bozen die „Orange Flagge“ überreicht bekommen. Den übrigen Gemeinden wurden Verbesserungspläne übergeben.

Beim Projekt „Bandiere Arancioni Alto Adige“ handelt es sich um ein Kooperationsprojekt der drei Lokalen Aktionsgruppen LEADER Ultental-Deutschnonsberg-Martell, Tauferer Ahrntal und Wipptal. Ziel des Projekts der „Orangen Flaggen“ ist es, dass die einzelnen Ortschaften und Gemeinden bewertet werden, und

zwar insbesondere die touristischen Einrichtungen und Dienste (aus der Sicht des italienischen Gasts). Aufgrund der Auswertung dieser Bewertungen werden Verbesserungspläne für die nachhaltige touristische Entwicklung der Gemeinden ausgearbeitet. Jene Gemeinden, die die Kriterien erfüllen, wird die Auszeichnung „Bandiera Arancione“ verliehen.

Italienweit hat der Touring Club Italiano (TCI) bereits über 2000 Gemeinden nach dem Modell der „Bandiere Arancioni“ bewertet und zertifiziert. Davon erhielten nur neun Prozent die Auszeichnung „Bandiera Arancione“.

So wurden in den vergangenen eineinhalb Jahren Sterzing, Pfitsch, Freienfeld und Brenner gemeinsam mit neun weiteren



Der Direktor und der Präsident des Tourismusvereins Sterzing, Josef Turin und Alois Bacher (Zweiter von links), nahmen die „Orange Flagge“ entgegen. Die Vertreter der Gemeinden Pfitsch, Freienfeld und Brenner erhielten Verbesserungspläne.

GRW Wipptal

Südtiroler Gemeinden dieser Bewertung unterzogen. Dazu wurde ein Lokalausgangsschein während der Sommermonate und ein weiterer in den Wintermonaten vorgenommen. Zu den 250 Bewer-

tungskriterien zählen unter anderem Anreise, Beschilderung, Tourismusinformationsdienste, Beherbergung und Restauration, Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen, der Bereich Umwelt so-

wie die Beschaffenheit der Ortschaften.

Aufgrund dieser Auszeichnung wird Sterzing, aber auch die umliegenden Gemeinden in das Netzwerk des Touring Club Italiano eingefügt, wodurch man sich direkte touristische Impulse erwartet. Dies geschieht vor allem durch die Bekanntmachung in den verschiedenen Medien des Touring Clubs.

Im Zuge der Behandlung und Diskussion der Verbesserungspläne sollte in allen Gemeinden aber auch ein positiver Prozess der nachhaltigen touristischen Entwicklung angeregt werden, der vor allem auch auf den Anforderungen der italienischsprachigen Gäste entgegenkommt.

© Alle Rechte vorbehalten

► Siehe auch Seite 30 und 35

Der Freizeitsport - La montagna del tempo libero

13. Almkäse- und Almbutterverkostung

Eine Leistungsschau der Südtiroler Almen
Festa della degustazione dei formaggi e del burro dalle malghe dell'Alto Adige

Sonntag | domenica
28.7.2013

Programm | Programma

- ore 10.00 Uhr Verkostung durch die Fachjury
Degustazione, effettuata da esperti
- ore 10.30 Uhr Verkostung offen für das Publikum
Degustazione aperta al pubblico
- ore 15.00 Uhr Prämierung der Almprodukte
Premiazione dei prodotti delle malghe
- Einlagen der | Esibizioni dei gruppi folkloristici
„Lissa Schupplatta“ & „Gossensasser Tanzmusik“

Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.
La manifestazione avrà luogo indipendentemente dalle condizioni meteo.

Veranstalter | Organizzatori
Südtiroler Bauernjugend/Sterzing
in Zusammenarbeit mit der Neuen Rosskopf GmbH
Unione giovani agricoltori Südtirol/Vipiteno
in collaborazione con la Nuova Monte Cavallo srl

INFO
Tel. +39 0472 765521 | www.rosskopf.com
I-39049 Sterzing - Vipiteno | Brennerstraße 12 Via Brennero

Sterzinger Bauernmarkt
Mercato dei Contadini di Vipiteno

Der Sterzinger Bauernmarkt
öffnet seine Tore! Jeden
Freitag von Mai bis Oktober
von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr
am Stadtplatz
Mit einem Kostlichkeitenstandl
der Wipptaler Bäuerinnen
Am 3. Mai Bauernprodukt Spezial:
Bergkräutercocktails

Mercato dei Contadini di Vipiteno -
ogni venerdì da maggio a ottobre
dalle 9 alle 13 in Piazza Città
Con lo stand gastronomico delle
contadine dell'Alta Val d'Isarco
Il 3 maggio evento speciale:
cocktail alle erbe di montagna

Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete
L'Europa investe nelle zone rurali
REG-VO (CE) 1083/2006

Asse Leader. Programma di sviluppo per le zone rurali 2007-2013 Regolamento CEE N° 1698/2005

Relazione sullo stato di attuazione del programma d'azione locale al 31/12/2013

Gruppo d'Azione Locale (GAL) Val d'Ultimo - Alta Val di Non – Val Martello

ELER		FEASR	AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL		PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE	
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete			EG – Ver. 1698/2005		Reg. (CE) 1698/2005	L'Europa investe nelle zone rurali

L'area del GAL Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello


Tra i quattro GAL presenti in Alto Adige, l'area del GAL Val d'Ultimo - Alta Val di Non - Val Martello è quella più eterogenea: comprende comuni appartenenti a due diverse Comunità comprensoriali, quelle del Burgraviato e della Val Venosta; in pratica è composto da tre sottoaree: la Val d'Ultimo con i comuni di San Pancrazio e Ultimo, i comuni germanofoni dell'Alta Val di Non (Senale - San Felice, Lauregno e Proves) e il comune di Martello.

Ciò nonostante la Giunta provinciale di Bolzano nel 2008 ha ritenuto opportuno istituire un unico GAL nei sei comuni sopra citati. Infatti il piano di sviluppo locale (PSL) presentato dai Comuni di Ultimo e San Pancrazio in Val d'Ultimo, di Senale – San Felice, Lauregno e Proves in Alta Val di Non e da quello di Martello in Val Venosta è stato approvato dalla giunta provinciale di Bolzano con delibera dd. 13/10/2008. La zona di progetto è un'area geografica molto periferica. Tutti e sei i comuni del GAL sono tra quelli maggiormente a rischio di spopolamento, come è stato evidenziato da parte di vari studi effettuati nel corso degli ultimi anni.

HARD FACTS:

GAL Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello	
Numero comuni coinvolti	Sei
Comunità comprensoriali	Burgraviato con sede a Merano, Val Venosta con sede a Silandro
Superficie dell'area del GAL	47.500 ettari ca.
Abitanti (al 31/12/2012)	6.776 abitanti (dati del censimento della popolazione 2011)

Nel decennio 2001 - 2011 i comuni del GAL Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello hanno subito una lieve diminuzione della popolazione residente (del 2,14%); tale diminuzione è stata circoscritta e limitata anche per il fatto che nel decennio in questione è stata attuata una serie di interventi volti al miglioramento delle condizioni di vita nei paesi in questione, tra cui anche i programmi LEADER+ e LEADER 2007-13. Va registrata comunque la tendenza ad una - seppur lieve tendenza allo spopolamento; permane pertanto la necessità di proseguire con gli interventi volti al consolidamento dell'andamento demografico. Negli anni precedenti, in particolare anche nel 2013 sono stati pertanto fatti molteplici sforzi per l'approvazione e attuazione di progetti LEADER tendenti al miglioramento delle condizioni socio-economiche dell'area che sono la base principale per creare le condizioni di cui sopra, anche se altri interventi altrettanto vitali esulano dall'ambito LEADER e sono di competenza di organi ed enti diversi.

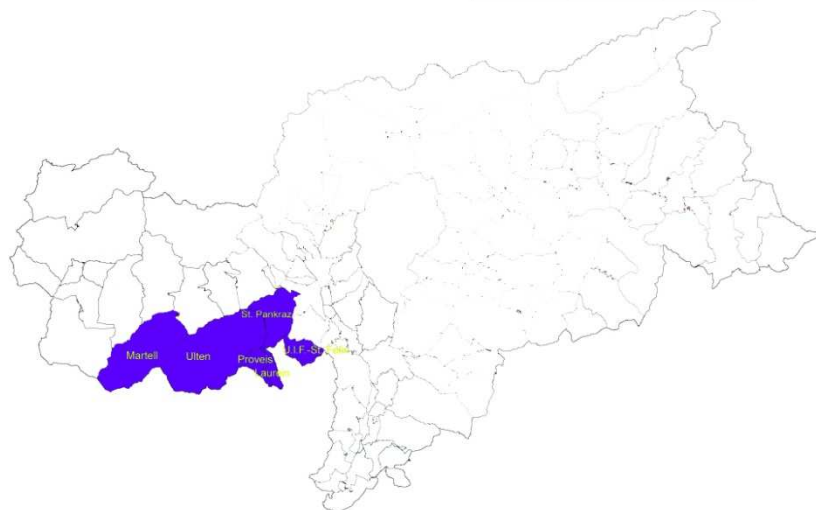

La posizione
periferica
dell'area
LEADER Val
d'Ultimo-Alta Val
di Non-Val
Martello in Alto
Adige.

Il Gruppo di Azione Locale

Il Gruppo di Azione Locale quale organo preposto a sensibilizzare il territorio e ad incentivare la realizzazione della strategia LEADER a livello locale nonché organo decisionale sui progetti ammessi a finanziamento si è costituito nella sua composizione iniziale nella seduta del 15/02/2008 ed era all'epoca composto da 22 membri di cui 6 rappresentanti degli enti pubblici (i sindaci dei sei comuni dell'area interessata dal programma) e altri 16 rappresentanti dei settori economici e sociali maggiormente toccati dalla strategia LEADER. La composizione del GAL si è modificata per tre volte:

- La prima volta nel 2010 (precisamente dal 09/09/2010) a seguito dell'elezione di nuovi sindaci in tutti e sei i comuni coinvolti dal Programma LEADER
- la seconda volta a seguito delle dimissioni della Presidente Waltraud Kofler dettate da motivi di salute; infatti tramite lettera dd. 09/07/2012 l'allora presidente del GAL Waltraud Kofler comunicava al Gruppo di Azione Locale la propria decisione di dimettersi dalla carica per i motivi suddetti, seppur rimanendo membro semplice del GAL. In seguito alla sua morte prematura in data 2 novembre 2012 ha cessato di far parte anche del GAL stesso;
- la terza volta in seguito alla elezione di un nuovo presidente della Cooperativa DELEG (Cooperativa produttori agricoli Alta Val di Non e Val d'Ultimo): dal 7 maggio 2013 il nuovo presidente della cooperativa, Sebastian Mairhofer ha sostituito il suo predecessore anche in seno al Gruppo di Azione Locale

A seguito dei suddetti mutamenti il GAL è attualmente composto dai seguenti 21 membri, di cui sei sono rappresentanti delle amministrazioni pubbliche locali (i sindaci dei sei comuni dell'area LEADER):

Dr. Beatrix Mairhofer	Sindaco del Comune di Ultimo
Dr. Patrik Ausserer	Sindaco del Comune di Senale – San Felice
Georg Altstätter	Sindaco del Comune di Martello
Ulrich Gamper	Sindaco del Comune di Proves
Thomas Holzner	Sindaco del Comune di San Pancrazio
Hartmann Thaler	Sindaco del Comune di Lauregno
Matthias Schwenbacher	Agricoltura (Ultimo)
Paul Laimer	Agricoltura (San Pancrazio)
Walter Marzari	Agricoltura (Proves)
Hanspeter Kerschbamer	Agricoltura (Lauregno)
Sebastian Mairhofer	Coop. agr. DELEG
Markus Kofler	Agricoltura (Senale – San Felice)

Manfred Gamper	Agricoltura (Martello)
Paul Rainer	Turismo (Ultimo)
Traudl Holzner	Turismo (San Pancrazio)
Rosmarie Kessler	Turismo (Proves)
August Kerschbamer	Turismo (Lauregno)
Mirko Mocatti	Turismo (Senale – San Felice)
Günther Pircher	Turismo (Martello)
Gisela Gruber	Politiche per la gioventù (San Pancrazio)
Elmar Mairhofer	Politiche per la gioventù (Proves)

La percentuale di componenti pubblici in seno al GAL è pari al 28,5%.

Nel corso dell'anno 2013 il Gruppo di Azione Locale si è riunito per 5 volte. Nel corso delle suddette riunioni il GAL ha approvato complessivamente diciannove delibere di approvazione di nuovi progetti e/o integrazione/modifiche di progetti già approvati nel corso di precedenti riunioni.

Andamento del Piano di Sviluppo Locale rispetto agli obiettivi fissati (al 31/12/2013)

1) misure attivate

Il 31/12/2013 era il termine entro il quale tutti gli interventi rientranti nel programma LEADER dovevano essere approvati tramite decreti dell'assessore competente per settore. Ciò determina che - a scanso di spostamenti di fondi e cancellazioni e/o introduzioni di misure previste dal PSL anche tutte le misure dovevano risultare attivate. Tale risultato al contrario si era già raggiunto alla fine del 2011; già a tale data risultavano attivate tutte le misure del PSL, compresa anche la misura 421 (cooperazione transnazionale e interterritoriale). Tale misura è stata infatti l'ultima ad essere avviata tramite l'approvazione del progetto "Programma Territoriale Bandiere Arancioni Alto Adige", progetto di cooperazione interterritoriale con i GAL Valli di Tures e Aurina e Wipptal e con il supporto esterno del Touring Club Italiano (TCI).

Di seguito si espone una breve panoramica sullo stato di attuazione delle singole misure:

1.1 misura 111, Misura per la formazione professionale e l'aggiornamento/informazione, inclusi la divulgazione di nuove scoperte scientifiche, di tecnologie e procedimenti innovativi, per le persone che lavorano nell'ambito delle scienze alimentari e dell'economia forestale.

All'interno di questa misura sono stati attivati due progetti tramite la formazione di altrettanti gruppi di lavoro:

il primo ha riguardato le colture speciali in agricoltura di montagna (prodotti orticoli, piccoli frutti e ciliegie); a tale gruppo di lavoro hanno aderito e partecipato 53 coltivatori della Val Martello e della zona della Val d'Ultimo e Alta Val di Non a fronte di un'iscrizione iniziale di 60 membri.

il secondo gruppo di lavoro è stato costituito alla fine del 2011 tramite l'aggregazione di un gruppo di 33 agricoltori dell'Alta Valle di Non, tutti allevatori della razza bruna con l'obiettivo della promozione della zootecnia e della produzione lattiera, del miglioramento genetico dei capi di bestiame della razza bruna tramite scelta dei migliori maschi e della relativa consulenza.

Oltre ai gruppi di lavoro attivati in seno al PSL, altri tre gruppi di lavoro sono stati avviati all'interno del PSR della Provincia di Bolzano:

Agli inizi del 2011 si è costituito un gruppo nel settore della carne di qualità LaugenRind, in quanto tale settore di nicchia è il secondo caposaldo dello sviluppo dell'agricoltura di

montagna della zona interessata dal Gruppo di Azione Locale Val d'Ultimo - Alta Val di Non - Val Martello. Tale progetto, inizialmente approvato dal GAL come secondo progetto da finanziare con i fondi della misura 111, è stato invece approvato dalla Ripartizione 22 della Provincia Autonoma di Bolzano sul PSR, e quindi non riguarda più propriamente il piano finanziario di LEADER.

All'interno dell'ultimo bando sulla misura 111 (effettuato nell'agosto 2012) si sono infine attivati altri due gruppi di lavoro: il gruppo di lavoro "Aufwertung Rinderzucht Ulten-Pawigl" (Valorizzazione della zootecnia in Val d'Ultimo e Pavicolo) e il gruppo di lavoro di per l'ottimizzazione del LaugenRind, che si prefigge di specializzare gli interventi del primo gruppo di lavoro.



Il gruppo di lavoro zootecnia in occasione del viaggio di studio in Svizzera

1.2 misura 124, Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, metodi/procedimenti e tecnologie nell'ambito dell'agricoltura, dell'economia forestale e del settore alimentare

Per l'attuazione della misura in questione era sin dall'inizio previsto la attivazione di due progetti che – per il loro oggetto sono in qualche modo legati agli stessi settori di cui alla misura precedente.

Come previsto dal PSL Val d'Ultimo - Alta Val di Non - Val Martello, i due progetti da attivare in seno a questa misura riguardano da un lato la definizione, lo sviluppo e la consulenza nonché piantagioni sperimentali di fragole e altri piccoli frutti seguendo i sistemi biodinamici, con particolare attenzione alle tecniche di conservazione (salvaguardia di freschezza del prodotto per diversi giorni) e agli adeguamenti e alle predisposizioni tecniche necessarie per la cura delle piantagioni (sistemi di irrigazione e di irrorazione); dall'altro lo sviluppo di prodotti nell'ambito della trasformazione e dell'affinamento delle carni di qualità, l'introduzione della loro lavorazione, la presentazione e la distribuzione, oltre a diverse strategie di marketing.

Entrambi i progetti sono stati attivati e approvati nel corso del 2009. Il progetto riguardante la produzione biologica dei piccoli frutti già nel corso dell'anno 2009 è stato approvato dalla

Provincia Autonoma di Bolzano. Nel corso del 2010 la MEG, cooperativa agricola beneficiaria del progetto, ha attuato una prima fase di sperimentazioni nel settore della produzione, conservazione e lavorazione dei piccoli frutti di tipo biologico. Ciò riguarda specialmente il settore delle fragole, mentre la produzione di ciliegie e lamponi di tipo biologico per forza di cose occupa un lasso di tempo maggiore. Il progetto nel frattempo è stato rendicontato.

Il secondo progetto, riguardante come accennato la trasformazione dei prodotti della carne di qualità LaugenRind e la creazione di una gamma di prodotti innovativi, è stato in gran parte attivato nel corso del 2010. Infatti, con il supporto tecnico e scientifico del Cluster Alimentaris presso il TIS – Techno Innovation Südtirol di Bolzano è stata studiata e sperimentata la creazione di una linea di prodotti derivanti in gran parte dalla carne di qualità LaugenRind, ci si è cimentati nella creazione di una nuova linea grafica che ha avuto attuazione sia sulle confezioni dei singoli prodotti, sia anche nei supporti grafici e nel sito internet, creati allo scopo di pubblicizzare i prodotti stessi. L'attività di presentazione del progetto e della gamma di prodotti creati è stata effettuata in una conferenza stampa, che si è tenuta agli inizi di giugno 2010 presso il TIS i Bolzano e cui hanno partecipato anche i due assessori provinciali all'epoca competenti per l'agricoltura e l'innovazione.

Nel corso del 2012 l'esecuzione del progetto si è conclusa e il progetto attualmente si trova in fase di rendicontazione al competente Ufficio della Provincia. Nel frattempo i prodotti che sono stati creati nel corso dell'attuazione del progetto sono una parte importante della gamma dei prodotti LaugenRind.

L'importo previsto dalla misura 124 in questione anche in questo caso è stato interamente esaurito con l'approvazione dei due progetti in questione.



Anche la festa LaugenRind del 14/07/2013 è stata occasione per presentare i risultati del progetto

1.3 misura 313, risanamento dei sentieri, miglioramenti nell'alpicoltura e promozione del turismo

La sottomisura A (Aumento degli effetti benefici del bosco, misure per indirizzare i visitatori, salvaguardia e creazione di strutture per un sano approccio al bosco e allo spazio naturale, misure informative) è stata attivata tramite ben undici progetti volti al risanamento di sentieri di grande rilevanza turistica piuttosto che alla creazione di nuovi sentieri tematici:

Comune di San Pancrazio	Terzo lotto per la creazione del sentiero tematico dedicato alla geologia della zona (San Pancrazio) - il sentiero nella fase conclusiva

	della sua attuazione ha visto modificata in parte la denominazione in quanto è stato dedicato anche alla fluitazione del legname nel torrente Valsura, tradizionale metodo di trasporto del legname praticato fino alla seconda guerra mondiale
Provincia Autonoma di BZ - Ispettorato Forestale di Merano	Il risanamento dei sentieri che portano sulla cima del monte Luco, una delle vette più importanti anche ai fini turistici; il progetto è stato attuato tramite l'esecuzione di tre lotti di lavori previsti per il completo risanamento dei sentieri del monte Luco
Comune di Martello	I lavori per la realizzazione di due sentieri tematici in Val Martello sono stati ultimati nella prima metà del 2012: il sentiero riguardante il tema della "fragola", prodotto tipico della valle è stato inaugurato in occasione della festa della fragola a fine giugno 2012; il secondo sentiero tematico, dedicato alla cultura contadina della valle (Wald-Berg-Bauer) è stato invece inaugurato un mese dopo, dopo essere stato anch'esso completato con le installazioni previste dal progetto e reso percorribile per i visitatori
Comune di San Pancrazio	Creazione di un sentiero tematico nei Comuni di Ultimo e San Pancrazio "i bagni della Val d'Ultimo"
Provincia Autonoma di BZ - Ispettorato Forestale di Merano	Risanamento del sentiero sul monte Peilstein presso S.ta Valburga /Ultimo; l'intervento è stato concluso nel corso del 2013 e inaugurato in autunno dell'anno scorso
Comune di Ultimo	Realizzazione di un sentiero per escursioni presso malga Schwemmalm nel C.C. di San Nicolò (Comune di Ultimo); il progetto è stato avviato nel corso del 2013 e verrà terminato nel 2014
Comune di Ultimo	Costruzione di un sentiero della salute "Kneipp" presso il Lago Zoccolo nel C.C. di Santa Valburga (Comune di Ultimo)
Comune di Martello	Realizzazione di un sentiero per escursioni nella gola del rio Plima in Alta Val Martello; il progetto verrà messo in opera nel corso del 2014
Comune di Senale - San Felice	Risanamento del sentiero della cascata di S. Felice e costruzione di un ponte sul rio San Felice nel C.C. di San Felice (Comune di Senale - San Felice)
Comune di San Pancrazio	Creazione di un sentiero tematico nel Comune di San Pancrazio "sentiero dei mulini"
Comune di Lauregno	Completamento e manutenzione straordinaria del sentiero dei masi tra Lauregno e Proves (nei Comuni di Lauregno e Proves)



La cascata di S. Felice verrà valorizzata tramite la costruzione di un ponte sul rio San Felice

Nell'ambito di diverse riunioni con l'Ispettorato forestale di Merano ed i sindaci dei comuni della Val d'Ultimo e dell'Alta Val di Non nel corso del 2013 è stata definita la lista dei sentieri tematici che sarebbero poi stati candidati a finanziamento nell'ambito della misura in questione.

Il fatto che la maggior parte dei progetti per la realizzazione dei sentieri contrariamente a quanto originariamente previsto sono passati dal sistema a regia diretta in capo alla Ripartizione Foreste della Provincia Autonoma di BZ ai comuni interessati, con conseguente diminuzione del tasso di aiuto dall'80% al 70% è stato uno dei fattori che hanno comportato la necessità di uno spostamento dei fondi preventivati in seno alla misura 313 A alla misura 313 C, spostamento deciso in via definitiva nella riunione del GAL di data 04/12/2013.

Inoltre di comune accordo tra l'Ispettorato forestale e i comuni coinvolti è stato costantemente aggiornato il programma dei lavori per gli anni 2013 - 2015 così da assicurare la conclusione puntuale dei progetti all'interno della misura in questione. Il programma viene costantemente monitorato così da permetterne gli aggiornamenti periodici.



I lavori di sistemazione del sentiero sul monte Peilstein (sopra S.ta Valburga)

Anche [la sottomisura C](#) (Promozione e valorizzazione dell'offerta turistica locale, inserimento della locale offerta turistica nelle peculiarità della zona, comuni attività di marketing) è stata attivata tramite la definizione e approvazione di molti progetti, di cui una parte consistente è stata deliberata nel corso del 2013:

Beneficiario	Titolo progetto
Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione (GRW)	Itinerari, gastronomia e sapori in Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello 2009-10; progetto che comprende tutte le offerte gastronomiche e prevede la valorizzazione dei prodotti tipici locali dell'area.
Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione (GRW)	Elaborazione di un concetto di sviluppo dell'area escursionistica Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello; molti incontri e seminari volti a sviluppare il concetto di presentazione del „mondo escursionistico rurale“ Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello, nell'ambito del quale vari interventi di sviluppo saranno posti in essere nei prossimi anni, eventualmente anche nell'ambito del PSR 2014-20.
Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione (GRW)	Itinerari, gastronomia e sapori in Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello 2010-11
Associazione turistica Val d'Ultimo/Proves	Creazione di un nuovo sito internet Val d'Ultimo – Alta Val di Non e comprensorio sciistico Schwemmalm; il progetto si è concluso tramite la messa online del nuovo sito nell'autunno 2011
Cooperativa per lo sviluppo Martello - 3B	Promozione dei sentieri tematici di nuova costituzione dedicati alla fragola e al mondo contadino in Val Martello; pubblicizzazione ed altre attività di marketing legati ai due sentieri tematici creati in Val Martello (fragola e Wald-Berg-Bauer), così da rendere maggiormente visibili tali due progetti di rilevanza turistica.
Cooperativa produttori agricoli DELEG	Creazione e promozione di una piattaforma di commercializzazione dei prodotti locali di qualità; promozione dei prodotti locali di qualità e la loro integrazione con l'offerta degli esercizi alberghieri, gastronomici e commerciali della zona Val d'Ultimo e Alta Val di

	Non nonché la promozione degli stessi tramite diverse attività di marketing
Associazione turistica Val d'Ultimo/Proves	Creazione e promozione di una serie di manifestazioni con la denominazione "Sapori gustosi della Val d'Ultimo"
Associazione turistica Alta Val di Non	Adeguamento del marketing turistico per l'area dell'Alta Val di Non (Prov. di Bolzano)
Associazione turistica Laces - Martello	Costruzione di un punto d'informazione nell'alta valle nel comune di Martello
Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione (GRW)	Produzione e apposizione di installazioni per la promozione unitaria delle manifestazioni in Val d'Ultimo e nell' Alta Val di Non
Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione (GRW)	Promozione dei nuovi sentieri tematici in Val d'Ultimo e nell' Alta Val di Non
Associazione turistica Val d'Ultimo/Proves	Creazione di un marchio per la promozione di prodotti turistici della Val d'Ultimo
Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione (GRW)	Sviluppo del concetto per la valorizzazione dell'area escursionistica Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello

Nella sottomisura 313 C è stata attivata una serie di progetti che inizialmente non erano previsti a fronte della dotazione originaria della stessa. È tuttavia stato possibile mettere in cantiere ulteriori progetti in quanto residui fondi sono stati spostati dalla sottomisura 313 A e dalla misura 322.

1.4 Misura 322, risanamento e sviluppo dei paesi

La misura 322 è stata quella dove il maggior numero di progetti è stato presentato al GAL ed è stato da questi approvato, in quanto tutti i sei comuni dell'area LEADER Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello hanno dato vita ad una molteplicità di interventi concreti volti al miglioramento dei centri abitati dei paesi stessi oppure al risanamento di particolari gruppi di masi presenti all'interno del rispettivo territorio comunale.

Beneficiario	Titolo progetto
Comune di Proves	Ampliamento della strada in località "Mairhof", sistemazione piazzale
Comune di Lauregno	Strutturazione del paese di Lauregno, Lotto 2, Zona Albergo „Stern“
Comune di Senale - San Felice	Realizzazione della nuova strada di accesso al centro di San Felice con sistemazione del piazzale del municipio, la realizzazione di posti macchina e di una zona verde attrezzata nel Comune di Senale – San Felice
Comune di San Pancrazio	Riqualificazione del centro urbano di San Pancrazio – Lotto 4 – Municipio e sistema informativo culturale
Comune di Martello	Risanamento del cimitero nell'area sud-est (entrata) nell'ambito del progetto di sistemazione del centro paese di Martello nel Comune di Martello
Comune di Ultimo	Progetto per la sistemazione dell'area presso il centro di documentazione archeologica di Santa Valburga/Ultimo
Comune di Proves	Realizzazione della strada di accesso alla zona residenziale di tipo agricolo in località "Buacha"
Comune di Senale - San Felice	Progetto per la realizzazione di un parco di meditazione, di un marciapiede e per il rifacimento del parcheggio nel centro di Senale

Comune di Ultimo	Progetto per la formazione esterna a Pracupola nel Comune di Ultimo
Comune di Martello	Valorizzazione del centro paese di Martello – risanamento del centro abitato
Comune di Ultimo	Realizzazione di un nuovo parcheggio nel centro di S.ta Valburga nel Comune di Ultimo
Comune di Proves	Risanamento del piazzale antistante la cappella Lourdes nel Comune di Proves
Comune di Proves	Risanamento del piazzale e della strada di accesso presso il gruppo di masi Obergampen nel Comune di Proves
Comune di San Pancrazio	Riqualficazione del centro urbano di San Pancrazio – Lotto 5 – Sistema informativo turistico

Al 31/12/2013 il GAL ha deliberato complessivamente quattordici progetti per il risanamento e sviluppo dei paesi dell'area LEADER per un contributo totale pari ad Euro 1.741.258,00 €, tenuto conto delle economie risultate nel corso della rendicontazione e liquidazione dei progetti nel frattempo conclusi.



Veduta sulla piazza del paese di Martello, dopo la ristrutturazione con i fondi della misura 3.2.2

Per quanto concerne l'aspetto della attuazione dei progetti, una volta chiariti gli aspetti burocratici in tema di appalti pubblici e gestione dei relativi bandi, i progetti nel corso dell'anno 2011 e anche del 2012 sono stati portati avanti con successo, molti progetti sono stati conclusi. Ciò ha permesso un grande avanzamento della spesa rendicontata, come spiegato più avanti in questa relazione.

1.5 Misura 421, cooperazione transnazionale e interterritoriale

La presente misura è stata attivata nel 2011 tramite un progetto di cooperazione di tre dei quattro GAL che, su proposta del GAL Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello hanno aderito al progetto "Programma territoriale Bandiere Arancioni", un'iniziativa del Touring Club Italiano, mirato alla certificazione e promozione delle piccole località dell'entroterra. Il

progetto, dopo una serie di incontri chiarificatori con gli esponenti del Touring Club stesso, è stato approvato, oltre dal nostro GAL dal GAL Valli di Tures e Aurina e dal GAL Wipptal, mentre non ha aderito all'iniziativa il GAL Val Sarentino. Nel corso dell'estate 2012 gli esperti del Touring Club Italiano hanno svolto i sopralluoghi nei cinque comuni che all'interno del GAL Val d'Ultimo-Alta Val di Non-Val Martello hanno aderito al progetto. Nel corso della stagione invernale 2012/13 si è invece svolto il secondo giro di visite, per valutare appunto anche i dati e l'offerta turistica delle località per quel che concerne la stagione invernale. Nei primi mesi del 2013 il Touring Club ha dunque provveduto alla redazione dei piani di miglioramento per i tredici comuni che nei tre GAL hanno aderito all'iniziativa e alla stesura dei tre piani d'area per i GAL. I piani sono stati nel frattempo consegnati ai sindaci dei singoli comuni partecipanti in occasione della conferenza stampa di chiusura del progetto tenutasi a Bolzano in data 24/04/2014. A tre comuni, Ultimo, Vipiteno e Campo Tures nel corso della conferenza stampa è stata infine assegnata la bandiera arancione.



*Assegnazione delle
tre bandiere
arancioni
(24/04/2014)*

Nel corso del 2013 è stato inoltre attivato anche il secondo progetto della misura 421: Si tratta del progetto denominato "Terre ospitali", il quale all'inizio prevedeva il coinvolgimento di otto GAL appartenenti a sette diverse regioni italiane. Al momento dell'approvazione il numero dei GAL si è ridotto a sette, in quanto il GAL della Regione Calabria ha ritirato la propria adesione. Attualmente in seno al progetto si sta svolgendo la mappatura degli operatori nel Comune di Martello che aderisce all'iniziativa per il ns. GAL.

1.6 Misura 431, sensibilizzazione e informazione, gestione dei GAL

Nell'ambito di questa misura sono stati approvati complessivamente sei progetti riguardanti gli anni dal 2008 al 2013, che prevedono la effettiva gestione e amministrazione del gruppo di azione locale, lo sviluppo delle competenze e la sensibilizzazione della popolazione. Per

migliorare la capacità progettuale, organizzativa ed amministrativa a livello locale, nell'ambito di questa misura si è previsto di supportare i territori Leader individuando misure informative adeguate per le diverse strategie di sviluppo rurale, aggiornamenti per i membri del GAL, formazione per i coordinatori, attività di consulenza esterna e di sviluppo ed il lavoro amministrativo e di documentazione.

I fondi a disposizione su questa misura sono stati interamente impegnati.

Riassumendo possiamo constatare che tutte le misure previste dal Piano di Sviluppo Locale sono state discusse ed elaborate nelle sedute dei gruppi di lavoro competenti e che le stesse sono state attivate tramite l'elaborazione e approvazione di progetti concreti. Il tutto adottando tecniche moderne di *project management*, rispettando l'analisi della situazione di partenza, la formulazione di adeguate strategie e obiettivi, la definizione delle misure da adottare e dei rispettivi costi, le risorse personali necessarie, la gestione in rete con le altre misure nonché la sostenibilità delle stesse nel senso di garantire lo sviluppo integrato del territorio.

2) numero complessivo delle domande d'aiuto presentate al GAL e da questo approvate fino al 31/12/2013

Alla data del 31/12/2013 al GAL Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello sono state presentate complessivamente 55 domande di contributo per altrettanti progetti. Di queste domande d'aiuto 54 sono state approvate dal Gruppo di Azione Locale. Come già spiegato e ribadito nelle relazioni relative agli anni precedenti una domanda era stata respinta all'unanimità dal GAL, e cioè quella presentata dall'arch. Bernhard Löscher a San Nicolò in Val d'Ultimo, in quanto il progetto non risultava previsto dal PSL e quindi privo di copertura finanziaria, in quanto si tratta di un beneficiario singolo mentre i progetti contemplati dalla misura 124 prevedono una pluralità di beneficiari finali e in quanto non compatibile con le strategie del PSL che contempla interventi nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura.

Il progetto n. 008 riguardante la realizzazione di un sistema informativo culturale nel paese di San Pancrazio è stato approvato dal GAL nella seduta del 26/03/2009, ma in sede di verifica tecnica presso l'ufficio competente della PAB è risultato incompatibile con le linee guida del programma di sviluppo ed è stato pertanto ritirato dallo stesso Comune di San Pancrazio.

Il progetto n. 020 "Gruppo di lavoro carne di qualità LaugenRind" è stato invece approvato dall'ufficio competente della PABz tramite fondi del PSR, senza pertanto intaccare la disponibilità finanziaria del PSL, cosa che ha permesso al GAL di approvare un altro Gruppo di lavoro, quello riguardante la razza bruna.

Il progetto n. 046 "Acquisto di un maxischermo pubblicitario digitale per la promozione delle manifestazioni in Val d'Ultimo e nell'Alta Val di Non" era stato approvato dal GAL nella sua seduta dd. 19/07/2013, ma in sede di verifica da parte dell'ufficio competente della Provincia Autonoma di Bolzano è risultato non ammissibile a finanziamento in quanto prevedeva l'inserimento di manifestazioni ed eventi del Comune di Lana, comune dove il maxischermo doveva essere installato ma che non rientra nei comuni dell'area LEADER.

Anche il progetto n. 052 infine è stato approvato dal GAL nella riunione dd. 31/10/2013 ma anche questo non ha retto all'esame dell'ufficio edilizia rurale della Provincia, che ha riscontrato la Sua inammissibilità per mancanza di riferimenti espliciti all'oggetto previsto all'interno del PSL a sua volta presentato ed approvato.

Ecco la lista dei progetti approvati dal GAL nelle rispettive sedute dal 2008 alla fine del 2013:

Seduta del GAL dd. 18/12/2008

N. Pr.	Titolo	Beneficiario	Contributo deliberato
001	4.3.1 gestione/amministrazione dei locali gruppi d'azione, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione 2008	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	80.000,00 €
002	4.3.1 gestione/amministrazione dei locali gruppi d'azione, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione 2009	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	100.000,00 €
003	Ampliamento della strada in località "Mairhof", sistemazione piazzale	Comune di Proves	88.992,00 €
004	Nuova costruzione di una strada con marciapiede e parcheggi nel centro abitato di Lauregno	Comune di Lauregno	320.000,00 €

Seduta del GAL dd. 12/02/2009

N. Pr.	Titolo	Beneficiario	Contributo deliberato
001	4.3.1 gestione/amministrazione dei locali gruppi d'azione, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione 2008	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	44.100,00 €
003	Ampliamento della strada in località "Mairhof", sistemazione piazzale	Comune di Proves	74.160,00 €
005	Sviluppo di un sentiero tematico dedicato alla geologia nel Comune di San Pancrazio – 3° lotto	Comune di San Pancrazio	66.336,00 €

Seduta del GAL dd. 26/03/2009

N. Pr.	Titolo	Beneficiario	Contributo deliberato
006	Coltivazione biologica di piccoli frutti e ciliegie	Coop. MEG – Val Martello	200.000,00 €
007	Itinerari, gastronomia e sapori in Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello 2009-10	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	64.000,00 €
008	Realizzazione di un sistema informativo culturale a San Pancrazio	Comune di San Pancrazio	20.000,00 €

Seduta del GAL dd. 11/09/2009

N. Pr.	Titolo	Beneficiario	Contributo deliberato

009	Sviluppo prodotti e miglioramento dei prodotti derivanti dalla carne di qualità LAUGEN.Rind	Coop. agr. DELEG	50.000,00 €
010	Lavori di manutenzione straordinaria dei sentieri sul monte Luco	Ripartizione Foreste della PABz	119.200,00 €
011	Realizzazione della nuova strada di accesso al centro di San Felice con sistemazione del piazzale del municipio, la realizzazione di posti macchina e di una zona verde attrezzata nel Comune di Senale – San Felice	Comune di Senale – San Felice	189.902,92 €
012	Realizzazione di un allevamento di gamberi d’acqua dolce	Bernhard Lösch, maso Jaisten, San Nicolò/Ultimo	Non deliberato

Seduta del GAL dd. 16/12/2009

N. Pr.	Titolo	Beneficiario	Contributo deliberato
013	Riqualificazione del centro urbano di San Pancrazio – Lotto 4 – Municipio e sistema informativo culturale	Comune di San Pancrazio	95.934,72 €
014	Gruppo di lavoro “colture speciali”	Coop. MEG Val Martello	35.650,00 €
015	Realizzazione di due sentieri tematici „fragole“ e “Wald-Berg-Bauer”	Comune di Martello	80.000,00 €
016	Sistemazione del centro del paese di Martello con risanamento del cimitero (parte sud-ovest)	Comune di Martello	148.094,09 €
017	Realizzazione e presentazione esterna della zona di interesse archeologico al centro di documentazione „Fachhaus“, a S.ta Valpurga/Ultimo	Comune di Ultimo	158.930,95 €
018	4.3.1 gestione/amministrazione dei locali gruppi d’azione, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione 2010	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val d’Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	100.000,00 €
019	Concetto per lo sviluppo e la presentazione del „mondo escursionistico rurale“ Val d’Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val d’Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	16.000,00 €

Seduta del GAL dd. 25/03/2010

N. Pr.	Titolo	Beneficiario	Contributo deliberato
020	Formazione di un gruppo di lavoro „carne di qualità“	Coop. DELEG	14.350,00 €
021	Itinerari, gastronomia e sapori in Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello 2009-10	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	64.000,00 €

Seduta del GAL dd. 11/05/2010

N. Pr.	Titolo	Beneficiario	Contributo deliberato
015	Realizzazione di due sentieri tematici „fragola“ e “Wald-Berg-Bauer“ (integrazioni al progetto)	Comune di Martello	80.000,00 €
022	Accesso al gruppo di masi „Buacha“ e relative opere di risanamento	Comune di Proves	43.608,00 €
023	Realizzazione di un nuovo sito internet per l'area Val d'Ultimo – Alta Val di Non	Associazione turistica Val d'Ultimo/Proves	24.000,00 €
024	Realizzazione del sentiero „Bagni della Val d'Ultimo“	Ripartizione Foreste della PABz	50.000,00 €

Seduta del GAL dd. 15/12/2010

N. Pr.	Titolo	Beneficiario	Contributo deliberato
025	Realizzazione del „parco della meditazione e sentiero pedonale“ a Madonna di Senale	Comune di Senale – San Felice	171.880,00 €
026	4.3.1 gestione/amministrazione dei locali gruppi d'azione, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione 2011	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	110.000,00 €

Seduta del GAL dd. 18/05/2011

N. Pr.	Titolo	Beneficiario	Contributo deliberato
027	Realizzazione di lavori di sistemazione a Pracupola (Ultimo)	Comune di Ultimo	97.978,37 €
028	Valorizzazione del centro paese di Martello – risanamento del centro abitato	Comune di Martello	124.360,00 €

Seduta del GAL dd. 13/10/2011

N. Pr.	Titolo	Beneficiario	Contributo deliberato
029	Programma Territoriale Bandiere	Cooperativa per lo	25.000,00 €

	Arancioni (Coop. interterritoriale)	sviluppo regionale e la formazione Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	
030	Gruppo di lavoro razza bruna Alta Val di Non	DELEG – Coop. Prod. Agricoli Alta Val di Non e Val d'Ultimo	21.532,56 €

Seduta del GAL dd. 23/12/2011

<i>N. Pr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Contributo deliberato</i>
031	Lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria del sentiero Monte Peilstein	Ripartizione Foreste della PABz	13.360,00 €
032	4.3.1 gestione/amministrazione dei locali gruppi d'azione, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione 2012	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	101.000,00 €

Seduta del GAL dd. 20/02/2012

<i>N. Pr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Contributo deliberato</i>
029	Programma Territoriale Bandiere Arancioni (Coop. interterritoriale)	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	20.200,00 €
028	Valorizzazione del centro paese di Martello – risanamento del centro abitato	Comune di Martello	147.080,00 €

Seduta del GAL dd. 30/05/2012

<i>N. Pr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Contributo deliberato</i>
033	Promozione dei sentieri tematici dedicati alla fragola e al mondo contadino in Val Martello	Cooperativa per lo sviluppo regionale Martello 3 B	16.000,00 €

Seduta del GAL dd. 21/11/2012

<i>N. Pr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Contributo deliberato</i>
034	Realizzazione di un nuovo parcheggio nel centro di Santa Valburga	Comune di Ultimo	120.000,00 €
035	Riquilificazione del centro urbano di San Pancrazio – 5° lotto – sistema di informazione turistica	Comune di San Pancrazio	40.000,00 €

036	Progetto di cooperazione interterritoriale "Terre Ospitali"	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	84.800,00 €

Seduta del GAL dd. 27/12/2012

N. Pr.	Titolo	Beneficiario	Contributo deliberato
019	Concetto per lo sviluppo e la presentazione del „mondo escursionistico rurale“ Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	20.000,00 €
037	Creazione e promozione di una filiera per i prodotti locali Val d'Ultimo - Alta Val di Non	Coop. produttori agr. Alta Val di Non e Val d'Ultimo DELEG	145.000,00 €
038	Risanamento del gruppo di masi "Oberkampen"	Comune di Proves	110.200,00 €
039	4.3.1 gestione/amministrazione dei locali gruppi d'azione, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione 2013	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	70.000,00 €

Seduta del GAL dd. 07/05/2013

N. Pr.	Titolo	Beneficiario	Contributo deliberato
040	Realizzazione di un sentiero per escursioni presso malga Schwemmalm nel C.C. di San Nicolò (Comune di Ultimo);	Comune di Ultimo	49.901,92 €
041	Realizzazione di un sentiero per escursioni nella gola del rio Plima in Alta Val Martello	Comune di Martello	80.000,00 €
042	Costruzione di un sentiero della salute "Kneipp" presso il Lago Zoccolo nel C.C. di Santa Valburga (Comune di Ultimo)	Comune di Ultimo	37.614,25 €
043	Risanamento del sentiero della cascata di S. Felice e costruzione di un ponte sul rio San Felice nel C.C. di San Felice	Comune di Senale - San Felice	36.400,00 €
044	Risanamento del piazzale antistante la cappella Lourdes nel Comune di Proves	Comune di Proves	88.000,00 €

Seduta del GAL dd. 13/06/2013

N. Pr.	Titolo	Beneficiario	Contributo deliberato
045	Completamento e manutenzione straordinaria del sentiero dei masi tra Lauregno e Proves (nei Comuni di Lauregno e Proves)	Comune di Lauregno	34.717,77 €

Seduta del GAL dd. 19/07/2013

N. Pr.	Titolo	Beneficiario	Contributo deliberato
024	Realizzazione del sentiero „Bagni della Val d’Ultimo“	Comune di San Pancrazio	28.943,22 €
046	Acquisto di un maxischermo pubblicitario digitale per la promozione delle manifestazioni in Val d’Ultimo e nell’ Alta Val di Non	Associazione turistica Val d'Ultimo/Proves	44.000,00 €
047	Promozione dei nuovi sentieri tematici in Val d’Ultimo e nell’ Alta Val di Non	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione	24.000,00 €
048	Creazione e promozione di una serie di manifestazioni con la denominazione "Sapori gustosi della Val d'Ultimo"	Associazione turistica Val d'Ultimo/Proves	24.000,00 €
049	Adeguamento del marketing turistico per l'area dell'Alta Val di Non (Prov. di Bolzano)	Associazione turistica Alta Val di Non	20.000,00 €
050	Costruzione di un punto d'informazione nell'alta valle nel comune di Martello	Associazione turistica Laces-Martello	20.000,00 €
051	Produzione e apposizione di installazioni per la promozione unitaria delle manifestazioni in Val d’Ultimo e Alta Val di Non	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione	44.000,00 €

Seduta del GAL dd. 04/12/2013

N. Pr.	Titolo	Beneficiario	Contributo deliberato
053	Creazione di un sentiero tematico nel Comune di San Pancrazio "sentiero dei mulini"	Comune di San Pancrazio	37.704,67 €
043	Risanamento del sentiero della cascata di S. Felice e costruzione di un ponte sul rio San Felice nel C.C. di San Felice	Comune di Senale - San Felice	46.695,00 €
048	Creazione e promozione di una serie di manifestazioni con la denominazione "Sapori gustosi della Val d'Ultimo"	Associazione turistica Val d'Ultimo/Proves	40.000,00 €
054	Creazione di un marchio per la promozione di prodotti turistici	Associazione turistica Val d'Ultimo/Proves	20.000,00 €

	della Val d'Ultimo		
034	Realizzazione di un nuovo parcheggio nel centro di Santa Valburga	Gemeinde Ulten	168.144,48 €
055	Sviluppo del concetto per la valorizzazione dell'area escursionistica Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione	12.960,00 €

3) numero dei progetti in corso di effettiva esecuzione/terminati

Da quanto sopra enunciato risulta che dei 54 progetti delegati dal GAL in definitiva 49 sono stati approvati dalla Provincia Autonoma di Bolzano e rientrano a tutti gli effetti nel programma LEADER Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello. Come infatti spiegato poc'anzi il progetto 008 non è stato approvato dalla PABz, il progetto 020 è invece stato approvato dalla PABz ma con fondi esclusivamente PSR, quindi al di fuori di LEADER, mentre non sono stati approvati i progetti n. 046 e n. 052 per i motivi sopra esposti.

A fine 2013 i progetti conclusi risultano essere 28. 22 di questi sono rendicontati mentre i rimanenti 6 progetti sono in fase di liquidazione. Attualmente la somma dei contributi pagati dall'Organismo Pagatore ammonta a 1.994.732,00 Euro ca. A seguito delle stime aggiornate assieme ai beneficiari dei singoli progetti che stanno ultimando e/o rendicontando i progetti in corso l'ammontare dell'avanzamento finanziario tra qualche mese dovrebbe superare la soglia dei 2,5 milioni di Euro (per essere precisi dovrebbe raggiungere l'importo di Euro 2.528.000,00), il che corrisponderà ad una percentuale di avanzamento del 67% ca. sul contributo pubblico previsto dal PSL. Pertanto si raggiungerà una percentuale di liquidazione pari a due terzi dell'importo previsto, il che fa ben sperare per una conclusione positiva delle rendicontazioni e liquidazioni nel 2015.

4) analisi degli esiti

Il GAL Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello nel corso di tutte le riunioni dell'anno 2013 ha costantemente monitorato l'evolversi della situazione, e ha intrapreso in particolare tutti gli sforzi possibili volti all'impegno completo delle risorse del PSL tramite l'approvazione di progetti concreti di attuazione delle singole misure. Alla fine del 2013 si è potuto constatare il raggiungimento del primo traguardo importante: alla data del 31/12/2013 risultava infatti approvato il 99,6% delle risorse a disposizione nel PSL. Anche per quanto concerne gli esiti dei progetti in corso e di quelli terminati si è constatata la piena realizzazione degli obiettivi prefissati dai progetti stessi e più in generale di quelli enunciati nel PSL. Nel corso delle suddette riunioni del GAL il coordinatore ha inoltre svolto una relazione approfondita anche riguardo agli esiti ottenuti tramite l'attuazione dei progetti LEADER.

II) Esecuzione finanziaria del Programma di Sviluppo Locale:

- spesa pubblica prevista dal PSL - spesa pubblica ammessa dal GAL

Spesa complessiva prevista dal PSL	4.511.618,75 Euro	
Spesa complessivamente impegnata	4.595.532,61 Euro	
Contributi pubblici previsti dal PSL	3.740.295,00 Euro	
Contributi deliberati dal GAL entro il 31/12/2012 (tenendo conto delle economie verificatesi all'interno dei progetti già liquidati)	3.740.295,00 Euro	100%
Contributi approvati dall'Autorità di gestione AdG al 31/12/2013 (tenendo conto delle economie verificatesi)	3.735.107,42 Euro	99,86%

all'interno dei progetti già liquidati)		

- percentuale di avanzamento GAL (ammesso/previsto)

Il PSL Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello prevedeva una spesa pubblica pari a € 3.740.295,00 a fronte di un investimento totale pari a € 4.511.618,75.

L'importo effettivamente impegnato tramite deliberazioni da parte del GAL fino al 31/12/2013 è stato totale rispetto alle previsioni, tenendo conto delle economie nel frattempo verificate in sede di liquidazione dei contributi (cfr. tabella alla pagina precedente). In sede di approvazione delle ultime domande di contributo da parte degli uffici provinciali competenti si è tuttavia riscontrato un leggero scostamento del suddetto importo, in quanto non sono state approvate spese ammontanti complessivamente ad Euro 5.187,58.

III) Disposizioni prese dal GAL per assicurare la qualità e l'efficienza dell'esecuzione:

- Attuazione del PSL

Anche nell'anno 2013 l'opera del GAL ha seguito due principali linee di azione: da una parte il lavoro di elaborazione delle misure e dei progetti concreti previsti dal Piano di Sviluppo Locale; dall'altro gli sforzi atti a dare concreta esecuzione ai singoli progetti e a prevedere la loro rendicontazione.

Le relative strategie di intervento sono state stabilite in sede delle citate cinque sedute del GAL nel corso del 2013, in seno alle quali si è trattato di concretizzare gli sforzi fino ad allora intrapresi per dare effettiva attuazione alle misure del PSL. Nel corso di molte sedute dei gruppi di lavoro composti dagli operatori dei diversi settori coinvolti sono dunque stati elaborati i progetti concreti riportati nell'elenco di cui sopra.

La presente relazione da un quadro della situazione di attuazione del PSL alla data del 31/12/2013 contenendo in parte anche accenni per il programma dei prossimi mesi.

- difficoltà riscontrate nella gestione del PSL

Nel corso dell'attuazione delle misure finora messe in cantiere in linea di massima non sono state riscontrate particolari difficoltà, anche se c'è da constatare un crescente aumento degli obblighi burocratici nella gestione dei progetti. È stato tuttavia necessario una iniziale fase di rodaggio in cui si è mostrata in modo sempre più evidente la necessità di coinvolgere gli uffici provinciali competenti nella fase preparatoria dei progetti stessi, così da rispettare le priorità del PSR.

Per quel che riguarda l'attuazione della misura 3.2.2 (risanamento dei centri dei paesi), in cui i beneficiari sono esclusivamente enti pubblici, e cioè i comuni, come già accennato sopra nel corso del 2010 si erano riscontrate grandi difficoltà in materia di appalti di lavori pubblici e al fatto che l'IVA non è ammissibile come costo all'interno del PSR: a seguito della variazione della normativa vigente a livello nazionale si è atteso per tutto l'anno 2010 per addivenire ad una soluzione in merito alla normativa da applicare in Provincia Autonoma di Bolzano per poter effettuare i rispettivi bandi. Inoltre si è anche trovata una soluzione alternativa per il riconoscimento dell'IVA, per cui - superata la suddetta fase di incertezza nelle procedure burocratiche da applicare, nel corso del 2011 l'iter per appaltare i lavori previsti nei progetti della misura 3.2.2 non ha incontrato ulteriori difficoltà.

Notevoli difficoltà si sono riscontrate all'interno della misura 421 per quel che riguarda la cooperazione transnazionale e interterritoriale nell'approvazione del progetto di cooperazione interterritoriale "Terre Ospitali", cui aderiscono GAL appartenenti a 6 regioni italiane diverse con altrettante Autorità di gestione. Ciò riguarda sia l'aspetto delle procedure da adottare per la stessa approvazione del progetto, sia anche per la finanziabilità delle singole azioni e ad



altri aspetti tecnici ed amministrativi, che vengono valutati singolarmente dalle rispettive AdG. Attualmente pare che tali incertezze e il diverso regime di ammissibilità delle spese avrà come conseguenza che con ogni probabilità i due GAL piemontesi usciranno dal progetto.

- informazioni volte a dare adeguata pubblicità al PSL e a motivare ed informare i potenziali beneficiari di singoli progetti all'interno dei territori del GAL (descrivere i media utilizzati)

Per assicurare un'adeguata informazione e per dare pubblicità alle misure previste dal PSL il GAL tramite il lavoro svolto dal coordinatore ha adottato le seguenti misure concrete nel corso del periodo interessato dalla relazione in oggetto:


- l'informazione periodica della popolazione tramite la pubblicazione delle misure e dei progetti all'interno delle riviste dei comuni della zona interessata dal programma, e cioè la "Deutschnonsberger Zeitung" per i comuni dell'Alta Val di Non, dell'"Ultner Blattl" e del "Pankrazer Blattl" per i Comuni della Val d'Ultimo nonché il bollettino di informazione redatto e distribuito dal Comune di Martello sul proprio territorio. Vista la distribuzione dei suddetti bollettini o riviste a tutti i residenti dei comuni interessati, tale informazione è stata capillare e ha raggiunto la totalità dei potenziali interessati.
- Nel corso del 2013 sono stati pubblicati vari articoli sui giornali della Provincia con informazioni sul Programma LEADER 2007-13 in generale piuttosto che di singole iniziative finanziate tramite il programma. In particolare possono essere citati vari articoli apparsi sui quotidiani "Dolomiten" e "Neue Südtiroler Tageszeitung". Infine i risultati della suddetta presentazione sono stati inseriti nel sito internet del GAL e pubblicati in tutti e quattro i summenzionati mezzi di informazione dei comuni dell'area LEADER.
- Il coordinatore del GAL Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello, assieme ai colleghi nonché a qualche membro dei altri GAL dell'Alto Adige anche nell'anno passato ha partecipato alla conferenza annuale organizzata dalla rete rurale austriaca (Netzwerk Land) e che quest'anno si è svolto a Fieberbrunn nel Tirolo/Austria. Anche questa edizione del convegno è stata anche dedicata alla presentazione dello stato di avanzamento per quanto concerne l'approvazione delle politiche agricole 2014-20 da parte delle autorità a livello comunitario e di conseguenza i passi necessari per la preparazione dei programmi di sviluppo rurale a livello delle Regioni e le prospettive per il LEADER all'interno della prossima fase di programmazione comunitaria.




Convegno della
Rete rurale
austriaca Netzwerk
Land a
Fieberbrunn
(Tirolo/Austria)

- In veste di rappresentante del GAL il coordinatore ha partecipato agli incontri di partenariato organizzati dalle Ripartizioni 31 (Agricoltura) e 32 (Foreste) per la preparazione dei nuovi programmi di sviluppo nel periodo di programmazione 2014-20. A tale scopo il Gal Val d'Ultimo - Alta Val di Non - Val Martello nella seduta allargata tenutasi il 13 giugno 2013 ha approvato gli orientamenti e le linee guida di maggiore interesse per la elaborazione del PSR 2014-20, orientamenti che poi sono confluiti in un *position paper* unitario degli attuali quattro GAL altoatesini, illustrato in occasione del secondo incontro del partenariato a fine giugno 2013.
- Le informazioni più importanti riguardanti il Programma di sviluppo locale vengono infine illustrate anche sul sito www.leader-udm.com, che è stato ultimato a metà del 2011 in lingua tedesca e in lingua italiana e che viene di volta in volta aggiornato. Il sito permette di dare la massima pubblicità in tempo reale alle misure adottate dal GAL, per annunciare e pubblicizzare in anticipo le attività di informazione e consulenza ecc..

Val d'Ultimo-Alta Val di Non-Val Martello, 31 marzo 2014

Il Presidente del GAL

 Dott.ssa Beatrix Mairhofer

Il coordinatore

 Dott. Hubert Ungerer

Tageszeitung

SÜDTIROL

> Redaktion Südtirol: info@tageszeitung.it

Hochwertiges Fleisch

Das von der EU finanzierte LEADER Projekt „Veredelung und Produktentwicklung LaugenRind“ hat zum Ziel, hochwertige Produkte aus eigenen Rindern herzustellen. Nicht nur aus den edlen Teilen der Rinder, sondern aus dem gesamten Rindfleisch.



Das LaugenRind

von Lisi Lang

Bereits vor acht Jahren wurde das Projekt LaugenRind in Uiten gestartet. Mittlerweile züchten laut Projektleiter Hubert Ungerer ungefähr 60 Bauern am Deutschensberg diese Rinder für die Fleischwirtschaft. „Meist handelt es sich um Grauviehassen, die sowohl für die Milch- als auch für die Fleischwirtschaft genutzt werden können. Vorrangig werden diese Rinder bei uns aber für die

„Wir haben mit Gruber & Telfer nach einer Möglichkeit gesucht, nicht nur die edlen Teile der Rinder zu verwerten, sondern das gesamte Fleisch der Tiere.“

Hubert Ungerer



Hubert Ungerer

wirtschaftliche Erzeugergenosenschaft, die Firma Gruber & Telfer und das Cluster Alimentaris im TIS. Die Förderung für dieses bald auslaufende Projekt beläuft sich auf 50.000 Euro. „Wir haben mit unseren Partnern nach einer Möglichkeit gesucht, nicht nur die edlen Teile des Rindfleischs zu verwerten sondern auch die restlichen Teile des Fleisches, da diese von vielen Betrieben einfach entsorgt werden. So entstand der Laugen Rind Ragù, das Gulasch, die Meraner Würstchen usw.“, sagt der Projektleiter.

Auf die Frage hin, ob durch dieses Projekt die Abwanderung aus einigen Gebieten im Ultental gestoppt werden könnte, sagt Ungerer nur, dass dafür ein Mix von verschiedenen Initiativen nötig sein werde und nicht nur eine In-

LEADER

(Ila) Leader Projekte sind Förderprogramme der Europäischen Union, mit welchen innovative Aktionen im ländlichen Raum gefördert werden. Ziel dieser Förderungen ist es ländliche Regionen Europas in ihrer eigenständigen Entwicklung zu unterstützen.

itiative alleine. „Die meisten unserer Mitglieder betreiben Mischwirtschaft auf ihrem Hof und züchten oft auch nur ein bis zwei Rinder. Dennoch ist das Interesse groß und es kommen immer wieder neue Bauern dazu“, so der Projektleiter. Um eine Abwanderung aber zu bremsen, müsse man auch die Dörfer attraktiver gestalten, den Tourismus und die Landwirtschaft ankurbeln um ein attraktiveres Umfeld schaffen.

Das Projekt „Veredelung und Produktentwicklung LaugenRind“ steht kurz vor dem Abschluss. Ob es auch in den kommenden Jahren noch von der EU unterstützt wird, ist fraglich. Dennoch will Hubert Ungerer an diesem Projekt weiterarbeiten, um die Wertschätzung der gesamten Produkte dieser herkunftsbezogenen Rinder zu steigern.

Quotidiano "Die Neue Südtiroler Tageszeitung" (02/05/2013)

Tageszeitung

Donnerstag, 2. Mai 2013 – Nr. 85

13

13

oler
urity
veger,

enz entzo-

reibereien
n, hat Si-
otbremse
henenden
ellt. „Auf
r betont.
hlt er die
hten dar-
nicht her-
schen und
Wer mit
n antantz,
ie die an-
Anrainer
nicht aus-
n hat sich
ine Wach-
betont der
lie Szene
ach einige
Schwarze
r ich“.
“ des Lan-
hönweger
len. „Die
s mehr Si-
ehmen die
die Polizei

nehmens-
Ziel ist es,
rts zu ru-
ausgebil-
m als Me-
lkohol an



Wirt Simon Schönweger vor seinem Lokal: 40.000 Euro pro Jahr für Security-Leute

ausüben müsste“. Und außerdem sei der Kostenfaktor nicht zu unterschätzen: „Nicht jeder Bar- und Pubbetrieb wird sich solche privaten Wachmänner so ohne weiteres leisten können“.

Orange Fahne

Die Gemeinde Ulten wurde vom Touring Club Italiano ausgezeichnet.



Beflaggt: Vertreter der LEADER-Region bei der Auszeichnung

volle Gebiete aufgewertet. Italienweit wurden bislang über 2.000 Gemeinden nach dem Modell der „Bandiere Arancioni“ zertifiziert, nur neun Prozent bekamen auch die Auszeichnung „Bandiera Arancione“. In Südtirol wurden in den vergangenen eineinhalb Jahren insgesamt 13 Gemeinden geprüft. An drei Gemeinden, Sterzing, Ulten und Sand in Taufers, wurde kürzlich die Auszeichnung „Bandiera Arancione“ vergeben.

Die „Bandiera Arancione“ wird vom Touring Club Italiano verliehen und ist das Pendant der „Bandiera Azzurra“, das an italienische Küstenorte vergeben wird. Damit werden touristisch wert-

Quotidiano "Dolomiten" (02/08/2013)

Die Mühe hat sich für Ulten gelohnt

AUSZEICHNUNG: Touring Club Italia verleiht Ulten „Orange Fahne“ – Leaderprojekt – Hoffnung auf Impulse für den Tourismus

BOZEN/ULTEN (ehr). Erstmals sind Südtiroler Gemeinden mit der „Orangen Fahne“ des Touring Club Italia (TCI) ausgezeichnet worden. Unter ihnen ist Ulten.

Die Gemeinde hat sich die Anerkennung über ein europäisches Leaderprojekt erarbeitet, ein Kooperationsprojekt der drei Lokalen Aktionsgruppen, Leader Ultental-Deutschnonsberg-Martell, Tauferer Ahrntal und Wipptal.

Im Mittelpunkt standen dabei die Aufwertung und Entwicklung der Gebiete. TCI-Bereichsdirektor Girolami und Projektkoordinator Hubert Ungerer berichtete bei der Verleihung in Bozen über die rund eineinhalbjährigen Verfahren und über die Kriterien, nach denen der Touring Club die „Orange Fahne“ jeweils für einen

Zeitraum von drei Jahren vergibt. Diese verschafft den ausgezeichneten Gemeinden Zugang zu einer Reihe von telematischen und traditionellen Werbe- und Kommunikationskanälen. „Wir erwarten uns touristische Impulse für die drei Leadergebiete“, sagte Hubert Ungerer.

Die Gemeinden wurden für ihre touristischen Einrichtungen und Dienste aus der Sicht des italienischen Gastes bewertet und es wurden so genannte Verbesserungspläne für die nachhaltige touristische Entwicklung ausgearbeitet. Für die Zertifizierung waren 250 Kriterien aus fünf Themenschwerpunkten zu erfüllen (Anreise, und Tourismusinformation, Beherbergung und Restauration, historisch-kulturelle Einrichtungen, Umwelt sowie Beschaffenheit und Charak-



Barbara Di Salvatore (von links) und Bürgermeister Ulrich Gamper (Gemeinde Proveis), Bürgermeisterin Beatrix Mairhofer, Leader-Koordinator Hubert Ungerer, Mirko Mocatti (Tourismusverein Deutschnonsberg), Monika Karnutsch (Tourismusverein Ultental) und Bürgermeister Georg Altstätter (Gemeinde Martell) mit der „Orangen Fahne“.

teristika der Ortschaften. Bedrückt waren die Prüfer des von den schindelgedeckten Holzhäusern im Ultental, Talmuseum in St. Nikolaus, gotischen Kirchlein in St. M. und der fantastischen Fernbis zu den Dolomiten. Auf den Fall versäumen dürfte einen Besuch des Nationalhauses Lahnersäge in St. Traud, fand der TCI. Das Dorf auch Ausgangspunkt für schöne Bergwanderungen.

Die „Orange Fahne“ wird verliehen, weil das Tourismus so leicht zu finden ist, der der historischen Architektur schätzt und erhalten wird und es viele Angebote für Sommer und Winter gibt.

► Siehe auch Seite 33 u

Quotidiano "Dolomiten" (02/08/2013)

„Abwanderung entgegenwirken“

STRUKTURSCHWACHE GEBIETE: 1,9 Millionen Euro aus dem Leadertopf für die Dorfgestaltung im Ultental und am Deutschnonsberg

VON LISA EHRENSTRASSER

ULTENTAL/DEUTSCHNONSBERG. 1,9 Millionen Euro sind aus dem Leaderprogramm 2007 – 2013 für Dorf-erneuerungs- und Dorfsanierungsprojekte in die fünf Gemeinden des Deutschnonsbergs und des Ultentals geflossen. Das sind 80 Prozent der Kosten.

Bei einem gemeinsamen Treffen der Leadergemeinden des Deutschnonsbergs und des Ultentals wurde Bilanz über die Maßnahme „Dorf-erneuerung und Dorfsanierung“ in den fünf Gemeinden gezogen. Im Rahmen des Leaderprogramms wurden zwölf Projekte in fünf Gemeinden verwirklicht oder sind noch in der Umsetzungsphase.

„Die EU sagt: Wichtig ist, dass die Dörfer schön gestaltet sind. So finden die Einwohner einen Anreiz, nicht aus den ländlichen Gebieten abzuwandern“, erklärt Leader-Koordinator Hubert Ungerer. 1,9 Millionen Euro sind zwischen 2007 und 2013 aus der Leader-Kasse in die strukturschwachen Gebiete am Deutschnonsberg und im Ultental geflossen. Das sind 80 Prozent der Projektkosten.

Proveis und Laurein

„In Proveis sind Höfgruppen eine typische Erscheinung rund um das Dorfzentrum“, erklärt Bürgermeister Ulrich Gamper. Zwei Höfgruppen, Mairhof mit sechs Höfen und Buacha mit vier, wurden bereits neu gestaltet. Dazu gehören beispielsweise Grünflächen, Pflasterungen, Brunnen und Zufahrtswege. In



Die Vertreter der Leader-Gemeinden Ultental-Deutschnonsberg (von links), Bürgermeister Hartmann Thaler (Laurein), Vizebürgermeister Georg Gruber (St. Pankraz), Bürgermeisterin Beatrix Mairhofer (Ulten), sie ist auch die Vorsitzende der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) von Leader, Leader-Koordinator Hubert Ungerer, Bürgermeister Patrik Ausserer (Unsere Liebe Frau im Walde/St. Felix) und Bürgermeister Ulrich Gamper (Proveis) vor einer Tafel des Kulturleitsystems am Rathaus in St. Pankraz.

der Höfgruppe Obergampen (vier Höfe) beginnen die Gestaltungsarbeiten.

Ein weiteres Projekt ist die Platzgestaltung mit Oberflächenentwässerung vor der Lourdeskapelle, die 1908 errichtet wurde. Gestiftet hat sie der Theologieprofessor P. Bernhard Thaler aus Proveis. Die Kapelle selbst wurde bereits saniert. Der Platz davor soll künftig Ausgangspunkt für Beerdigungen werden.

In Laurein wurde das zweite Projekt der Dorfgestaltung abgeschlossen. Die Landesstraße bis zur Kirche wurde neu gestaltet. Es gibt eine neue Fernwärmeleitung, unterirdische Parkplätze und eine neue Leichenkapelle. „Das dritte Baulos wird vorbereitet“, kündigt Bürgermeister Hartmann Thaler an. Es soll von der Kirche bis zum Gasthaus „Sonne“ reichen. Die Ausschreibung

der Planung wird vorbereitet. Die Finanzierung kommt bereits vom nächsten Leaderprogramm.

Unsere Liebe Frau im Walde/St. Felix

Im Dorf St. Felix wurden die Dorfeinfahrt und der Vorplatz des Rathauses schon vor längerem offiziell eröffnet. Es wurden in Zusammenarbeit mit dem Straßendienst die gefährliche Kreuzung entschärft und eine öffentliche Grünfläche mit Brunnen errichtet.

Vor dem Rathaus sind neue Parkplätze entstanden. Entlang der Gampenspasse wurden die Bushaltestellen neu angelegt, Fußgängerübergänge, Verkehrsinseln, Infotafel und eine Beleuchtung geschaffen.

„In Unsere Liebe Frau im Walde haben wir versucht, mit dem Meditationspark eine neue Visi-

tenkarte für das Dorf als Wallfahrtsort zu schaffen“, erläutert Bürgermeister Patrik Ausserer. Der Pilgerweg endet nun am Meditationspark. Es gibt Ruhebänke und viel Grün.

St. Pankraz und Ulten

In St. Pankraz wurde die Außengestaltung des Mehrzweckgebäudes und Rathauses bereits abgeschlossen. Ein Kulturleitsystem mit zehn Stelen und 13 Informationsstelen gibt geschichtliche, architektonische und kunsthistorische Informationen über das Dorf und seine Ortsteile. Dazu ist auch ein Flyer erschienen.

Nach diesem Vorbild soll ein Tourismussleitsystem beginnend beim Infopoint in Alpreid geschaffen werden. Auch die Tourismusbürofassade soll schöner gestaltet werden. „Das Erschei-

LEADER 2007 – 2013

Zwölf Projekte in fünf Gemeinden

- **Proveis:** Außengestaltung der Höfgruppen Mairhof, Buacha und Obergampen sowie Platzgestaltung vor der Lourdeskapelle
- **Laurein:** zweites Baulos der Dorfgestaltung und neue Leichenkapelle
- **St. Felix:** Gestaltung der Dorfeinfahrt und des Rathaus-Vorplatzes; **Unsere Liebe Frau im Walde:** Meditationspark
- **St. Pankraz:** Dorfgestaltung, viertes und fünftes Baulos
- **Ulten:** Außenraumgestaltung in Kuppelwies und beim Dokumentationszentrum F'Hochhaus (Brandopferplatz) und Schaffung eines Pendlerparkplatzes unterhalb des Rathauses.

nungsbild ist für beide Leitsysteme einheitlich“, erklärt Vizebürgermeister Georg Gruber.

In der Gemeinde Ulten wird derzeit in Kuppelwies die alte Landesstraße rückgebaut. Gleichzeitig werden Parkplätze neu angelegt. Am Brandopferplatz wurde die Außengestaltung des Dokumentationszentrums F'Hochhaus in das Leaderprogramm aufgenommen. „Die Ausschreibung ist sehr schwierig, weil es kaum Firmen gibt, die ein Angebot liefern können“, betont Bürgermeisterin Beatrix Mairhofer.

Unterhalb des Rathauses soll in Zusammenarbeit mit der Wildbachverbauung ein Pendlerparkplatz mit 29 Stellplätzen entstehen. Die Umsetzung ist 2014 geplant.

30 Samstag, 30. November/Sonntag, 1. Dezember 2013 - **Dolomiten**

Meran Burggrafenamt



Neue Brücke im Bogental in Riffian befahrbar

RIFFIAN (LPA). Die Arbeiten zum Bau der neuen Brücke auf der Staatsstraße beim Bogental in Riffian (im Bild) sind beendet. Seit Freitag kann die neue Brücke befahren werden. In den nächsten drei Wochen soll der

talseitige Gehsteig ab der Brücke verbreitert werden. Auf dem letzten auszubauenden Streckenabschnitt bis zum Luferweg werden die Arbeiten voraussichtlich innerhalb März 2014 abgeschlossen.



Jubiläumsausstellung am Meraner Rennweg

MERAN (fm). 1963 hat Prof. Hans Obkircher das Orchester der Musikfreunde Meran ins Leben gerufen. Zum 50. Geburtstags dieses Orchesters wurde in der Zweigstelle der Raiffeisenkasse Algund am Meraner Rennweg eine Jubiläumsausstellung eröffnet (im Bild). Diese ist bis Mittwoch zu den Öffnungszeiten der Bank frei zugänglich. Vorgestellt wurde auch der neue Internetauftritt des Orchesters. Am Samstagabend um 17 Uhr beginnt das Festkonzert im Meraner Stadttheater.

@ www.musikfreunde-meran.org

Kindergartenkinder stellen Bilder aus



Aufwertung für den Großen Laugen

GEMEINSCHAFTSPROJEKT: Forstbehörde saniert drei Laugensteige – Kosten von 149.000 Euro – AVS-Sektion Lana hält Wege instand

VON FLORIAN MAIR

UNSERE LIEBE FRAU IM WALDE/ST. FELIX/TISENS. Der 2434 Meter hohe Große Laugen ist ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderer. Aufgrund starker Erosion und Abnutzung mussten von der Forstbehörde drei Laugensteige auf den Gemeindegebieten Tisens bzw. Unsere Liebe Frau im Walde/St. Felix wieder auf Vordermann gebracht werden.

Über zwölf Kilometer Steige wurden saniert. Die Mitarbeiter der Forstbehörde benötigten dafür mehr als eine Tonne Baustahl, über vier Lkw-Ladungen Kastanienholz, 25 Tonnen Lärchenholz sowie rund drei Kubikmeter Zirbenbretter.

Fast 6000 Arbeitsstunden wurden in dieses Mehrjahresprojekt investiert. Das Material wurde mittels eines Hubschraubers oder mit Lkw, Traktoren usw. transportiert. „Die aufwendigste, zu sanierende Wegstrecke war jene vom Kessel bis auf die Lau-



AVS-Sektionschef Josef Hofer (von links), die Forstbeamten Martin Lochmann, Armin Fink und Lukas Leiter, die Bürgermeister Patrik Ausserer und Harald Stauder sowie Leader-Koordinator Hubert Ungerer.

genspitze“, berichtete Förster Martin Lochmann anlässlich des Projektabschlusses.

Das umfangreiche Projekt umfasste unter anderem die Wiederherstellung von Trassen, die Errichtung von Stufen und Treppen, das Aufstellen von Bank- und Tischgarnituren, die Festigung von Böschungen und das Anbringen von Seilsicherungen. Damit das Regenwasser kontrolliert abfließen kann, wurden Auskehren errichtet.

Die Bauleitung hatte Lukas Leiter vom Forstinspektorat Meran inne. Die Tisener Forststation betreute die Baustelle. Leiter dankte der Wildbach- und Lawenverbauung des Landes für die Zusammenarbeit.

In der Feier wurden die Gesamtkosten für die Sanierung mit 149.000 Euro angegeben: 119.200 Euro wurden über das Leaderprogramm finanziert. Die Gemeindeverwaltungen von Tisens und Unsere Liebe Frau im

Walde/St. Felix haben jeweils 8900 Euro zur Verfügung gestellt. Obwohl der Große Laugen und die Steige nicht auf Lanauer Gemeindegebiet liegen, hat die Gemeindeverwaltung aufgrund der touristischen Bedeutung die Sanierungsarbeiten mit 12.000 Euro unterstützt.

„Diese Arbeit hat nur dann einen Wert, wenn sie geschätzt wird und man die Steige instand hält“, betonte Lochmann. Der AVS Lana hat die Instandhaltung

der Steige übernommen. „Die Erosion am Großen Laugen hat stark zugenommen“, sagte Geologe Patrik Ausserer, der Bürgermeister von Unsere Liebe Frau im Walde/St. Felix.

Lanas AVS-Chef Josef Hofer dankte allen, die zum Gelingen der Sanierung beigetragen haben. Bei der Feier zugegen waren auch Lanas Bürgermeister Harald Stauder und Leader-Koordinator Hubert Ungerer.

© Alo Richter vorhofhausen

Rapporto Leader 2013

Leader 2007 – 2013 nelle Valli di Tures ed Aurina

Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione

39032 Campo Tures, Via del Municipio 8

info@leader-tat.com

www.leader-tat.com



Non si aspetta, si agisce!

Con il sostegno di:

		
Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale	Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige	Republik Italien Repubblica Italiana
EG-Verordnung Nr. 1698/2005		Regolamento (CE) n. 1698/2005
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete L'Europa investe nelle zone rurali		

Prefazione

Leader: nessuna soluzione standardizzata, ma preziosi spunti risolutivi!

Leader è un metodo straordinario per attivare il potenziale creativo di una regione e valorizzarlo in modo duraturo.

Gli attori locali spiccano per nuove idee, ma non sempre trovano un percorso standardizzato perché esse siano realizzate. Qui il programma Leader permette la realizzazione di soluzioni individuali ed efficaci, con le quali poter soddisfare le esigenze specifiche di una regione.

Qui non si tratta di applicare e sviluppare soluzioni di base per problemi che si evidenziano nell'ambito rurale, ma di creare un valore aggiunto per le persone che vincono nella regione oggetto dell'intervento di sviluppo.

L'anno trascorso non è stato facile per il gruppo d'azione locale delle Valli di Tures ed Aurina. Già nel novembre 2012, contro la cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione delle Valli di Tures ed Aurina, è stato aperto un procedimento di verifica per l'utilizzo corretto di fondi della Comunità Europea. Solo nel 2013 il procedimento è stato archiviato sulla base di un parere della Commissione Europea.

La consapevolezza di aver agito sempre ai sensi della regione e delle persone che vi abitano ci ha convinto a continuare nonostante tutto. La forza di volontà è stata ripagata!


L'anno scorso il gruppo d'azione locale delle Valli di Tures ed Aurina ha approvato 12 progetti Leader, per un costo complessivo di 621.400 Euro ed uno stato di realizzazione del 30,5 per cento.

I progetti regionali conclusi con successo necessitano di un impegno notevole e della disponibilità degli attori coinvolti ad incontrarsi. L'Europa può solo crescere se iniziamo nel piccolo a rinunciare alla politica campanilistica per pensare in modo più globale e solidale.



Helmuth Innerbichler – Presidente del GAL delle Valli di Tures ed Aurina



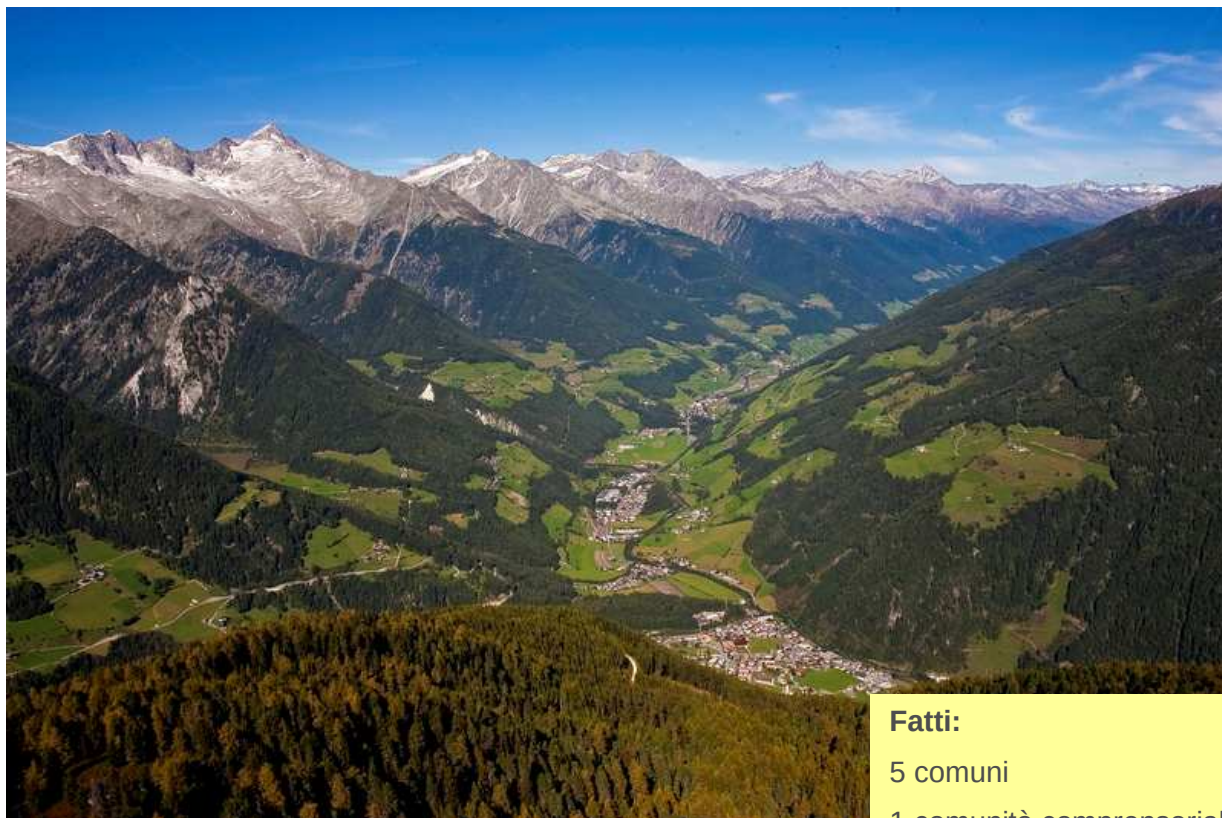

Fatti:

5 comuni

1 comunità comprensoriale

1 destinazione turistica

16.426 abitanti

629 km² area

Responsabilità per la nostra regione

L'area di sostegno delle Valli di Tures ed Aurina

La regione di sostegno delle Valli di Tures ed Aurina comprende i seguenti comuni: Valle Aurina, Gais, Selva di Molini, Predoi e Campo Tures. L'intera area comprende un territorio di 629 km² ed è caratterizzata da un ambiente agricolo. Nell'area nord-orientale dell'Alto Adige, le Valli di Tures ed Aurina sono da considerarsi periferiche, ma omogenee come micro-regione. La distanza tra il comune centrale di Campo Tures e la città di Bolzano, capoluogo di provincia, è di 100 km.

Struttura demografica (numero di abitanti) nei comuni Leader allo stato del 31.12.2012

Comune di Gais	3.179
Comune di Selva dei Molini	1.462
Comune di Campo Tures	5.321
Comune della Valle Aurina	5.940
Comune di Predoi	588

Fonte: Annuario statistico 2013 ASTAT, capitolo 3, popolazione

Soprattutto il finale di valle e le valli laterali di quest'area sono deboli da un punto di vista strutturale, nonché economicamente svantaggiate. In base ad uno studio dell'istituto di ricerca economica (WIFO) della camera di commercio di Bolzano dell'anno 2011, i cinque comuni delle Valli di Tures ed Aurina sono da valutare, in base ai due fattori dello **sviluppo demografico** e delle **strutture socioeconomiche**, quanto segue:

Comune di Gais	media	Sviluppo demografico, nonchè struttura economica e sociale
Comune di Selva die Molini	molto debole	Sviluppo demografico, nonchè struttura economica e sociale
Comune di Campo Tures	forte	Sviluppo demografico, nonchè struttura economica e sociale
Comune della Valle Aurina	debole	Sviluppo demografico, nonchè struttura economica e sociale
Comune di Predoi	molto debole	Sviluppo demografico, nonchè struttura economica e sociale

Fonte: analisi dei comuni IRE, 2011.

Soprattutto nei comuni strutturalmente deboli Leader può dare un contributo importante per rivalorizzare della regione. Nell'ambito del programma Leader 2007 – 2013 sono a disposizione delle Valli di Tures ed Aurina 5,16 milioni di € in forma di contributi di sostegno per l'economia locale. Sulla base del piano d'azione locale (PAL) per le Valli di Tures ed Aurina si programmano e si realizzano diversi progetti per i singoli provvedimenti di intervento previsti.

Il gruppo d'azione locale delle Valli di Tures ed Aurina

È compito del gruppo d'azione locale (GAL) delle Valli di Tures ed Aurina sostenere ed incentivare la realizzazione della strategia Leader a livello locale. Per fare questo – ai sensi del principio del “bottom up” – è necessario coinvolgere i promotori del progetto in loco. Inoltre i provvedimenti ed i progetti intrapresi dovranno aspirare a soddisfare i principi intrinseci di Leader, ovvero sostenere l'innovazione.

Il GAL delle Valli di Tures ed Aurina si compone di 13 membri, di cui 5 appartenenti alle amministrazioni pubbliche, mentre gli altri 8 arrivano dal mondo dell'imprenditoria privata. Nel 2013 i membri del GAL delle Valli di Tures ed Aurina si sono riuniti complessivamente in 7 riunioni, svoltesi il 31.01.2013, il 28.03.2013, il 18.04.2013, il 30.05.2013, il 27.06.2013, il 13.09.2013 ed il 05.12.2013.

Nell'ambito di queste riunioni sono state valutate proposte di progetto, discusse altre e delegate altre ancora. A ciò si sono aggiunte le valutazioni e le analisi dei gradi di realizzazione di progetti in corso d'opera.

„Realizzare progetti Leader con successo“: esecuzione del progetto e monitoraggio

Il GAL delle Valli di Tures ed Aurina, insieme al management del GAL, è responsabile della realizzazione efficiente del progetto approvato, ovviamente rispettando le normative UE e le leggi nazionali e provinciali.

Per tener fede a questa responsabilità operativa, il management del GAL accompagna i singoli promotori dei progetti durante le diverse fasi di implementazione, li sostiene nel superamento degli ostacoli amministrativi e contenutistici, monitorando le varie fasi del progetto grazie ad una check-list progettuale appositamente elaborata. Il corrispettivo grado di realizzazione, possibili cambiamenti del contenuto del progetto o ritardi delle varie fasi saranno in questo modo resi visibili e registrabili.

I cambiamenti riscontrati saranno presentati dal management alla seduta del GAL, ove si discuterà di possibili soluzioni per una più efficace implementazione del progetto previsto.

Il promotore del progetto verrà poi incaricato di applicare le soluzioni individuate e messo nelle condizioni di poterle realizzare.

Check-list del grado di realizzazione dei progetti Leader nelle Valli di Tures ed Aurina

1. INDICAZIONI SUL PROGETTO	
Titolo del progetto:	
Numero del progetto:	
Promotore:	
Direttore del progetto:	

Ulteriori collaboratori:	
Durata del progetto:	
Data di delegat GAL Valli di Tures ed Aurina:	
Data di inoltro presso l'ente provinciale di competenza:	
Documentazione inviata esaustiva?	Sì  No 
Quale documentazione manca?	-
Data approvazione:	
Numero del decreto:	
Termini di implementazione (vedi indicazioni die mesi, secondo il documento che ne certifica l'approvazione):	
FINANZIAMENTO	
Somma complessiva:	
Richiesta in %:	
Contributo:	
Autofinanziamento:	
STATUS DEL PROGETTO	
Crisi del progetto:	
Progetto in difficoltà: - rallentamenti temporanei - modifica del contenuto del progetto - altro Si prega di inserire la descrizione al punto 3!	
Progetto in realizzazione secondo il programma:	

FASI DEL PROGETTO		
Inoltro del progetto:	concluso	
	in esecuzione	 (inserire data)
Approvazione del progetto:	concluso	
	in esecuzione	
Esecuzione del progetto:	concluso	
	in esecuzione	
Resoconto parziale (su richiesta):	concluso	
	in esecuzione	
Pagamento anticipato:	concluso	
	in esecuzione	
Chiusura dei conti:	concluso	
	in esecuzione	
Liquidazione contributo di sostegno:	concluso	
	in esecuzione	
CHIUSURA DEI CONTI FINALE/PARZIALE		
Inoltrata in data:		
Somma complessiva presentata alla chiusura dei conti:		
di cui ammessi per il contributo di sostegno:		
Somma complessiva della chiusura dei conti approvata:		
Somma del contributo di sostegno elargito:		
Data della liquidazione:		
PIANTO TEMPORANEO (vedi allegato per il piano temporaneo generale per il periodo Leader 2007 – 2013)		
ATTENZIONE: per ogni progetto vale il termine di implementazione secondo il documento di approvazione!		
La data fissata per l'implementazione del progetto può essere rispettata? (vedi documento di approvazione)	Sì  No 	
Si dovrà o si deve prevedere un prolungamento della data fissata per la realizzazione del progetto?	Sì  No 	
Si prega di informarsi presso l'ente provinciale di competenza sui passi formali da intraprendere.		

2. INDICAZIONI SULL'ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO	
L'assegnazione dell'incarico è avvenuta in forma scritta?	Sì  No 
Quante offerte vengono raccolte prima di assegnare l'incarico? Elenco in base ad ogni passaggio secondo i preventivi inoltrati	
Passaggio 1: Management del progetto e assistenza	0  1 - 3  3+  Quale somma è stata già vincolata? (inserire qui)
Passaggio 2 (...)	0  1 - 3  3+  Quale somma è stata già vincolata? (inserire qui)
ANNOTAZIONI	
Quale somma complessiva è stata vincolata all'interno del progetto?	- (indicazioni in €) - (indicazione in % sulla somma complessiva vincolata)
3. VALUTAZIONE/COMMENTO BREVE	
4. DIFFICOLTÀ RISCONTRATE	
5. PROSSIMI PASSI/PROVVEDIMENTI	

Risultati del Monitoring per l'anno 2013:

La checklist serve in primis al promotore come riflessione sul suo progetto, poichè essa serve a decifrare lo status quo dello stesso e ad evidenziare eventuali difficoltà. D'altro canto esso rappresenta per il GAL uno „strumento di controllo“ per esaminare lo stato di esecuzione del progetto oppure per capire se vi sono dei problemi nella realizzazione del progetto e se si necessita di un recupero nella sua esecuzione.

In presenza di difficoltà queste sono inizialmente discusse nella seduta del GAL. In accordo con il management del GAL si elaborano proposte di soluzione e possibili provvedimenti.


Questi sono poi discussi con il promotore del progetto ed implementati. Il management del GAL ha organizzato un processo di monitoraggio continuo, eseguendo nella primavera del 2013 un'indagine sullo stato di esecuzione su tutti i beneficiari Leader. In seguito all'indagine e alla valutazione dei check sui progetti si è evidenziata la necessità di agire in alcuni casi:

Ad esempio si è reso necessario intervenire presso l'ente provinciale competente allo scopo di ricevere un prolungamento della data di realizzazione per il progetto nr. 009, relativo al „rinnovo paesano di S. Pietro“. Per il progetto nr. 010 „Sentiero Sunnsat – concetto globale e lotto 2010 „ da parte del promotore è stato richiesto un prolungamento della data di consegna del computo finale. Per i progetti nr. 028 „Sentieri del sole della Valle Aurina“ e nr. 030 „Presentazione digitale della regione vacanze delle Valli di Tures ed Aurina“ il preventivo è stato corretto ex post per il regolamento De-Minimus.

Un aiuto particolare da parte del GAL si è reso necessario per il progetto nr. 012 „Mondo contadino e mondo dell'acqua della Valle di Selva di Molini“. Il finanziamento residuo del progetto si è trovato in difficoltà per una serie di motivi: da un lato non è stato possibile restituire al promotore l'IVA non detraibile e di conseguenza la parte di autofinanziamento è notevolmente aumentata; dall'altro lato la somma del terzo pagamento è stata pagata solo 11 mesi dopo la consegna del resoconto parziale; fatto che ha portato il promotore in una stretta finanziaria non indifferente. In entrambi i casi il management del GAL è stato utile nella ricerca di possibili soluzioni, intervenendo presso gli enti di riferimento della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige. L'intervento del management quindi ha evitato il blocco del progetto.

Nell'ambito del processo di monitoring il management del GAL ha rilevato anche **la durata media delle diverse fasi dei progetti sostenuti**, sintetizzando il risultato per provvedimento. Nei fatti è stata analizzata la durata media (in giorni) delle seguenti tre fasi:

1. **durata media dell'approvazione progettuale** (dal giorno di presentazione della richiesta di sostegno fino al giorno dell'approvazione del progetto tramite decreto);
2. **durata media dell'esecuzione progettuale** (dal giorno dell'approvazione del progetto tramite decreto fino al giorno della consegna del resoconto finale presso l'ente provinciale competente);
3. **durata media della conclusione del progetto** (dal giorno della consegna del resoconto finale fino alla liquidazione del contributo di sostegno approvato).

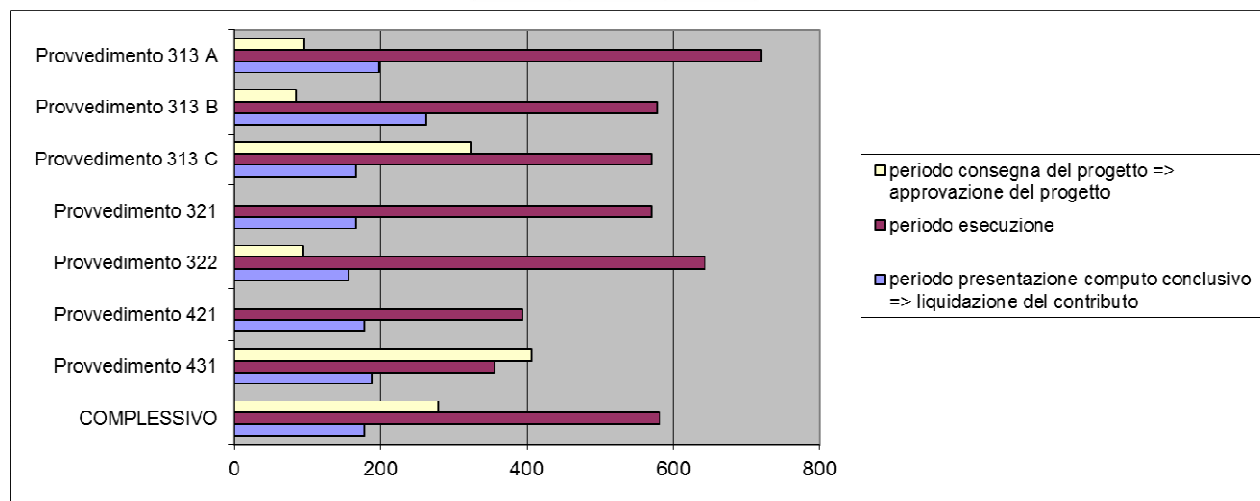

I risultati di queste rilevazioni si possono sintetizzare come segue:

1. durata media dell'approvazione progettuale:

L'approvazione della richiesta di sostegno per il provvedimento 313 B ha necessitato del maggior tempo medio con 262 giorni. Il GAL delle Valli di Tures ed Aurina ha qui proposto il progetto di sostegno nr. 034 „Allaccio della Biowatt Taufers S.r.l. con la rete di teleriscaldamento“. Il provvedimento di approvazione per questo progetto si è dimostrato relativamente complesso, soprattutto perchè a livello provinciale è stato l'unico progetto che ha attivato questo specifico provvedimento di sostegno. Da sottolineare è soprattutto la conseguente e ben calibrata collaborazione tra il comune di Campo Tures, nelle veci di promotore del progetto, l'ente provinciale competente del dipartimento agricolo ed il tesoro della Provincia.

In contrapposizione a ciò il provvedimento nr. 322 ha impiegato solamente 156 giorni medi per l'approvazione della fase progettuale.

2. durata media dell'esecuzione progettuale:

La durata media più lunga nell'esecuzione progettuale è stata quella del provvedimento 313 A con un numero di giorni pari a 721, seguito dal provvedimento nr. 322 con una durata media di 644 giorni. Questa fase relativamente lunga di esecuzione per entrambi i provvedimenti si spiega col fatto che gli agevolati sono esclusivamente amministrazioni pubbliche (comuni), dove l'iter di assegnazione dei lavori si svolge secondo regole pubbliche e che vanta un notevole dispendio di tempo rispetto ai promotori privati.

3. durata media della conclusione del progetto:

Per quanto riguarda la durata media della conclusione del progetto, il provvedimento nr. 431 si dimostra essere ampiamente il più lungo. Questo alto valore medio si spiega con un lungo e difficile procedimento amministrativo (vedi pagina 15 e seguenti) e la connessa

 ELER	 AUTONOMA REGIONE SARDEGNA	 MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLE POLITICHE RURALI E DELLO SVILUPPO RURALE
Hier werden die Ausgaben in die verschiedenen Kategorien	 EG - Vor 2007/2013	 EG - Nach 2007/2013

sospensione dei pagamenti di contributi di sostegno ormai approvati. Al secondo posto si attesta il provvedimento nr. 313 C con una durata media di 324 giorni. É importante sottolineare che i provvedimenti nr. 421 e 321 non forniscono nessun valore, poichè i progetti riferiti a questi due provvedimenti al 31.12.2013 si trovano ancora in esecuzione e non è stata quindi ancora depositata nessuna fatturazione finale.


Per la primavera 2014 è previsto un altro monitoring per rilevare nuovamente lo stato attuale dei progetti che, a causa di questa tardiva delega verso la fine del 2013, non sono stati considerati nel monitoring precedente.

Progetti Leader 2013: fatti e dati

Il gruppo d'azione locale (GAL) delle Valli di Tures ed Aurina ha delegato nell'ambito del progetto Leader 2007 - 2013 complessivamente 49 progetti su diversi provvedimenti. Nell'insieme sono stati attivati **contributi di sostegno del valore di € 5.238.912,19** il che corrisponde al **100%** dei contributi complessivi a disposizione dei progetti.

Leader 2007-2013: supervisione dei progetti e del numero di progetti eseguiti in base agli obiettivi tematici:

(situazione al 31.12.2013)

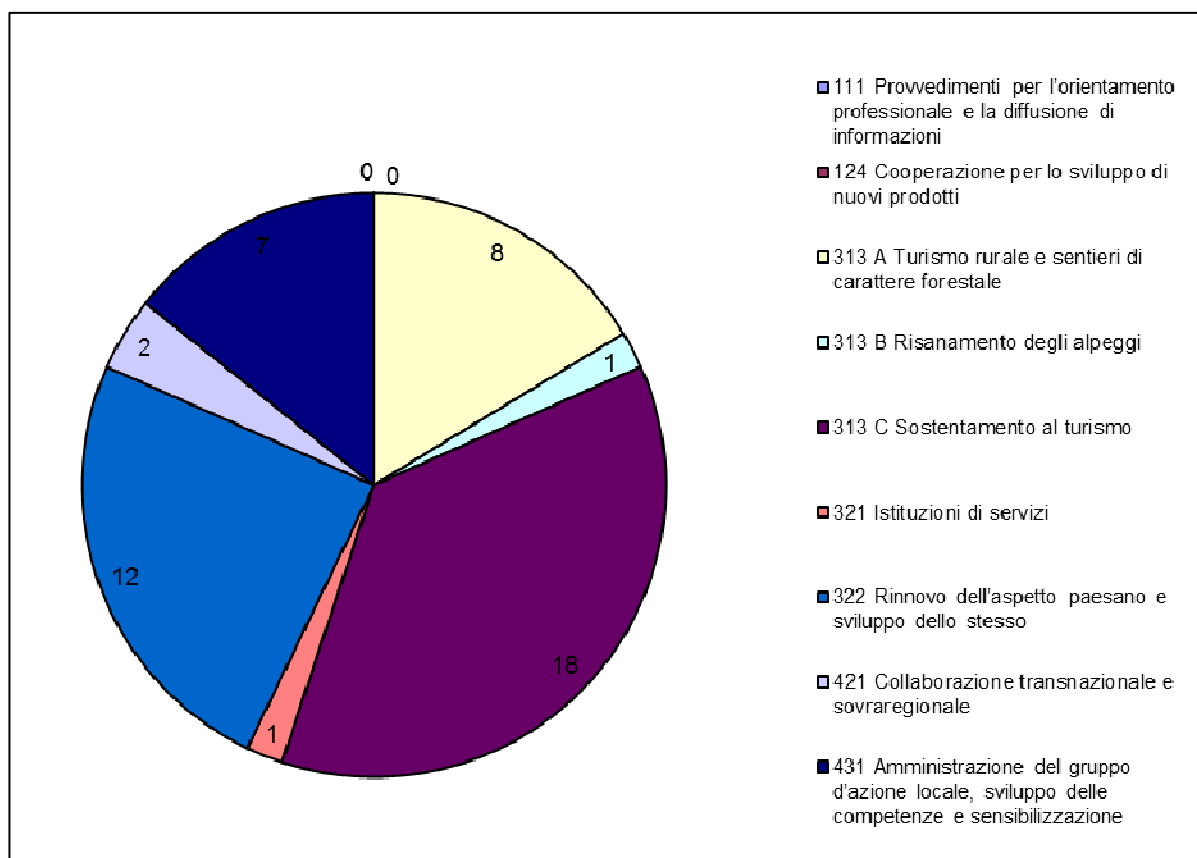


Nel 2013 il GAL delle Valli di Tures ed Aurina ha complessivamente delegato **12 progetti**. Questo corrisponde ad **un contributo di sostegno attivo di 621.416,24 €**. Tutti i progetti delegati nel 2013 sono stati approvati con decreto dell'assessorato provinciale competente della Provincia Autonoma di Bolzano entro il 31.12.2013.

Sommario dei progetti delegati nel 2013

	Provvedimento	Titolo del progetto	Contributo di sostegno
1	322	Installazione del portale di benvenuto del sentiero del sole	€ 32.000,00
2	322	Rinnovo piazzale paesano di S. Giacomo - lotto 2	€ 113.560,78
3	322	Diversi lavori relativi al rinnovo paesano	€ 31.389,51
4	313 C	Sentieri del sole della Valle Aurina – parte 3 – marketing	€ 51.040,00
5	322	Riqualifica edilizia e realizzazione sala culturale a Predoi	€ 78.472,27
6	313 C	Marketing Bandiera Arancione	€ 50.029,50
7	322	Rinnovo paesano di Caminata – ampliamento	€ 61.689,32
8	313 A	Sentiero – pista ciclabile per famiglie „Martin pescatore“ a Gais, installazione delle insegne, unità didattiche e attività informative	€ 44.800,00
9	313 C	Folder tematici per la regione Valli di Tures ed Aurina	€ 39.200,00
10	421	Terre Ospitali Valli di Tures ed Aurina (progetto di cooperazione)	€ 63.800,00
11	313 C	Miglio culturale delle Valli di Tures ed Aurina - Reloaded	€ 34.334,86
12	431	Amministrazione del gruppo d'azione locale – sviluppo delle competenze e sensibilizzazione	€ 21.100,00
Somma complessiva			€ 621.416,24 €

Contributi di sostegno attivati 2013

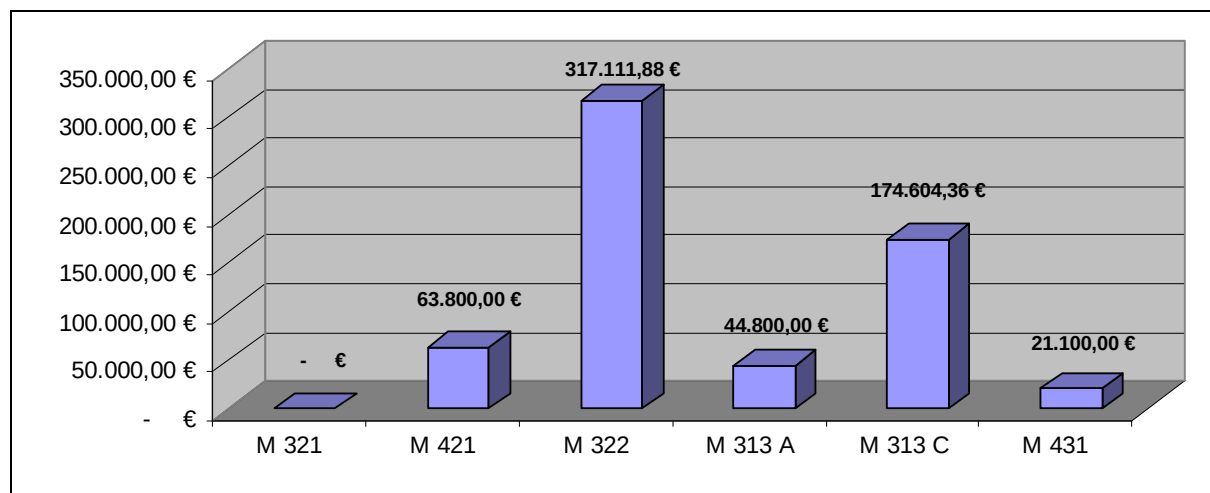

Leader 2007 – 2013: stato delle realizzazioni e comparazione pluriennale

(situazione al 31.12.2013)

	2010	2011	2012	2013
Somma liquidazioni in Euro	€ 135.040,00	€ 588.877,20	€ 1.004.176,13	€ 1.578.056,13
Somma liquidazione in %	2,61%	11,40%	19,44%	30,55%

Punti di forza e di debolezza di Leader delle Valli di Tures ed Aurina

(+) Successi

La quasi decennale **esperienza** del GAL delle Valli di Tures ed Aurina nella progettazione e realizzazione di iniziative Leader porta con sé i suoi frutti: grazie alle ampie iniziative di carattere pubblico da parte del management del GAL il programma Leader dell'UE è ormai diventato un concetto chiaro tra la popolazione delle Valli di Tures ed Aurina. Molte persone della regione conoscono i progetti Leader oppure si sono approcciate attivamente ad uno di essi.

Tra gli **attori più forti in loco** bisogna certamente contare le cinque amministrazioni comunali, le associazioni e le leghe turistiche all'interno dell'area di intervento Leader, nonché attori dall'ambito rurale. I provvedimenti di sostegno Leader hanno sostanzialmente contribuito a costruire una **rete molto funzionale** e apprezzata tra gli interessati, nonché a migliorare la **disponibilità a cooperare** tra loro.

Meno campanilismo, più collaborazione: la programmazione e realizzazione comune di azioni e provvedimenti sovracomunali e intersettoriali sono stati inizialmente una sfida molto ambiziosa, ma allo stato attuale tale impegno è certamente divenuto una realtà quotidiana. Questo è comprovato da progetti come "Masi attivi della Valle Aurina", il "miglio cultural della Valli di Tures ed Aurina" oppure il progetto cooperativo "Bandier Arancione".

Leader ha sostenuto ed incentivato nella regione **un approccio innovativo e orientato** all'azione diretta. Grazie al programma di sostegno siamo riusciti ad infondere tra gli attori l'importanza del **valore aggiunto regionale** e a incentivare i piccoli circoli economici locali. Progetti Leader di successo, come il programma di animazione "Bauernlandzwerge" oppure "il mondo dell'acqua" a Selva di Molini hanno inoltre ampliato l'autocoscienza turistica della regione turistica della Valli di Tures ed Aurina.

(-) Difficoltà

Realizzare progetti è un'attività complessa ed è ovvio e naturale che nel corso della loro implementazione ci possano essere ostacoli e difficoltà impreviste. I problemi tipici che a volte compaiono nella realizzazione di un progetto sono:

- cattiva cooperazione;
- scarse capacità;
- pianificazioni temporali o finanziarie irrealistiche;
- responsabilità non chiare;
- decisioni che non vengono prese.

Anche i progetti Leader delle Valli di Tures ed Aurina non rimangono immuni di fronte a questi tipici problemi, tuttavia, grazie alla lunga esperienza dei promotori, nonché alla consulenza professionale e al monitoraggio progettuale applicato dal management del GAL, queste difficoltà possono essere risolte abbastanza velocemente e sempre negli interessi dei protagonisti del progetto.

I problemi più grossi per la realizzazione nei tempi e contenuti prestabiliti da Leader in questo periodo di sostegno derivano da una situazione giuridica a volte incerta in riferimento all'esecuzione tecnico-amministrativa di progetti Leader.

Un controllo della Guardia di Finanza presso la Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione professionale delle Valli di Tures ed Aurina ha portato al sospetto di violazione della legislazione vigente sugli appalti pubblici. Concretamente si tratta del sospetto che alcuni stanziamenti del valore di 191.471 Euro verso i manager del GAL, in un periodo di tre anni, fossero ingiustificati. La tesoreria della Provincia, nonché l'ente responsabile per i programmi Leader presso il dipartimento dell'agricoltura della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, nel novembre del 2012 hanno reagito a quest'accusa della Guardia di Finanza con la sospensione dei pagamenti dei contributi di sostegno*, nonché con l'apertura di un procedimento di verifica giuridica sui versamenti ai beneficiari. La Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione professionale delle Valli di Tures ed Aurina è stata quindi spinta a rigettare tali accuse. Questo infatti è stato fatto, appellandosi alla natura privatistica della Cooperativa Leader, per la quale non valgono le stesse regole di assegnazione per gli appalti, come per il settore pubblico. Dopo che gli enti provinciali competenti in materia e l'avvocatura di Stato hanno convenuto di non riuscire a chiarire la questione in modo

* Nota dell'Autorità di Gestione: in attesa degli esiti del procedimento amministrativo avviato dalla pubblica amministrazione sono stati sospesi esclusivamente i pagamenti a favore della Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Valli di Tures ed Aurina. I tempi per la chiusura del procedimento si sono protratti poiché era necessario attendere la risposta della Commissione Europea. Il procedimento è stato archiviato due settimane dopo il ricevimento del parere della Commissione Europea.



definitivo, nel febbraio 2013 è stata interpellata la Commissione Europea per dare un parere a riguardo.

Il parere della commissione è stato consegnato nel luglio 2013 e accerta in modo inequivocabile che la Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione professionale delle Valli di Tures ed Aurina non è un istituto di diritto pubblico, poichè non soddisfa tutte le premesse necessarie per esserlo in base all'art. 1 (9) delle direttive UE 18/2004.

Il 19.08.2013, sulla base del parere della Commissione UE, il dipartimento agricolo della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige ha quindi archiviato il procedimento verso la Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione professionale delle Valli di Tures ed Aurina.

Dal procedimento amministrativo aperto e dalle sue conseguenze il GAL delle Valli di Tures ha subito un danno finanziario e di immagine, ma l'esperienza vissuta ha avuto anche risvolti positivi: il GAL delle Valli di Tures ed Aurina punta ora ancora più intensamente all'**acquisizione delle conoscenze e delle competenze nell'amministrazione dei progetti di sostegno dell'UE.**

In aggiunta a ciò il GAL delle Valli di Tures ed Aurina – nonostante il massiccio ritardo nella liquidazione di progetti Leader già conclusi nel **2013, è riuscito a raggiungere un tasso di realizzazione e liquidazione del 30,55 per cento.** (vedi stato delle realizzazioni pag. 12).

Il management del GAL delle Valli di Tures ed Aurina

Nel 2013 il management del GAL delle Valli di Tures ed Aurina è stato attivo operativamente e strategicamente, interessandosi alla realizzazione del PAL delle Valli di Tures ed Aurina, portando avanti i progetti che gli sono stati delegati e accompagnando i diversi promotori nella riuscita delle iniziative. Accanto alla collaboratrice Manuale Marcher, è stata attiva Miriam Rieder (gestione operativa e coordinamento) all'interno della cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione professionale delle Valli di Tures ed Aurina. Nel ottobre del 2013 è stata assunta una nuova collaboratrice, la signora Marlen Mittermair.

Da questa data il management del GAL della Valli di Tures ed Aurina vanta una quota rosa del 100%. L'ente di coordinamento Leader ha la sua sede presso il municipio del comune di Campo Tures. Esso rimane aperto al pubblico da lunedì a venerdì per tutto il giorno.

Leader – nuovi impulsi per l'area agricola

Grazie al programma Leader l'anno scorso è stato possibile far partire una serie di progetti, tutti ancorati all'interno della regione di intervento, dall' idea iniziale alla realizzazione finale. Questi programmi hanno dato importanti impulsi all'area agricola. I progetti sono caratterizzati da un'ampia e variegata ricchezza.



***"Se vuoi andare veloce, allora corri da solo.
 Se vuoi andare lontano, allora cammina
 insieme agli altri!"
 (detto africano)***

Verranno ora presentati alcuni dei progetti delegati o realizzati nello scorso anno per mostrare l'effetto innovativo e a lungo termine che il programma Leader ha avuto per la regione d'intervento delle Valli di Tures ed Aurina.



Presentazione digitale della regione vacanze Valli di Tures ed Aurina (VTA)

Titolo del progetto: **"Presentazione digitale della regione vacanze VTA"**

Provvedimenti: **313C**

Promotore del progetto: **Lega turistica della regione vacanze delle Valli di Tures ed Aurina**

Breve descrizione del progetto: Nell'ambito del progetto „Presentazione digitale della regione vacanze VTA“ si intende realizzare una pubblicizzazione e riqualificazione dell'offerta turistica locale, premendo sulle particolarità dell'area, nonché sull'esecuzione di attività di marketing organizzate in comunione tra i vari attori della zona d'intervento. Nell'esecuzione del progetto le offerte turistiche esistenti sono organizzate in un'unica piattaforma digitale e comunicate all'esterno tramite essa. Il progetto prevede quindi la realizzazione di un sito internet, compreso di materiale fotografico e filmati per l'area Leader delle Valli di Tures ed Aurina, grazie ai seguenti elementi:

- la creazione di un gruppo di lavoro internet che comprenda tutti i principali rappresentanti della vallata
- lo sviluppo di un libro di regia per i contenuti che dovranno essere presentati
- la grafica, il layout e la programmazione
- lo sviluppo del materiale fotografico e filmato per l'intera area
- l'inserimento di tutti i contenuti nel CMS
- l'ottimizzazione dei motori di ricerca
- il coinvolgimento di tutti i canali di social media disponibili.

www.tauferer.ahrntal.com



Bandiera Arancione

Titolo del progetto: **"Bandiera Arancione"**

Provvedimento: **421**

Promotore del progetto: **Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione professionale**

Breve descrizione del progetto: L'obiettivo del progetto "Bandiera Arancione" è la valutazione qualitativa dei singoli paesi dei quattro comuni dell'area Leader in base ad un catalogo di criteri del Touring Club Italiano. Quest'ultimo è attivo fin dalla sua fondazione nel 1894 nell'ambito dello sviluppo di un turismo di qualità, la rivalutazione delle risorse e della cultura e del patrimonio naturale italiano. La "Bandiera Arancione" è uno degli strumenti con cui il Touring Club Italiano garantisce ai turisti una determinata qualità e alla località un oggettivo criterio di misurazione. Grazie alla certificazione raggiunta con successo e l'assegnazione del sigillo di qualità caratterizzato appunto dalla "Bandiera Arancione" per i comuni premiati si ottiene l'accesso alla rete di contatti del TCI e quindi una serie di possibilità: tra queste l'appartenenza ad una limitata cerchia di località selezionate dal TCI come destinazioni turistiche particolarmente apprezzate in Italia per qualità e sostenibilità. Il focus della rete si realizza in primis nell'ambito del marketing e della comunicazione (apparizioni internet, social media, newsletter, partecipazione a fiere, advertising, apparizione sul giornale del TCI, ecc.)



Rinnovo paesano di Gais

Titolo del progetto: **Rinnovo paesano Gais**

Provvedimento: **322**

Promotore del progetto: **Comune di Gais**

Breve descrizione del progetto: L'esistente strada „Talfriedenstrasse“, sviluppatasi in modo molto lineare ed incontrollato, dovrà essere riassetata in modo moderno e adattandosi al nuovo ambiente sociale. Le basi per tale interventi di rinnovo sono la realizzazione di aree dedicate per veicoli motorizzati e non, l'allestimento di marciapiedi con lastricati diversi e livelli differenziati, il rallentamento della velocità di transito con conseguente miglioramento della sicurezza per i pedoni, l'installazione di un sistema di illuminazione efficiente e a basso impatto energetico, la riqualificazione dell'intera area grazie al mantenimento e/o creazione di aree verdi, il divieto di parcheggi selvaggi attraverso l'eliminazione di aree non regolate e la creazione di nuove offerte che possano risultare attrattive al pubblico. L'obiettivo del provvedimento è il miglioramento della qualità abitativa e di vita, nonché l'aumento dell'attrattività del paese di Gais per raggiungere un effetto positivo sul turismo di tipo rurale.




Titolo del progetto: **"Realizzazione concettuale della comunicazione turistica per la regione VTA"**

Provvedimento: **313C**

Promotore del progetto: **Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione professionale delle Valli di Tures ed Aurina**

Breve descrizione del progetto: La realizzazione concettuale della comunicazione turistica per la regione VTA prevede due elementi costruttivi, ovvero l'affissione di segnaletica unificata su tutta l'area delle Valli di Tures ed Aurina ed un comune folder tematico. I comuni dell'area Leader Valli di Tures ed Aurina, in concomitanza con un architetto ed un'agenzia pubblicitaria, elaborano un modello applicabile per una segnaletica unificata allo scopo di presentarsi verso l'esterno con una comunicazione turistica univoca. In questo modo è possibile definire una linea grafica ed architettonica unica e la cooperazione trans-comunale in seno al progetto Leader potrà essere resa visibile anche all'esterno. In aggiunta a ciò alcuni progetti già realizzati con il provvedimento 313 A (diversi sentieri attraverso la vallata) e il provvedimento 313 C (offerte e prodotti in ambito turistico) dovranno trovare spazio in un folder tematico unificato per tutti i comuni. Per garantire una linea grafica unica ed un'apparizione unitaria dell'area Leader, sarà realizzato un concept che tutti e cinque i comuni ed i loro promotori progettuali applicheranno.

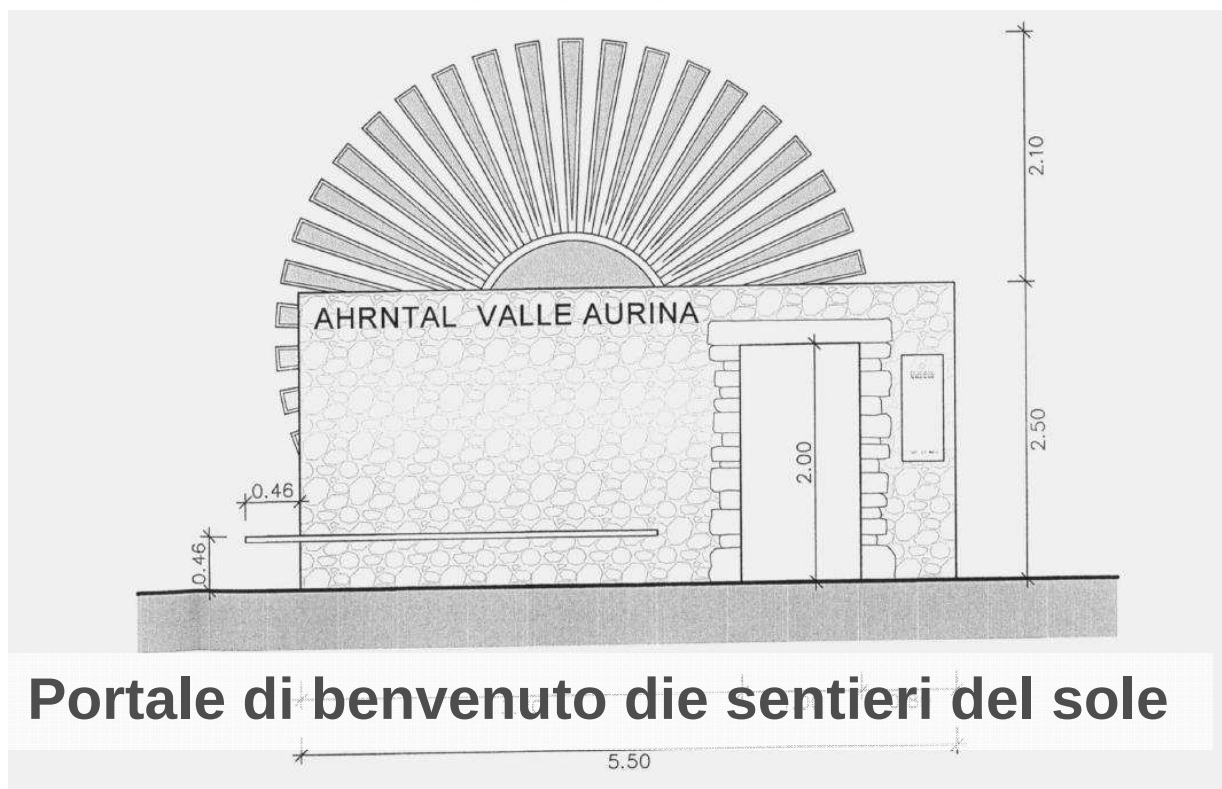

Portale di benvenuto dei sentieri del sole

Titolo del progetto: **"Installazione del portale di benvenuto dei sentieri del sole"**

Provvedimento: **322**

Promotore del progetto: **Comune di Valle Aurina**

Breve descrizione del progetto: Accanto al rinnovo paesano in altre località del comune della Valle Aurina, ora si intende valorizzare anche due piazze nei paesi di S. Pietro e Luttago (rispettivamente presso i punti di partenza dei sentieri del sole della Valle Aurina), tramite l'installazione di due portali di benvenuto.

Il comune di Valle Aurina, in concomitanza con l'artista Friedrich Sebastian Feichter, intende elaborare una bozza per un portale che quest'ultimo realizzerà. L'obiettivo del progetto è la valorizzazione dei paesi di S. Pietro e Luttago: le piazze oggi sono spoglie ed in futuro le si vuole trasformare in luoghi di attrazione. Questo aumenterà l'immagine delle località indicate non solo per i turisti, che le troveranno più attrattive, ma migliorerà anche la consapevolezza di vivere in un luogo gradevole da parte della popolazione locale.



Miglio culturale delle Valli di Tures ed Aurina

Titolo del progetto: **"Miglio culturale delle Valli di Tures ed Aurina - reloaded"**

Provvedimento: **313C**

Promotore del progetto: **Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione professionale VTA**

Breve descrizione del progetto: Nell'ambito di un progetto di cooperazione trans-comunale, negli anni tra il 2003 ed il 2004, è stato sviluppato il cosiddetto „Miglio culturale delle Valli di Tures ed Aurina“. Questo progetto già realizzato verrà quindi adattato e rielaborato grazie al provvedimento qui descritto. Per realizzare ciò sono previsti o verranno organizzati e realizzati i seguenti contenuti:

- aggiornamento contenutistico e grafico della guida culturale cartacea „Kulturmeile Tauferer Ahrntal“ e stampa della nuova edizione in un numero congruo di copie in entrambe le lingue provinciali;
- aggiornamento contenutistico e grafico dell'attuale sito internet www.kulturmeile.leader-tat.com e sviluppo tecnico programmatico del sito;
- sviluppo di un'App „Kulturmeile Tauferer Ahrntal“ per l'utilizzo su smartphone e connessione tramite un link in codice QR;
- necessaria manutenzione e miglioramenti delle 37 stazioni lungo il miglio oppure eliminazione di stazioni o introduzione di nuove lungo il tragitto;
- marketing mirato della cultura locale, nonchè delle offerte aggiuntive ad essa connesse.

Grazie al provvedimento del progetto presentato la regione dell'area Leader vuole garantire i requisiti minimi per un'offerta culturale dell'area adatta alle sue esigenze turistiche.


Le attività di pubbliche relazioni nell'ambito di Leader nelle Valli di Tures ed Aurina:

Il management del GAL delle Valli di Tures ed Aurina è impegnato a concentrare l'attenzione della popolazione della regione d'intervento sui provvedimenti Leader, sui progetti e sugli intenti, nonché ad informare con trasparenza sulle possibilità di sostegno esistenti.

Per fare ciò il management del GAL si appoggia principalmente al sito internet www.leader-tat.com. Internet risulta essere particolarmente adatto per diffondere informazioni e pubblicità Leader, poiché garantisce una forte presenza in rete, è facilmente accessibile a tutti ed è rivolto ad un vasto pubblico. Il GAL delle Valli di Tures ed Aurina ha rielaborato ed aggiornato il sito internet presente nel 2012, in vista dei progetti e dei provvedimenti Leader realizzati tra il 2007-2012. Questi aggiornamenti sono stati fatti dal management del GAL e da metà del 2012 tutti i progetti Leader di questo periodo di sostegno sono visualizzabili alla sezione "progetti attuali". Qui si trovano anche i dati chiave, nonché brevi descrizioni dei progetti con annesso materiale fotografico.

In aggiunta, sul sito internet citato, sono pubblicate comunicazioni, date delle riunioni ed i relativi verbali delle sedute del GAL delle Valli di Tures ed Aurina.

Accessi al sito internet www.leader-tat.com nell'anno 2013:

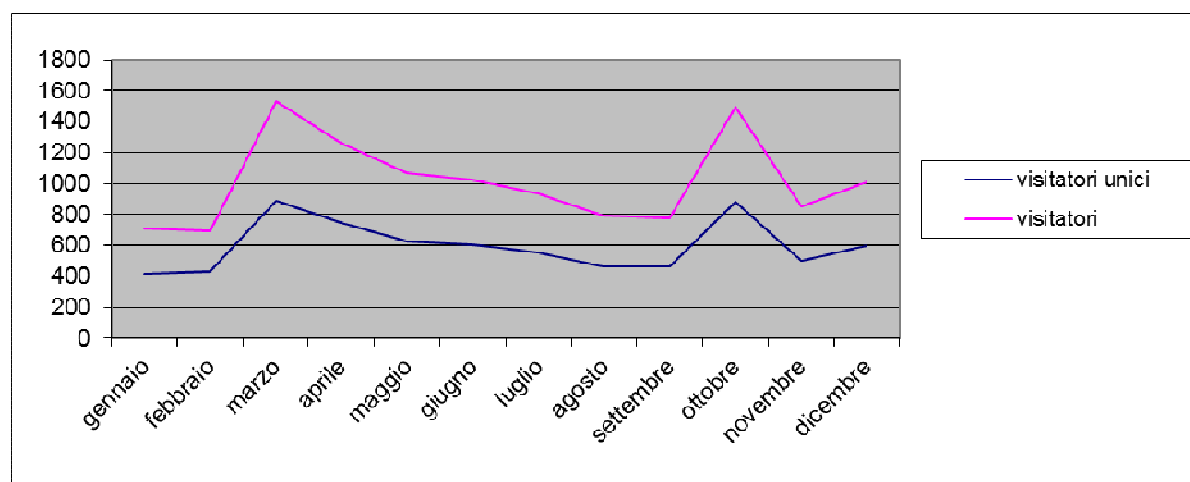



Accanto ad internet il management del Gal sfrutta anche i media locali ed i giornali locali dei 5 comuni Leader per la pubblicazione degli articoli e dei testi di stampa.

Nel 2013 sono apparsi i seguenti contributi su carta stampata:

- „Was genau ist Leader? – Das EU Förderprogramm – seine Inhalte und seine Wirkung“ (Giornale comunale di Gais edizine 03 2012);
- „Erfolgsmodell gesichert“ (Quotidiano Dolomiten del 27.02.2013)
- „Orange ist nun die Farbe der Freude“ (Quotidiano Dolomiten del aprile 2013);
- „Besser leben in Sand in Taufers“ (Quotidiano circondariale "Puschtra" edizione 11 del 05.06.2013);
- „Hofkäsereien als touristische Magnete“ (giornale comunale "Mühlrad" edizione 02 2013);
- „Tourismusverein on Tour“ (giornale comunale "Mühlrad" edizione 02 2013);
- „Regionalentwicklung: Fortsetzung folgt“ (Quotidiano circondariale "Puschtra" 2013)
- „Strahlende Kinderaugen“ – Bauernlandzwerge Tauferer Ahrntal (Quotidiano circondariale "Puschtra" edizione straordinaria estiva in Val Pusteria Luglio 2013)
- „Neues Gletscherexponat im Museum Magie des Wassers“ (Quotidiano circondariale "Puschtra" edizione straordinaria estiva in Val Pusteria Luglio 2013)
- „Ahrntal – Glücksmomente auf den Ahrntaler Sonnenwegen“ (Quotidiano circondariale "Puschtra" edizione straordinaria estiva in Val Pusteria Luglio 2013)
- „Aus der Welt der eisigen Riesen“ – Sonderausstellung Gletscherwelten im Museum Magie des Wassers (Quotidiano Dolomiten del 20.07.2013)
- „Eine Bereicherung für das ganze Dorf“ – Dorferneuerung St. Peter (Quotidiano Dolomiten del 31.07.2013)
- „Verfahren gegen die Genossenschaft eingestellt“ (Quotidiano Dolomiten del 30.08.2013)
- „Gute Gelder“ – Einstellung Gerichtsverfahren (Quotidiano "Die neue Südtiroler Tageszeitung" del 30.08.2013)
- „Gletscherwelten im Museum Magie des Wassers“ (Giornale comunale "Mühlrad" Edizione 03 2013)
- „Ein Tag in Orange“ – Bandiera Arancione (Giornale comunale "Tauferer Böttl" Edizione 05 2013)
- „Ein mühsames, aber lohnendes Geschäft“ (Giornale "Tauernfenster" 2013)
- „EDV-Schulungsraum neu ausgestattet“ (Quotidiano Dolomiten del 29.10.2013)
- Aus der Gemeindestube – Dorferneuerung St. Peter (Giornale locale "Do Töldra" Edizione 05 2013)

- „Social Media Crystal“ für SMARTe Ideen (Quotidiano Dolomiten del 17.12.2013)


Nel novembre la cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione professionale della Valli di Tures ed Aurina ha partecipato allo SMART Social Media Contest con il progetto Leader "Festival del formaggio". Nell'ambito del concorso i partecipanti vengono accompagnati ed introdotti nel mondo dei social media e quindi sostenuti nella gestione dei canali online, come Facebook, Twitter, Blog e Google+.

Il 12.12.2013 presso il Kurhaus & Stadtheater di Merano si è svolta la premiazione del vincitore ed il progetto Leader „Festival del formaggio“ ha raggiunto il secondo posto. La successiva onda informativa sul successo del progetto Leader in radio, tv e giornali non ha solo reso ancora più famoso il Festival del formaggio di Campo Tures, ma ha anche evidenziato pubblicamente a tutti l'efficacia delle iniziative Leader.

Campo Tures, il 26.03.2014



 Helmuth Mittermair
 LAG Tauferser Ahrntal - Präsident



 Miriam Rieder
 LAG Management – Koordination

Editore:	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione delle Valli di Tures ed Aurina Via Municipio 8, 39032 Campo Tures www.leader-tat.com		
Autrice:	Miriam Rieder	miriam.rieder@leader-tat.com	
	Marlen Mittermair	marlen.mittermair@leader-tat.com	

Relazione dettagliata 2013 programma Leader GAL Val Sarentino



I membri del GAL Sarentino

ELER		FEASR	AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL		PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE	
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete			EG – Ver. 1698/2005		Reg. (CE) 1698/2005	L'Europa investe nelle zone rurali

Andamento del Piano di Sviluppo Locale rispetto agli obiettivi fissati:

Il piano di sviluppo locale della Val Sarentino è stato approvato dalla giunta di Bolzano il 13 ottobre 2008. I membri del GAL Val Sarentino si occupano dell'andamento del piano di sviluppo come strumento principale dello sviluppo regionale della Val Sarentino.

Con l'anno 2013 sono state attivate tutte le misure.

Numero dei progetti presentati al GAL: Sono stati presentati 13 progetti.

Misure attivate e progetti approvati dal GAL:

Misura 313A

1. Risanamento sentiero "Hofer Schafberg"
2. Proseguimento „Urlesteig“
3. Risanamento sentiero "Missensteinerjoch"
4. Risanamento sentiero "Asten - Penserjoch"
5. Risanamento "Steinmauer Plankenhorn"
6. Risanamento sentiero "Pens - St. Johann Kirche"

Misura 313B

7. Mantenimento della gestione alpicola "Ebenberg"
8. Mantenimento della gestione alpicola "Sarner Scharte"

Misura 322

9. Risanamento „Pfarrheim“ Sarentino
10. Risanamento „Zehntmesserhaus“ Sarentino
11. Risanamento via "Andreas Hofer"

Misura 431

12. Gestione del GAL Val Sarentino 2013
13. Gestione del GAL Val Sarentino 2014

Numero dei progetti terminati fino al 31.12.2013

Dato che i progetti durano almeno 2 anni, una parte dei progetti ancora sono in trasposizione. **In totale potevamo terminare 26 progetti**

Potevamo terminare i seguenti progetti:

Misura 111:

- 1) Gruppo di lavoro "Taglio e cucito di abiti tradizionali"
- 2) Gruppo di lavoro "Carne di Sarentino"
- 3) Gruppo di lavoro „Allevatori cavalli Haflinger“



- 4) Gruppo di lavoro „Vacanze sui masi“
- 5) Gruppo di lavoro "Taglio e cucito di abiti tradizionali – specializzazione"

Misura 313 A:

- 6) Restauro della teleferica „Dorfer Berg“
- 7) Risanamento „Urlesteig San Martino „
- 8) Risanamento del sentiero "Penser Joch - Durnholzerjöchl"
- 9) Risanamento del sentiero Villa - „Winkler Waldl“
- 10) Risanamento „Trockenmauer Getrum“
- 11) Risanamento "Getrumsteig"
- 12) Risanamento sentiero "Lago Valdurna"
- 13) Risanamento "Sentieri Val Sarentino" 2012
- 14) Piattaforma panoramica „Kreuzjoch“
- 15) Risanamento sentieri "Pennes - Genterberg" 2013



Misura 313 B:

- 16) Mantenimento della gestione alpica "Kalkwald"
- 17) Mantenimento della gestione alpica "Essenberg"

Misura 313 C:

- 18) Val Sarentino - volume illustrato
- 19) Pubblicizzazione e valorizzazione dell'offerta turistica locale
- 20) Pubblicizzazione e valorizzazione dell'offerta turistica locale 2



Misura 431:

- 21) Gestione del GAL Val Sarentino 2008
- 22) Gestione del GAL Val Sarentino 2009
- 23) Gestione del GAL Val Sarentino 2010
- 24) Gestione del GAL Val Sarentino 2011
- 25) Gestione del GAL Val Sarentino 2012
- 26) Gestione del GAL Val Sarentino 2013

I seguenti progetti sono stati completati nel 2013, tuttavia, i contributi ancora non sono saldati:

	Contributo	data consegna
	liquidazione	
Pubblicizz. e valorizz. dell'offerta turistica locale	10.000,00 €	05.08.2011
Gestione del GAL Val Sarentino 2013	33.782,00 €	29.01.2014

Totale contributi non saldati:

43.782,00 €

Numero dei progetti in corsa effettiva esecuzione

Misure attivate e progetti approvati dal GAL:

Misura 111

1. Gruppo di lavoro "Allevatori di razza bruna di Sarentino"

Misura 313A

2. Risanamento del "Sentiero delle saghe" - ponte sospeso
3. Risanamento "Stoaner Gasse"
4. Miniere Val Sarentino
5. Risanamento sentieri "Pennes - Gentersberg"
6. Risanamento sentiero „Hofer Schafberg“
7. Risanamento sentiero "Missensteinerjoch"
8. Risanamento sentiero "Asten - Penserjoch"
9. Risanamento "Steinmauer Plankenhorn"
10. Risanamento sentiero "Pens - St. Johann Kirche"
11. Proseguimento „Urlesteig „

Misura 313B

12. Mantenimento della gestione alpicola "Hofer Berg"
13. Mantenimento della gestione alpicola "Ebenberg"
14. Mantenimento della gestione alpicola "Sarner Scharte"

Misura 313C

terminato

Misura 322

15. Comune di Sarentino: Risanamento paese Sarentino
16. Risanamento Widum Sonvigo
17. Comune di Sarentino: Risanamento paese Sarentino 2
18. Risanamento „Pfarrheim“ Sarentino
19. Risanamento „Zehntmesserhaus“ Sarentino
20. Risanamento via "Andreas Hofer"

Misura 421

21. Progetto di cooperazione "Escursione Ferro di cavallo" in Val Sarentino



Hufeisentour

HÖHENWEG IN DEN SARNTALER ALPEN
 ALTA VIA NELLE ALPI VAL SARENTINO
 HIGH MOUNTAIN TRAIL IN THE SARNTALER ALPS

SÜDTIROL



Misura 431

22. Gestione del GAL Val Sarentino 2014

Risultato

In linea di massima, la direzione del GAL è soddisfatta dello stato di avanzamento dei progetti. Le relative idee sono tutte scaturite da un approccio bottom up, in seguito ad approfondite e continuative campagne informative sul territorio, curate dalla stessa direzione. Sino ad ora, i progetti sono stati accolti molto positivamente dalla popolazione sarentinese e, anche dopo la loro conclusione, sono oggetto di sviluppo ulteriore. Le strategie di marketing adottate per vacanze al maso, i sentieri tematici e la sistemazione dei paesi continueranno a essere pubblicizzate e curate da privati e dal settore pubblico.

Al termine dei progetti, i gruppi di lavoro hanno costituito delle comunità per approfondire i temi e gli spunti avviati, proseguendo sulla scia della formazione e della consulenza e accogliendo nuovi membri tra le loro fila.

In seguito alla rivalutazione degli alpeggi e dei pascoli da parte dello Stato, i miglioramenti che interessano i pascoli, operati attraverso Leader, e la creazione di nuove superfici a tale scopo, si sono rivelati necessari e un grosso vantaggio per gli agricoltori e i vari gruppi d'interesse.

Nel 2013 sono stati impegnate tutte le risorse, mentre la conclusione della maggior parte degli altri progetti è prevista per il 2014. Gli obiettivi del GAL Val Sarentino e della direzione sono stati raggiunti e, nel 2014-15, saranno presentati al pubblico sotto forma di risultati.

Con gli uffici competenti si è instaurata una proficua collaborazione, che contempla uno scambio d'informazioni utili e di facile attuazione. La cooperazione e la comunicazione con tutti i partner, durante questo "periodo Leader", hanno portato a una vantaggiosa situazione "win win".

Esecuzione finanziaria del Programma di Sviluppo Locale:

spesa pubblica prevista dal PSL

2007 – 2013	3.046.760,00 €

spesa pubblica ammessa dal GAL

3.046.701,20 €

percentuale di avanzamento GAL entro 2013

100,00 %

Tabella finanziaria Leader 07 - 13 del GAL Sarentino

Misura	costo totale	spesa pubblica totale	spesa pubblica ammessa	residuo
111	200.000 €	139.990,80 €	140.000,00 €	- 9,20 €
123				- €
124				- €
132/133				
313 A	1.148.896,25 €	919.117,00 €	919.012,00 €	75,00 €
313 B	375.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	- €
313 C	500.000,00 €	400.000,00 €	399.960,00 €	40,00 €
321				
322	853.386,50 €	682.709,20 €	682.709,20 €	0 €
421	104.991,00 €	104.991,00 €	104.991,00 €	0 €
431	499.952,00 €	499.952,00 €	499.999,00 €	-47,00 €
Totale	3.682.225,75 €	3.046.760,00 €	3.046.701,20 €	58,80 €
		100,00%	100,00%	0%

Disposizioni prese dal GAL per assicurare la qualità e l'efficienza dell'esecuzione:

Difficoltà riscontrate nella gestione del PSL

Negli ultimi anni non esistevano delle difficoltà gravi. I membri del GAL sono motivati a forzare i progetti delegati e di realizzare nuovi progetti.

Informazioni volte a dare adeguata pubblicità al PSL e a motivare ed informare i potenziali beneficiari di singoli progetti all'interno dei territori del GAL

- Informazioni ad associazioni via Mail e posta
- Incontri informativi ad associazioni su vari livelli
- Informazioni per il consiglio comunale e per gli assessori
- Articoli sul bollettino informativo locale „Sarner Blattl“
- Articoli sulla stampa „Dolomiten“ e „Tageszeitung“
- Pubblicazioni sul sito

Sopralluoghi dei progetti

Incontro e sopralluogo del progetto “Mantenimento della gestione alpica Essenberg”

Sabato 3 agosto 2013, l'affittanza collettiva Essenberg ha invitato i relativi proprietari terrieri, i collaboratori della stazione forestale Val Sarentino e i membri del gruppo d'azione LEADER a un sopralluogo degli interventi di recupero, appena conclusi, nella frazione di Montessa. Il progetto era stato finanziato in larga misura attraverso LEADER e realizzato con il contributo della stazione forestale Val Sarentino: i costi complessivi ammontavano a 118.200 euro, di cui 94.560 finanziati attraverso LEADER e il restante importo a carico dei proprietari terrieri. L'obiettivo di questo progetto della durata di due anni, i cui lavori sono stati ultimati nel 2013, era quello di rendere nuovamente fruibili per il pascolo le zone boschive, che negli ultimi decenni erano state sempre più densamente popolate di giovani abeti rossi. A tale scopo sono state attuate le seguenti misure:

- decespugliamento di 11 ettari di superfici da pascolo
- sfoltimento del patrimonio arboreo su circa 23,3 ettari
- realizzazione di due nuovi sentieri d'accesso per circa 1 km



Incontro e sopralluogo relativi al progetto “Piattaforma panoramica Kreuzjoch”

Sabato 17 agosto 2013, è stato effettuato un sopralluogo relativo alla realizzazione della piattaforma panoramica Kreuzjoch, cui erano invitati esponenti dell’amministrazione comunale, i proprietari dei fondi interessati, i collaboratori della stazione forestale Val Sarentino e i membri del GAL Val Sarentino.

Durante il precedente mandato LEADER, era stato risanato il percorso d’alta via E5 nell’area intorno al Kreuzjoch. La vista panoramica mozzafiato, offerta dalla cima di questa vetta, acquisirà ulteriore fascino grazie alla realizzazione della nuova piattaforma, che diventerà un polo d’attrazione per i visitatori, incrementando l’interesse della Val Sarentino quale area escursionistica per le famiglie.





 ELER	 AUTONOMIE PROVINZ SÜDTIROL SÜDTIROL	 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Hier entwickelt Europa in die ländlichen Gebiete	 EG - Von 1989/2005	 Reg. (CE) 1083/2005

futuro, attraverso il programma LEADER sarà assicurato il sostegno alle aree a bassa intensità d'infrastrutture.

Le novità in tal senso sono state presentate da Pedro Brosei della Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione Europea, nonché da Ignaz Knöbl del competente Ministero austriaco durante la seconda giornata del convegno. Diversi gruppi hanno offerto la possibilità di discutere sin d'ora delle sfide che saranno affrontate nel prossimo periodo di lavoro.

Il presidente del GAL Sarentino

Josef Günther Mair



Allegati:

Piano progetti al 31.12.2013

GAL SARENTINO - Tavola progetti Leader 2007-2013

stato	31.12.2013

Nr.	nome progetto	project manager	stato	misura	Costo totale		spesa pubblica	autofinanziamento
04	Gruppo di lavoro "Carne di Sarentino"	GRW - Sarentino	concluso	111	24.154,58 €	100%	24.154,58 €	- €
05	Gruppo di lavoro "Taglio e cucito di abiti tradizionali"	GRW - Sarentino	concluso	111	29.860,00 €	100%	29.860,00 €	- €
11	Gruppo di lavoro "Allevatori cavalli Haflinger"	Haflingerpferdezuchtverband	concluso	111	24.015,90 €	100%	24.015,90 €	- €
14	Gruppo di lavoro "Vacanze sui masi"	GRW - Sarentino	concluso	111	19.628,00 €	100%	19.628,00 €	- €
38	Gruppo di lavoro "Allevatori di razza bruna di Sarentino"	GRW - Sarentino	in trasposizione	111	24.068,00 €	100%	24.068,00 €	- €
43	Gruppo di lavoro "Taglio e cucito di abiti tradizionali -specializzazione"	GRW - Sarentino	concluso	111	18.273,52 €	100%	18.273,52 €	- €
							140.000,00 €	
08	Risanamento paese Sarentino	Comune di Sarentino	in trasposizione	322	167.950,00 €	80%	134.360,00 €	33.590,00 €
23	Risanamento Widum Sonvigo	Comune di Sarentino	in trasposizione	322	125.000,00 €	80%	100.000,00 €	25.000,00 €
31	Risanamento „Zehntmesserhaus“ Sarentino	Comune di Sarentino	in trasposizione	322	125.000,00 €	80%	100.000,00 €	25.000,00 €
41	Risanamento Piazza Chiesa	Comune di Sarentino	concluso	322	186.394,78 €	80%	149.115,83 €	37.278,95 €
72	Risanamento „Pfarrheim“ Sarentino	Comune di Sarentino	in trasposizione	322	125.000,00 €	80%	100.000,00 €	25.000,00 €
83	Risanamento Via Andreas Hofer	Comune di Sarentino	in trasposizione	322	124.041,71 €	80%	99.233,37 €	24.808,34 €
							682.709,20 €	
01	Gestione del GAL Val Sarentino 2008	GRW - Sarentino	concluso	431	77.000,00 €	100%	77.000,00 €	- €
03	Gestione del GAL Val Sarentino 2009	GRW - Sarentino	concluso	431	86.000,00 €	100%	86.000,00 €	- €
18	Gestione del GAL Val Sarentino 2010	GRW - Sarentino	concluso	431	72.000,00 €	100%	72.000,00 €	- €
34	Gestione del GAL Val Sarentino 2011	GRW - Sarentino	concluso	431	71.217,00 €	100%	71.217,00 €	- €
47	Gestione del GAL Val Sarentino 2012	GRW - Sarentino	concluso	431	100.000,00 €	100%	100.000,00 €	
68	Gestione del GAL Val Sarentino 2013	GRW - Sarentino	in attesa contributo	431	33.782,00 €	100%	33.782,00 €	
69	Gestione del GAL Val Sarentino 2014	GRW - Sarentino	Decreto	431	60.000,00 €	100%	60.000,00 €	
							499.999,00 €	
42	Progetto di cooperazione "Escursione Ferro di cavallo" in Val Sarentino	GRW - Sarentino	in trasposizione	421	127.000,00 €		104.991,00 €	22.009,00 €
							104.991,00 €	
10	Risanamento Brems - Dorfer Berg	Stazione forestale Sarentino	concluso	313 A	40.000,00 €	80%	32.000,00 €	8.000,00 €
12	Urlesteig Reinswald	Comune di Sarentino	concluso	313 A	268.400,00 €	70%	187.880,00 €	80.520,00 €
19	Risanamento del sentiero "Penser Joch - Durnholzerjöchl"	Stazione forestale Sarentino	concluso	313 A	62.500,00 €	80%	50.000,00 €	12.500,00 €
20	Risanamento del sentiero "Villa - Winkler Waldl"	Stazione forestale Sarentino	concluso	313 A	62.500,00 €	80%	50.000,00 €	12.500,00 €
22	Risanamento "Via delle leggende"	Comune di Sarentino	in trasposizione	313 A	67.000,00 €	80%	52.122,00 €	14.878,00 €
25	Risanamento „Trockenmauer Gettrum“	Stazione forestale Sarentino	concluso	313 A	37.500,00 €	80%	30.000,00 €	7.500,00 €
29	Risanamento "Gettrumsteig"	Stazione forestale Sarentino	concluso	313 A	30.000,00 €	80%	24.000,00 €	6.000,00 €
44	Risanamento sentiero "Lago Valdurna"	Stazione forestale Sarentino	concluso	313 A	37.500,00 €	80%	30.000,00 €	7.500,00 €
48	Risanamento "Sentieri Val Sarentino"	Stazione forestale Sarentino	concluso	313 A	24.300,00 €	80%	19.440,00 €	4.860,00 €
53	Risanamento del "Sentiero delle saghe" - ponte sospeso	Comune di Sarentino	concluso	313 A	44.000,00 €	70%	30.800,00 €	13.200,00 €
59	Risanamento "Stoaner Gasse"	Stazione forestale Sarentino	in trasposizione	313 A	122.750,00 €	80%	98.200,00 €	14.550,00 €
61	Miniere Val Sarentino	Comune di Sarentino	in trasposizione	313 A	63.000,00 €	70%	44.100,00 €	18.900,00 €
62	Risanamento sentieri "Pennes - Genterberg"	Stazione forestale Sarentino	concluso	313 A	37.500,00 €	80%	30.000,00 €	7.500,00 €
71	Risanamento sentiero „Hofer Schafberg“	Stazione forestale Sarentino	in trasposizione	313 A	40.000,00 €	80%	32.000,00 €	8.000,00 €
74	Proseguimento "Urlesteig"	Comune di Sarentino	in trasposizione	313 A	155.000,00 €	70%	108.500,00 €	46.500,00 €
79	Risanamento sentiero "Missensteinerjoch"	Stazione forestale Sarentino	in trasposizione	313 A	25.000,00 €	80%	20.000,00 €	5.000,00 €
80	Risanamento sentiero "Asten - Penserjoch"	Stazione forestale Sarentino	in trasposizione	313 A	37.500,00 €	80%	30.000,00 €	7.500,00 €
81	Risanamento "Steinmauer Plankenhorn"	Stazione forestale Sarentino	in trasposizione	313 A	37.500,00 €	80%	30.000,00 €	7.500,00 €
82	Risanamento sentiero "Pens - St. Johann Kirche"	Stazione forestale Sarentino	in trasposizione	313 A	25.000,00 €	80%	20.000,00 €	5.000,00 €
							919.042,00 €	
15	Mantenimento della gestione alpica "Kalkwald"	Stazione forestale Sarentino	concluso	313 B	30.000,00 €	80%	24.000,00 €	6.000,00 €
33	Mantenimento della gestione alpica "Essenberg"	Stazione forestale Sarentino	concluso	313 B	118.200,00 €	80%	94.560,00 €	23.640,00 €
56	Mantenimento della gestione alpica "Hofer Berg"	Stazione forestale Sarentino	in trasposizione	313 B	112.500,00 €	80%	90.000,00 €	22.500,00 €
77	Mantenimento della gestione alpica "Ebenberg"	Stazione forestale Sarentino	in trasposizione	313 B	50.000,00 €	80%	40.000,00 €	10.000,00 €
78	Mantenimento della gestione alpica "Sarner Scharte"	Stazione forestale Sarentino	in trasposizione	313 B	64.300,00 €	80%	51.440,00 €	12.860,00 €
							300.000,00 €	
02	Pubblicizzazione e valorizzazione dell'offerta turistica locale	GRW - Sarentino	in attesa contributo	313 C	250.500,00 €	80%	200.400,00 €	50.102,00 €
28	Libro Val Sarentino	GRW - Sarentino	concluso	313 C	12.000,00 €	80%	9.600,00 €	2.400,00 €
32	Pubblicizzazione e valorizzazione dell'offerta turistica locale 2	GRW - Sarentino	concluso	313 C	237.450,00 €	80%	189.960,00 €	47.490,00 €
							399.960,00 €	
							3.046.701,20 €	

totale leader	3.046.760,00 €
totale delegato	3.046.701,20 €
% delegato	100,00%
residuo	58,80 €
residuo %	0,00%

 ELER	 AUTONOMIE REGIONALE BOHEMEN SUDETEN	 REGIONE ABRUZZO REGIONE BASILICATA REGIONE CALABRIA REGIONE EMILIA-ROMAGNA REGIONE LAZIO REGIONE LIGURIA REGIONE LOMBARDIA REGIONE MARCHE REGIONE MOLISE REGIONE PIEMONTE REGIONE PUGLIA REGIONE SARDEGNA REGIONE SICILIA REGIONE TOSCANA REGIONE TRENTO-SÜDTIROL REGIONE UMBRIA REGIONE VAL D'AOSTA REGIONE VENETIA
Hier werden die Ausgaben in die Bereiche der Ausgaben	 EG - Von 1989/2000	 Reg. (CE) 1083/2000

Redazione:

Ufficio Fondi Strutturali UE in Agricoltura

Paolo Fox

Andreas Kompatscher

Emanuela Zieger
